

1 - RF CAENE Nº: P-048/23	2 - Data da Fiscalização: 17/05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Alencastro Guimarães - BR 101	5 - Bairro(s): Itacuruçá	6 - Município: Mangaratiba
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 17 de maio de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 22 de maio de 2023. _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA DE ENERGIA



RF CAENE Nº: 048/23		Data da Fiscalização: 17/05/2023		Concessionária: CEG	
Endereço: Rua Alencastro Guimarães - BR 101 - RJ 014					
Status: em andamento		Bairro: Itacuruçá		Cidade/UF: Mangaratiba	
DADOS DE OBRA					
Número do Projeto: MN - 00053061/2023		Tipo de obra: Expansão de Rede		Interna	Externa X
Data de início: 31/01/2023	Conclusão: 21/07/2023	Extensão projetada: 5.451m		Total realizado: 586 m	
SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA	
01. Placa: identificação da obra	X				
02. Placa: desvio de pedestre	X				
03. Placa: desvio de trânsito	X				
04. Placa: aviso de obra	X				
05. Sinalização noturna	X				
06. Isolamento	X				
07. Cones				X	
USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA	
08. Capacete	X				
09. Bota	X				
10. Colete	X				
11. Luva	X				
12. Óculos	X				
13. Protetor auricular				X	
CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA	
14. Recomposição	X				
15. Extintor de incêndio	X				
16. Local de vivência	X				
17. Armazenamento de material	X				
18. Área de descarte (entulho)	X				
DOCUMENTAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA		
19. Projeto	X				
20. Licença de execução	X				
21. Listagem de funcionários	X				
OBSERVAÇÕES					
7. Não se aplica, pois havia tapumes sendo usados no isolamento e sinalização.					
13. Não se aplica, pois a equipe estava realizando apenas serviço de limpeza.					
OUTRAS OBSERVAÇÕES					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Felipe Anjo, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão/reforço da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, DRACMA, sob supervisão da Concessionária, no município de Mangaratiba (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede, com tubulação PE DN 200 mm de média pressão, com o objetivo de atender a postos de GNV, unidades comerciais e residenciais.

O trecho construído de 586 m inicia no entroncamento da BR 101 com a RJ 014 (Foto 12) e segue pela RJ 014. As amarrações estão sendo feitas por coordenadas cartográficas, pois trata-se de perímetro não residencial. Todo esse trecho foi realizado por método não destrutivo.

A extensão total da obra tem como ponto de partida a rua Alencastro, intersecção com a BR 101, segue pela BR 101, entra pela RJ 014 até à esquina da rua Boa Vista. Segue pela rua Boa Vista até à avenida Décio Nogueira onde será realizada a interligação com rede existente.

O assentamento de rede a ser realizado na rodovia BR 101 está dependendo da licença da concessionária CCR para que seja iniciado.

O trecho assentado se encontra devidamente sinalizado com marco plano fixado no meio fio (Foto 11), todavia ainda não se encontra pressurizado.

Equipe realizando apenas serviço de limpeza no local e a máquina perfuratriz se encontrava no estacionamento onde fica guardada no bairro Coroa Grande.

Toda a recomposição existente ainda é provisória, pois faz-se necessário acumular um determinado volume de massa asfáltica para que seja solicitado o serviço, devido à distância entre o fornecedor e o ponto de aplicação.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização / ID

Agnaldo da Silva Santos / ID 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação de obra, sinalização de desvio de trânsito e pedestre



Foto 2: Aviso de obra à frente (RJ - 014)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento e sinalização de pedestre



Foto 4: Rede a ser conectada (PE DN 200 mm)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Funcionários executando serviço de limpeza



Foto 6: Recomposição provisória e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória



Foto 8: Local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Extintor de PQS e CO2



Foto 10: Armazenamento de líquido usado na perfuração (Biodegradável)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Área de descarte (entulho)



Foto 12: Armazenamento de material

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Marco plano

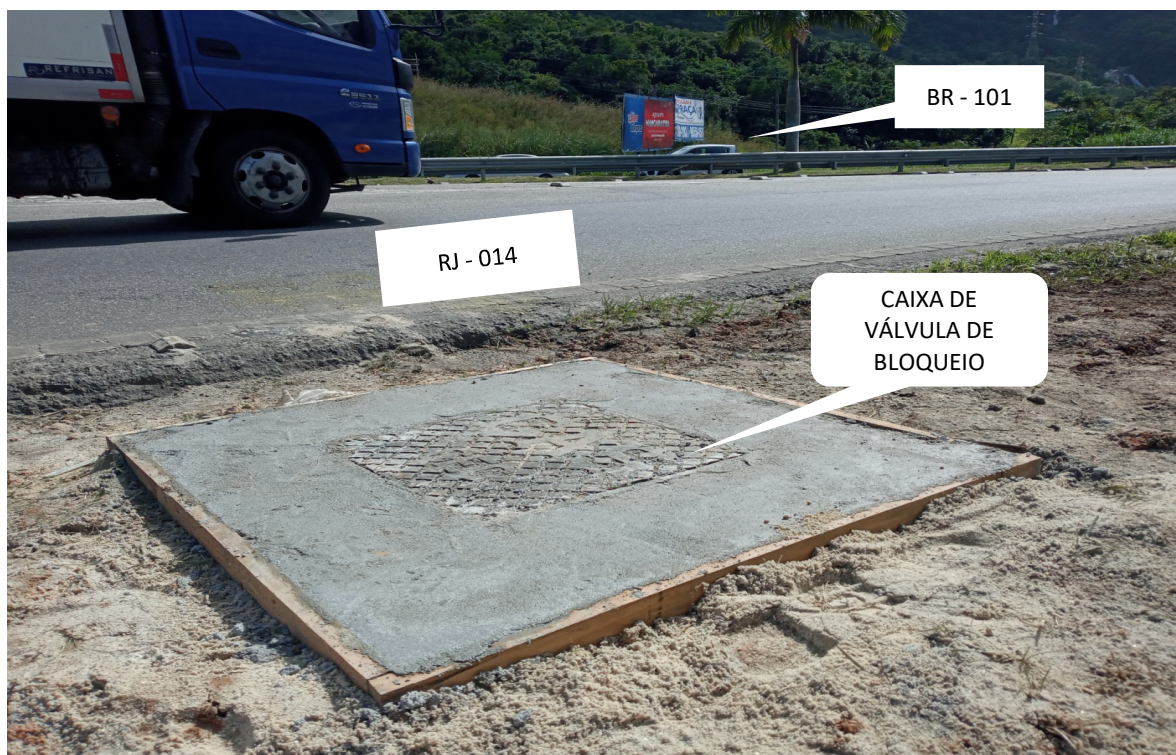


Foto 12: Início do trecho construído
