

1- RF CAENE Nº: P-062/23	2 - Data da Fiscalização: 16/06/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Francisco Bicalho	5 - Bairro(s): São Cristóvão	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de junho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de junho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Vinícius, com objetivo de verificar o andamento das obras de remanejamento de rede no município.

Trata-se de obra de remanejamento de rede de gás natural devido à obra do VLT (Prefeitura) e CCR no terminal Gentileza.

O projeto inicia na rua São Cristóvão, onde serão realizadas interligações e vai até a avenida Francisco Bicalho, sendo constituído de três redes de aço paralelas, a saber: 2 redes com DN 350 mm de média pressão e 1 rede com DN 200 mm de alta pressão, com extensão aproximada de 350 m cada linha e ainda um trecho de 40 m com tubo de aço DN 100 mm de alta pressão.

As redes estão com afastamento de 1,35 m entre os tubos de 350 mm e 1,25 m entre os tubos de 200 e 350 mm (foto 5).

Parte do assentamento de rede está sendo realizado em superfície (foto 4 e 5), sem a necessidade de escavação, pois essa área será aterrada, com elevação do piso em aproximadamente 1,00 m.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização / ID	Gerente/ID
Agnaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada do canteiro de obras



Foto 2: Tubulação de aço 14" a ser interligada

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Rede a ser conectada



Foto 4: Redes de alta e média pressão

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Redes em superfície



Foto 6: Isolamento em trecho de rede assentada

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Redes a serem conectadas (alta e média pressão)



Foto 8: Redes de aço de 14 e 8 polegadas

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Canteiro de obras



Foto 10: Isolamento

Anexo Fotográfico:

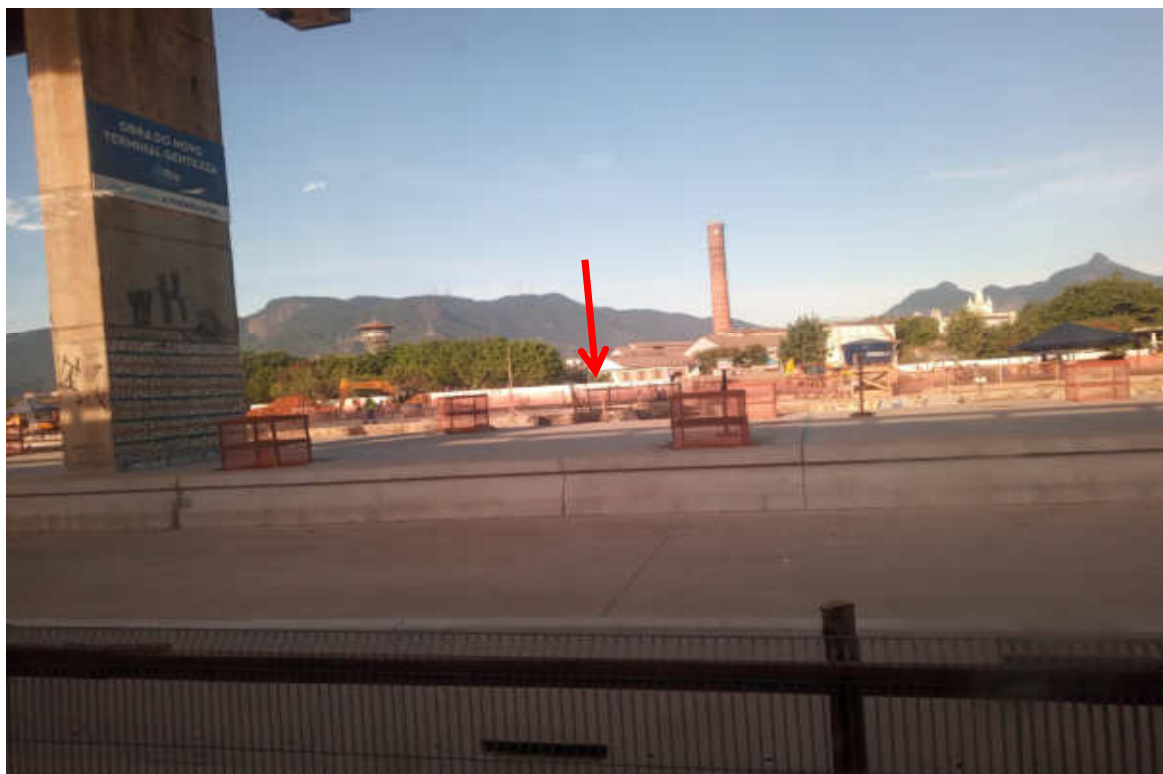


Foto 11: Visão geral do canteiro de obras
