


1 - RF CAENE Nº: P-079/23	2 - Data da Fiscalização: 03/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Lúcio Tomé Feiteira	5 - Bairro(s): Vila Lage	6 - Município: São Gonçalo
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 03 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Joel, com objetivo verificar o andamento das obras de reforço de rede no município.

Trata-se de obra de reforço de rede de gás natural de 160 mm de diâmetro, em polietileno de média pressão.

A obra inicia na rua Dr. March em frente ao nº 286 (Niterói), segue até a esquina com a rua Dr. Câmara Coutinho (São Gonçalo). Segue pela rua Dr. Câmara Coutinho, entra pela rua Maurício de Abreu até intersecção com avenida Lúcio Tomé Feiteira, onde foi realizada a interligação em rede existente de PE DN 250 mm.

A maior parte da obra foi realizada por método não destrutivo (MND), havendo alguns pequenos trechos e travessias realizados por vala aberta, devido interferências existentes.

A finalidade da rede é reforçar o abastecimento para atender a 2 postos de combustíveis a serem ligados e melhorar a oferta de gás natural na localidade.

A rede se encontra em carga e com marco plano fixado em toda a extensão da obra com intervalos de 10 m.

O gestor de obras informou que a tampa da caixa de válvula de rede foi furtada, por isso fizeram um isolamento no local (Foto 6).

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra (interlgação)

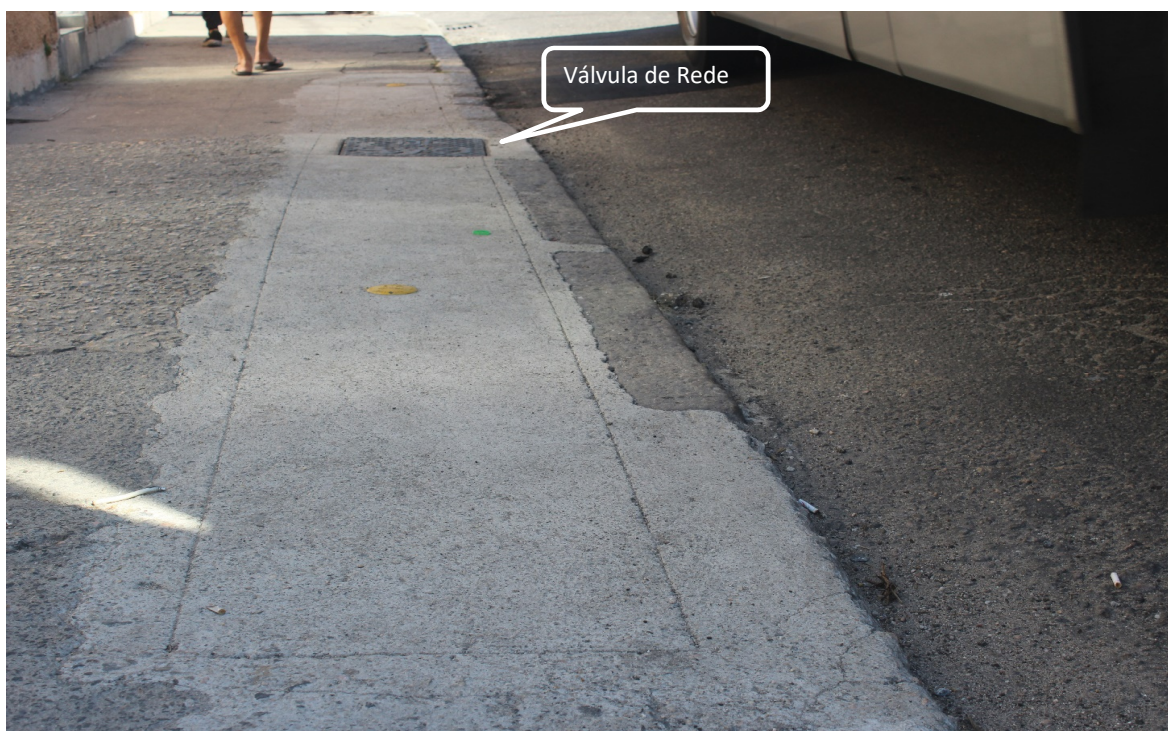


Foto 2: Recomposição do passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco plano



Foto 4: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição da via



Foto 6: Recomposição da via em local de travessia de rede
