

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-033/24	2 – Data da Fiscalização: 08/05/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Porto Alegre, s/nº	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-ENO-53030/2022	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: paralisada	Data de início: 11/01/2024	Conclusão: 30/05/2024	Extensão projetada: 304,9m	Total realizado: 316,15m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de Cláudio Maia, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Porto Alegre (entre a Rua Dona Romana e a Rua Araújo Leitão, sendo um trecho pela via e um trecho pelo passeio).

Trata-se de uma obra de renovação quase finalizada, embora tenha sido paralisada por depender de autorização do posto de combustíveis que se encontra na esquina da Rua Porto Alegre com a Rua Dona Romana (conforme foto 1). No momento da vistoria, o posto já havia autorizado a obra em sua calçada. Diante disso, o gestor informou que a obra iria se reiniciar para proceder sua finalização com a interligação de rede.

Trata-se de obra de renovação de rede com tubulação de polietileno em baixa pressão, possuindo uma extensão total de 304,90 metros, sendo 282,15 metros de PE Ø160 mm e 22,75 metros de PE Ø90 mm. Foram executados 285,40 metros de PE Ø160 mm e 19,50 metros de PE Ø90 mm, por método destrutivo. O total de rede abandonada é 265,20 metros de rede de ferro fundido de Ø100 mm.

A data de início da obra foi em 11 de janeiro de 2024, com previsão de conclusão em 30 de maio de 2024. Toda a obra realizada já se encontra com carga e sinalizada com marco plano.

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, entretanto há outros que ainda são provisórios. Em um trecho do passeio na esquina da Rua Porto Alegre com a Rua Grão Pará, não havia pisos táteis direcionais para deficientes visuais (cinco placas). A recomposição provisória estava com pintura ilegível (fotos 5), entretanto, ainda no decorrer da vistoria foi atendida a solicitação de adequação conforme é demonstrado no anexo fotográfico (foto 6).

Na esquina da Rua Porto Alegre com a Araújo Leitão, faltavam duas placas desse piso também, além de sinalização de recomposição provisória (foto 7), que foi incluída a nosso pedido (foto 8).

Além disso, diante da casa de número 84 da Rua Porto Alegre, foi observado indício de vazamento de água em área de recomposição de travessia de ramal (foto 9), no entanto o responsável pela obra se prontificou em acionar a Concessionária Águas do Rio para fazer a verificação, conforme OS: 3005456 aberta pelo centro de operações da PCRJ.

11 – Observações:

1-13; 16 -18 e 21. Não se aplica por se tratar de obra paralisada.

14. Recomposição provisória com identificação ilegível (foto 5) e sem identificação (fotos 7).

12 – Recomendações:

Verificar com Águas do Rio a origem do vazamento de água (foto 9).

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço conforme consta no campo "Observações", entretanto, foram sanadas as irregularidades apontadas conforme demonstrado nas fotos 8 e 9.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Calos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 14/05/2024

Assinatura do Agente de Fiscalização

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Ponto onde a rede será interligada (próximo ao posto de combustíveis).



Foto 2: Trecho da via com recomposição onde a obra iniciou.

FOTOS



Foto 3: Ponto de interligação e travessia de rede.



Foto 4: Recomposição do passeio e marco plano.

FOTOS



Foto 5: Recomposição provisória com tinta inelegível.

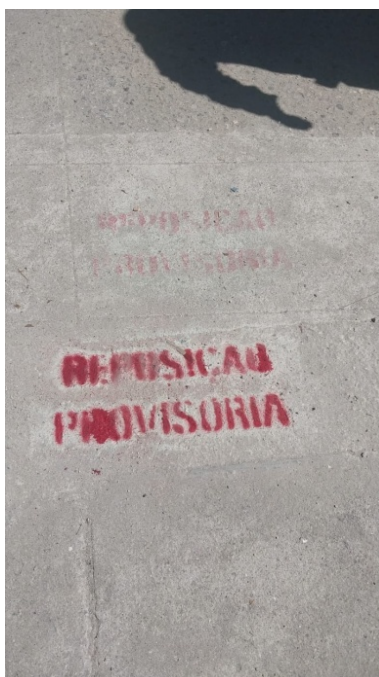


Foto 6: Adequação da sinalização de recomposição provisória.

FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória sem identificação.



Foto 8: Aplicação de tinta com identificação de recomposição provisória.

FOTOS



Foto 9: Indício de vazamento de água em área de recomposição de travessia de ramal.
