

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

|                                                                           |                                                |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 – Nº de Relatório:</b><br>P_044_24                                   | <b>2 – Data da Fiscalização:</b><br>06/06/2024 | <b>3 – Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG |
| <b>4 – Endereço:</b> Av. Brás de Pina, próximo ao Hospital Getúlio Vargas | <b>5 – Bairro(s):</b> Penha                    | <b>6 – Município/UF:</b> Rio de Janeiro/RJ    |

**7 – Objetivo da Fiscalização:**  
Acompanhar ação de reparo em acidente com vazamento de gás.

**8 – Norma(s) Aplicável(eis):**

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;  
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;  
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;  
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;  
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;  
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;  
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;  
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;  
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

**9 - DADOS DE OBRA**

|                                         |                             |                |                |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Número do Projeto:</b> Não aplicável | <b>Tipo de obra:</b> Reparo | <b>Interna</b> | <b>Externa</b> | <b>X</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|

| SINALIZAÇÃO                      | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|----------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 01. Placa: identificação da obra |          |              |             | X             |
| 02. Placa: desvio de pedestre    | X        |              |             |               |
| 03. Placa: desvio de trânsito    | X        |              |             |               |
| 04. Placa: aviso de obra         | X        |              |             |               |
| 05. Sinalização noturna          | X        |              |             |               |
| 06. Isolamento                   | X        |              |             |               |
| 07. Cones                        | X        |              |             |               |

| USO DE EPIs            | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 08. Capacete           | X        |              |             |               |
| 09. Bota               | X        |              |             |               |
| 10. Colete             | X        |              |             |               |
| 11. Luva               | X        |              |             |               |
| 12. Óculos             | X        |              |             |               |
| 13. Protetor auricular | X        |              |             |               |

| CONDIÇÃO                       | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 14. Recomposição               |          |              |             | X             |
| 15. Extintor de incêndio       | X        |              |             |               |
| 16. Local de vivência          |          |              |             | X             |
| 17. Armazenamento de material  |          |              |             | X             |
| 18. Área de descarte (entulho) |          |              |             | X             |

| DOCUMENTAÇÃO                 | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 19. Projeto                  |          |              |             | X             |
| 20. Licença de execução      |          |              |             | X             |
| 21. Listagem de funcionários |          |              |             | X             |

**10 – Relatório:**

A fiscalização se deu como resposta à uma emergência ocorrida nos arredores do Hospital Getúlio Vargas, precisamente na Avenida Brás de Pina em frente à estação de BRT Pastor José Santos. O acidente foi causado por uma ação de correção de problemas na galeria de águas pluviais realizada pela Prefeitura em parceria com a concessionária de água e esgoto: durante a escavação, os equipamentos utilizados interceptaram um duto de distribuição de gás operado pela CEG, de média pressão e 63 mm de diâmetro, em torno das 12:00h, causando vazamento de gás e gerando preocupação na população, já que a área do entorno é de grande movimentação.

Aproximadamente às 13:00h, já estava presente a equipe de reparos encaminhada pela concessionária, sob supervisão do responsável técnico Maurício. A área afetada foi prontamente isolada, com sinalização para desvio de trânsito e pedestres com apoio da Guarda Municipal.

A fiscalização teve início em torno das 15:00, e constatou que a equipe da concessionária já tinha a situação sob controle. O responsável Maurício confirmou que a rede teve sua pressão rebaixada para conter o vazamento e os procedimentos para reparo em definitivo já estavam em curso. As condições de trabalho eram adequadas. O responsável não tinha certeza sobre os efeitos no abastecimento da região: posteriormente, em contato com o Centro de Comando e Controle da concessionária, pode-se averiguar que não houve maiores impactos nem sobre os condomínios próximos que são atendidos pelo trecho afetado, tampouco no Hospital, de modo que o fornecimento manteve-se firme sem maiores oscilações.

Como indicado no checklist, uma série de critérios de fiscalização não se aplicam ao caso, uma vez que a ação foi emergencial e se deu em ambiente de obra já existente e cuja responsabilidade cabe à Prefeitura.

Sem maiores incidentes, a ação fiscalizatória foi encerrada, e a equipe aguarda retorno da concessionária com relatório próprio sobre o incidente no devido processo de acidentes e incidentes, para confirmação dos dados relatados e da finalização do reparo de maneira satisfatória.

**11 – Observações:**

Não houve irregularidades, é necessário atenção à incerteza do responsável pelo serviço de reparo sobre dados da situação.

**12 – Recomendações:**

Sem recomendações por fazer, na medida em que não se constataram irregularidades na prestação do serviço. Entretanto, o responsável pareceu despreparado para atender os questionamentos do agente fiscalizador.

**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

**14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:**

Calvin Fernandes Clara Barbosa

**15 – Cargo:**

Especialista em Regulação

**16 – Matrícula:**

5144781-9

**17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:**

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 06/06/2024




Assinatura do Agente de Fiscalização

## FOTOS



**Foto 1: Área da intervenção para reparo de emergência, com isolamento.**

## FOTOS

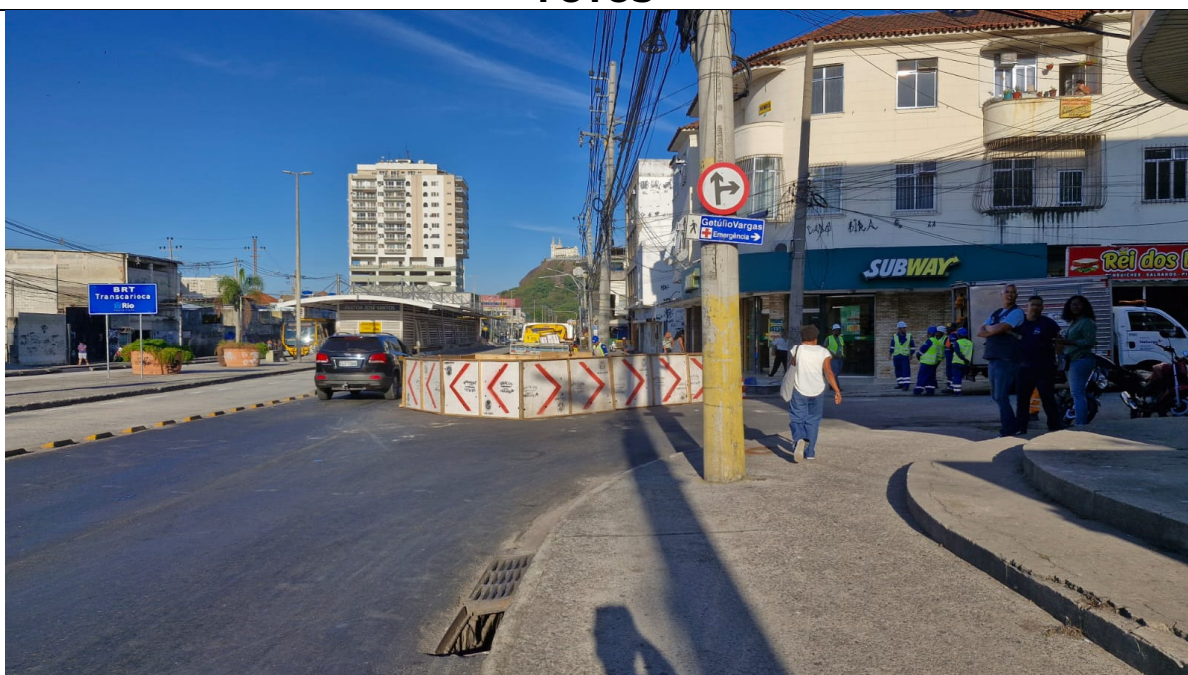

**Foto 2: Vista da área isolada no momento de início da vistoria. Estação do BRT ao fundo. Sinalização de desvio de trânsito em destaque. Equipe da Prefeitura e da Águas do Rio no canto direito à frente; no fundo, equipe de reparos da Naturgy.**



## FOTOS



**Foto 3: Equipe de reparos trabalhando na obra. Extintor em condições de uso no canto direito.**

## FOTOS



**Foto 4: Responsável da Naturgy instruindo equipe e coletando informações sobre os danos.**



## FOTOS



**Foto 5: Colaborador utilizando britadeira para facilitar acesso aos dutos para reparo definitivo. EPI, incluindo proteção auricular, em ordem.**

## FOTOS



**Foto 6: Equipe de reparos e carreta com equipamentos. Hospital ao fundo. Funcionários da Prefeitura ao lado esquerdo. Vazamento já estava contido.**

## FOTOS



**Foto 7: Coleta de informações com o responsável da Naturgy.**
