

Página 1 de 6

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo verificar o andamento das obras de expansão de rede no Residencial Recanto das Flores I (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Adriano Boanafina Funro - TAE de Planificação e Controle da Naturgy
- Lídia Ramos Pereira - Gestora de Obras da Naturgy
- Rafael Alves - Coordenador de Obras da Braços
- Leilane Ribeiro - Engenheira Responsável da Tenda

Durante a visita à obra de expansão de rede de Gás Natural, foi possível verificar que se trata de obra concluída com sucesso em conjunto habitacional prestes a ser entregue.

Havia marco plano de sinalização indicando a presença de rede instalada de forma limpa e regular (Foto 2).

As obras para o assentamento da rede interna já haviam sido concluídas. Estavam instalados ramais, faltando apenas medidores e reguladores de pressão para serem instalados em todos blocos do condomínio, pois estes só serão fornecidos quando houver a primeira solicitação de instalação por um morador. Esse procedimento é adotado em conjunto, entre concessionária e construtora, a fim de evitar que o material se perca e/ou seja avariado e por questões de segurança (Foto 3).

Também durante a vistoria, observou-se a presença de tubo de aço em desnível do terreno em muro de contenção, implementado por normativa e por ser um material mais resistente a deteriorações, quando exposto externamente, do que o polietileno usualmente utilizado (Foto 4).

Conclusão

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária para a execução interna. Quanto à execução externa, não foi possível ver o marco plano já instalado, pois a construtora cimentou o local e agora está realizando nova intervenção na calçada para demarcações.

Ao final desse procedimento, a Concessionária irá reinstalar a demarcação de existência de rede em uma extensão de 12 metros, aproximadamente (Foto 5). Tal fato foi confirmado pelos presentes.

Diante do exposto, constata-se a regularidade do que fora executado pela Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira (ID 51232642)

Gerente/ID

Jorge Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:

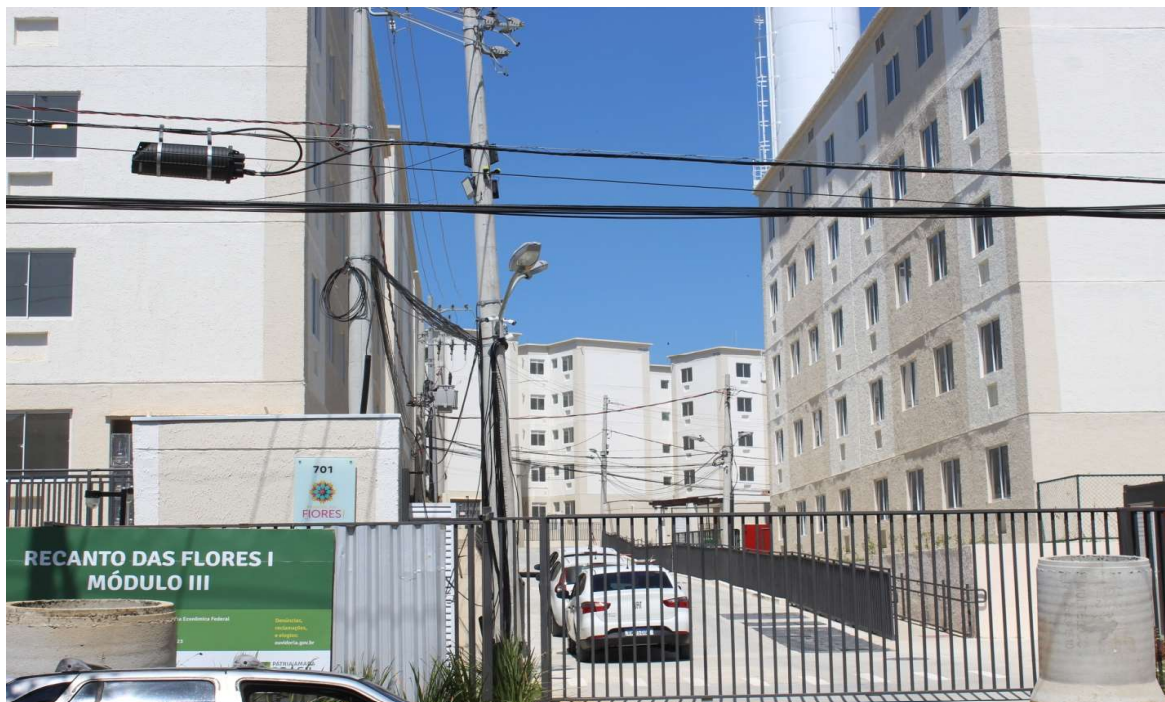


Foto 1 : Fachada do condomínio



Foto 2 : Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Caixa de regulador e medidores



Foto 4 : Tubo de aço em muro de contenção

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Intervenção da construtora em local previamente demarcado pela concessionária
