

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-022/24	2 – Data da Fiscalização: 04/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Coronel Francisco Soares, nº 1351	5 – Bairro(s): Califórnia	6 – Município/UF: Nova Iguaçu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NI-000-53305/2023	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 13/09/2023	Conclusão: 01/05/2024	Extensão projetada: 447,90 m	Total realizado: 393 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna		X		
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de Felipe Anjo, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município de Nova Iguaçu.

Trata-se de obra de expansão de rede com tubulação de polietileno (PE) com Ø63 mm em média pressão com a finalidade de atender a um cliente comercial. A maior parte da obra foi realizada por método não destrutivo (MND) e dois trechos de curva (foto 3 e 5) realizados por método destrutivo.

A obra teve início em frente ao nº 116, na rua Áurea da Fonseca de Jesus, entra pela rua Coronel F. Soares e termina no nº 1352, esquina com a rua Luis Sobral. Para conclusão da obra resta a execução de uma travessia (foto 6) onde haverá uma previsão para futura ligação e um trecho de aproximadamente 50 m (foto 2).

A recomposição da via nos pontos onde houve abertura para passagem da tubulação, ainda é provisória, sendo que a recomposição definitiva será realizada nas próximas semanas visando sua realização na totalidade. Entretanto havia um ponto cuja recomposição não constava indicação de provisória e foi solicitada a adequação.

O trecho de rede assentado ainda se encontra vazio e sem marco plano.

11 – Observações:

05. Ausência de faixa refletiva (foto 7);

08-13. No momento da vistoria não havia mobilização de pessoal;

14. Recomposição provisória sem identificação (foto 11), na Rua Áurea Fonseca de Jesus, próximo ao nº 216.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto a prestação de serviço conforme consta no campo "Observações".

Ainda no momento da vistoria, os itens pontuados foram corrigidos, considerando-se, portanto, sanadas as irregularidades encontradas.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos

15 – Cargo:

Assistente


16 – Matrícula:

51355450

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 08/04/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra.



Foto 2: Trecho que resta para concluir (isolamento de obra com ponta de rede parada)

FOTOS



Foto 3: Trecho realizado por método destrutivo.



Foto 4: Trecho da rua Coronel Francisco Soares (realizado por método não destrutivo).

FOTOS



Foto 5: Trecho realizado por método destrutivo.

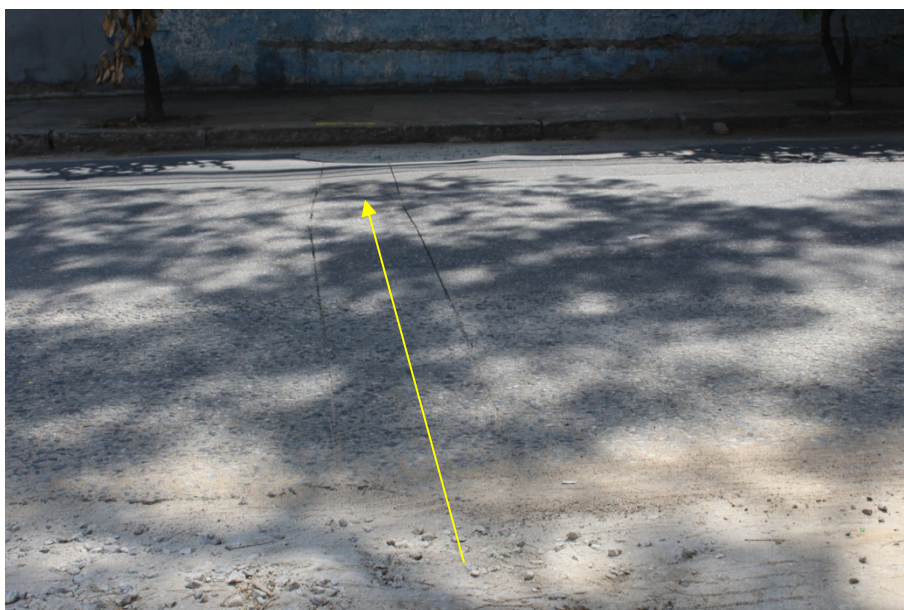


Foto 6: Ponto onde será realizada uma travessia de rede.

FOTOS



Foto 7: Isolamento de obra com sinalização noturna sem faixa refletiva.



Foto 8: Faixa refletiva aplicada.

FOTOS



Foto 9: Extintores de incêndio presentes na área de vivência.



Foto 10: Área de vivência, armazenamento de materiais e banheiro químico.

FOTOS



Foto 11: Recomposição provisória sem identificação.



Foto 12: Pintura realizada identificando recomposição provisória.
