

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P-026/24	2 – Data da Fiscalização: 26/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Correa Dutra (entre a Praia do Flamengo e a Rua Bento Lisboa)	5 – Bairro(s): Flamengo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-FLA-52926/2022	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 10/07/2023	Conclusão: 30/05/2024	Extensão projetada: 1072 m	Total realizado: 804,25 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Juarez Távora, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Rua Correa Dutra, entre a Praia do Flamengo e a Rua Bento Lisboa.

- Trata-se de obra de renovação da rede existente na região, onde o lado par teve a tubulação de PE de Ø90 mm introduzida por método destrutivo, enquanto o lado ímpar recebeu tubulação de PE na mesma dimensão por método não destrutivo (inserção);
- No projeto de obra há ramais de diferentes dimensões: Ø110, 90, 63 e 32 mm; são 51 no total e 36 já estão concluídos;
- O trecho entre a Praia do Flamengo e a esquina da Rua do Catete já foi concluído, em ambos os lados da via, de modo que a tubulação já está sob carga. O lado ímpar já está sinalizado com marco plano, porém no lado par está sendo concluída a instalação. Entretanto, flagrou-se alguns trechos de recomposição provisória propriamente sinalizados, pois ainda há necessidade de reabrir o asfaltamento para finalizar algumas conexões da tubulação;
- Alguns trechos de recomposição final apresentaram má qualidade ou problemas de finalização, especificamente nos trechos em frente aos edifícios de número 152 e 37. Indicou-se a necessidade de corrigir a situação, apontamento acolhido pelo responsável pela obra e atendido conforme demonstrado na foto 18 e 19. Há no trecho na esquina com a Rua do Catete ausência da finalização da faixa de pedestres por cima da recomposição, no entanto, como ainda haverá necessidade intervenção no local, foi solicitada a marcação com tinta de recomposição provisória, conforme foto 16;
- Também notou-se um desnivelamento na recomposição de uma calçada em frente ao edifício de número 100, fato indicado para o responsável, que acenou com a correção do problema para o mesmo dia conforme foto 17;
- Próximo à esquina com a rua Bento Lisboa havia um afundamento do asfalto justamente em local já recomposto, conforme pode ser observado na foto 20.
- O trecho entre a Rua do Catete e a Rua Bento Lisboa ainda deverá ser concluído nos próximos meses, com trechos de recomposição provisória devidamente sinalizados. Houve relato por parte dos colaboradores da obra sobre descarte inadequado de resíduos nos canteiros de obra por parte dos moradores locais, bem como remoção das barreiras sinalizadoras para estacionamento de carros e degradação do ambiente de trabalho por populações de rua.

Por fim, toda documentação, equipamento empregado na obra e sinalizações utilizadas estavam em conformidade.

11 – Observações:

O único problema encontrado foram os trechos com problemas de recomposição, indicados no relatório.

12 – Recomendações:

Solucionar os trechos de recomposição com problemas de acabamento encontrados e apontados neste relatório.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço, conforme pode-se observar no campo de "observações", entretanto foram enviadas as fotos adequando-se os itens pontuados, considerando-se sanadas as irregularidades apontadas.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Aginaldo da Silva Santos
Calvin Fernandes Clara Barbosa

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144781-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 29/04/2024

Assinatura do Agente de Fiscalização

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Área de convivência, com sinalização de desvio para pedestres e armazenamento de materiais contíguo.

FOTOS

ANEXO IX

PREFEITURA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS
Comissão Coordenadora de Obras e Regulação de Águas Públicas

CARIMBO - 4ª G.C. CARIMBO - SC/COR-VIAS

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A Naturgy - Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, CNPJ: 33.938.118/0001-66, sediada na Av. das Américas, 4208 - Barra da Tijuca - RJ, vem solicitar licença para prorrogação de prazo de 98 dias para prosseguir com os serviços/obras de Assentamento da Tubulação de rede e ramal de gás (GR).

Local: Rua Correa Dutra (Entre a Praia do Flamengo e Rua Bento Lisboa) (Com interligação de rede e travessia de Placa na Rua Correa Dutra próx aos nº 05, 81, 92 e eq com Rua do Galeão) (Com interligação de rede na Rua Bento Lisboa eq nº Rua Correa Dutra - Bairro: Flamengo)

A presente solicitação de prorrogação fundamenta-se na seguinte justificativa:
Tivemos algumas interferências no qual estávamos dependendo da resolução de outras concessionárias e com isso tivemos atraso e não foi possível concluir a obra. Estamos finalizando o assentamento de tubo no lado par, e em seguida iremos realizar a inserção e construção dos ramais no lado ímpar.

Rio de Janeiro, 22/01/2024

Responsável pela obra ou reparo

Responsável pela Empresa

PROCESSO Nº 26/100.158/2023 LICENÇA SC/COR-VIAS Nº 01333/2023

PRAZO INICIAL: 126 DIAS PERÍODO DE 16/05/2023 a 20/09/2023

() 1ª PRORROGAÇÃO (X) 2ª PRORROGAÇÃO

PRAZO 126 DIAS PERÍODO DE 21/09/2023 a 24/01/2024

PRAZO 98 DIAS PERÍODO DE 25/01/2024 a 01/05/2024

DOCUMENTOS EM ANEXO:
(X) Cópia da licença concedida
(X) Outros -

(X) Novo cronograma atualizado (X) Cópia do projeto com "status" da obra

APRECIACÃO DA G.C. LOCAL:

() comprova as justificativas alegadas pela empresa
() não tem como comprovar as justificativas alegadas pela empresa, porém deferir a solicitação
() não comprova as justificativas alegadas pela empresa e indefere a solicitação

e informa que a situação da obra nesta data é (descrever detalhadamente):

(continuação de texto se necessário)

Rio de Janeiro, / /

Assinatura do Gerente da 4ª G.C.

Digitalizado com CamScanner

Foto 2: Prorrogação de Prazo concedida para a atividade.

FOTOS



Foto 3: Extintor na área de vivência, recém inspecionado.

FOTOS



Foto 4: Marco plano em trecho de rede finalizada.

FOTOS



Foto 5: Trecho de recomposição finalizada e satisfatória.

FOTOS



Foto 6: Sinalização de recomposição provisória.

FOTOS



Foto 7: Sinalização de desvio para o trânsito, com sinalização noturna acoplada.

FOTOS



Foto 8: Ponto de purga da rede.

FOTOS

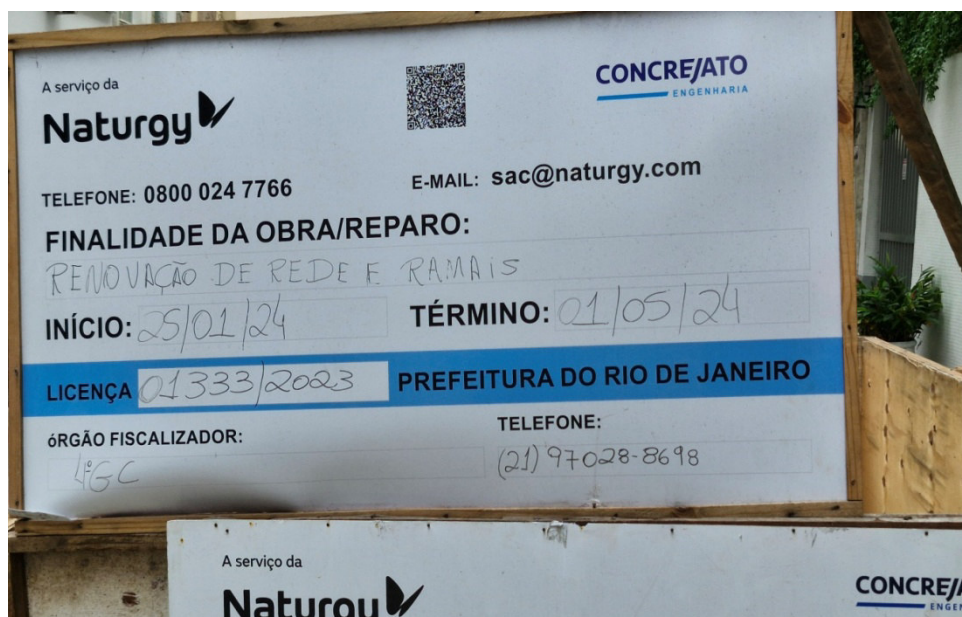


Foto 9: Identificação da obra

FOTOS



Foto 10: Duto de aço em estágio de finalização da inserção do polietileno interno. Detalhe para o entulho e resíduos acumulados por despejo irregular.

FOTOS



Foto 11: Trecho de recomposição faltando pintura da faixa de pedestres

FOTOS



Foto 12: Trecho onde a recomposição provisória não acertou o nivelamento com a rua, gerando risco de acidentes.

FOTOS



Foto 13: Trecho com recomposição provisória insuficiente.

FOTOS



Foto 14: Trecho com recomposição provisória insuficiente

FOTOS



Foto 15: Afundamento do asfalto em trecho de recomposição permanente

FOTOS



Foto 16: Marcação com tintura de recomposição provisória

FOTOS



Foto 17: Adequação de recomposição com o assentamento de pedras portuguesas

FOTOS



Foto 18: Adequação de recomposição da via (ainda provisória)

FOTOS



Foto 19: Adequação de recomposição da via (ainda provisório)

FOTOS



Foto 20: Adequação de recomposição em trecho onde ocorreu afundamento (ainda provisório)
