

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-063/22		2 - Data da Fiscalização: 01/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua São Clemente, n.º 315			5 - Bairro(s): Botafogo		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 1º de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua São Clemente, n.º 315 (Foto 1). Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária Juarez Távora - Gestor de obras.

Trata-se de obra de renovação de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\emptyset$), de baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido de 225 mm de diâmetro ($\emptyset$) pelo método destrutivo (vala aberta).

A obra teve início na Rua São Clemente, esquina com a Rua da Matriz, até o Largo dos Leões, altura do n.º 421.

O total construído corresponde à rede de polietileno de 200 mm de diâmetro ($\emptyset$). Além da tubulação, foram executadas interligações com 63,55 metros de polietileno de 110 mm de diâmetro ($\emptyset$), 105,60 metros de polietileno de 90 mm de diâmetro ($\emptyset$) e 1,6 metro de polietileno de 63 mm de diâmetro ($\emptyset$).

Ao longo da Rua São Clemente, pôde-se observar a presença de fresagem da Prefeitura pela região ser parte do Programa Asfalto Liso, inclusive um desnível na altura do n.º 315 (Foto 2), e por esse motivo não houve aplicação do asfalto pela concessionária. Isto, inclusive, foi motivo para atraso na execução da obra que precisou ser paralisada para o cronogramar atender às exigências da Prefeitura.

A rede renovada encontrava-se com gás, restando interligar os ramais à rede.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme apontadas no campo "OBSERVAÇÕES", mas a correspondente à Foto 3 (esquina da Rua Martins Ferreira) tratava-se de uma correção e as correspondentes às Fotos 4 e 5 (esquinas das Ruas Conde de Irajá e Alfredo Chaves) tratavam-se de conclusão por motivo de mau tempo e falta de cimento. Essas pendências foram corrigidas, como pode ser visto nas fotos 3, 4 e 5 do campo "Anexo Fotográfico".

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra

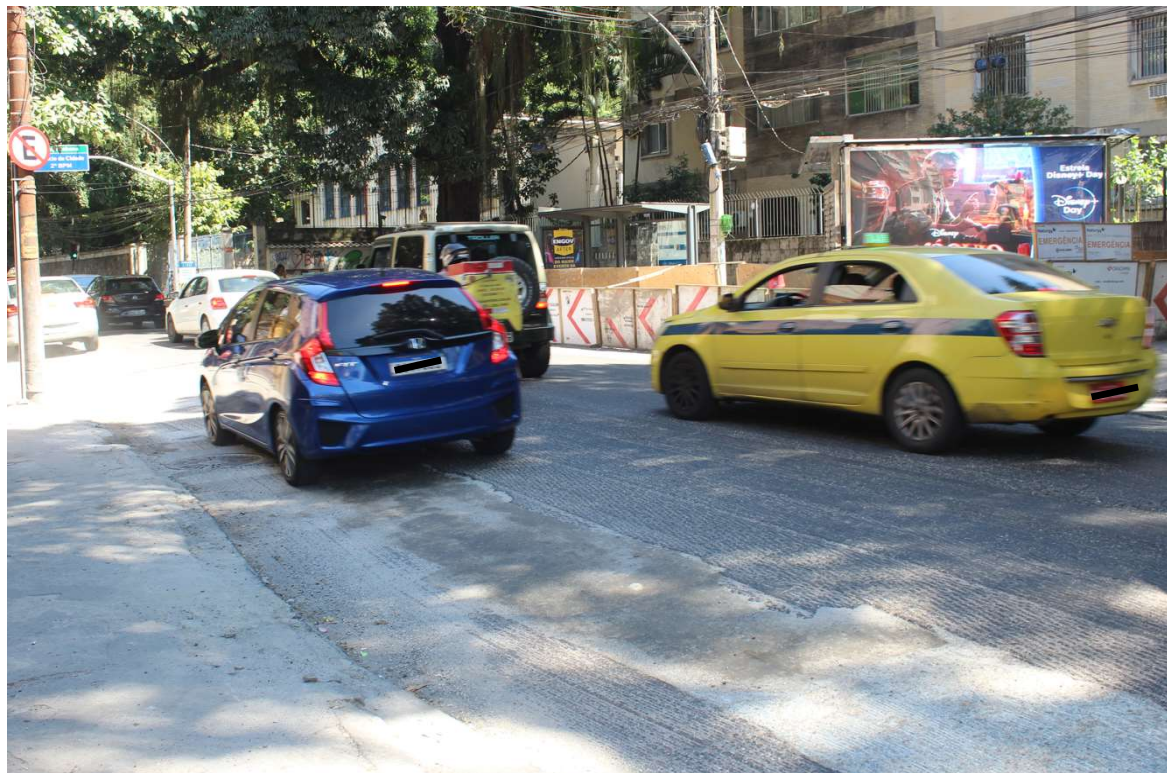


Foto 2 : fresagem da Prefeitura

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : irregularidade na recomposição do asfalto antes e depois

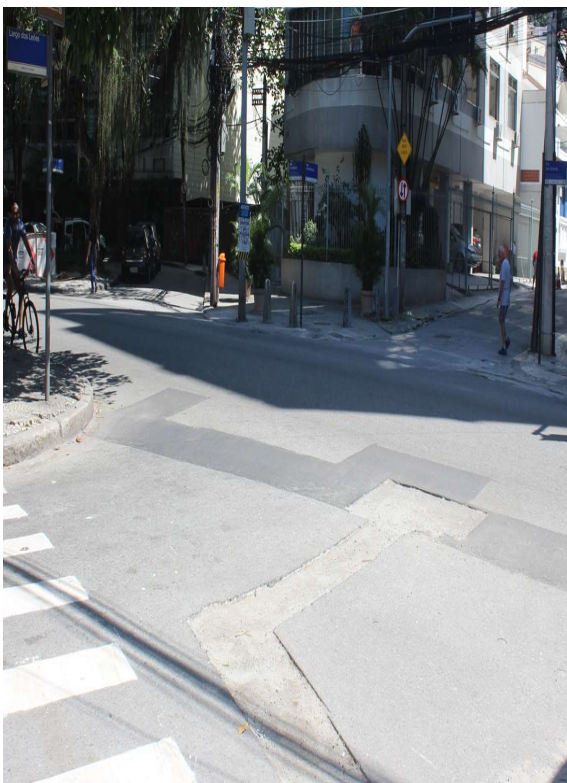


Foto 4 : irregularidade na recomposição do asfalto antes e depois

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : irregularidade na recomposição do asfalto antes e depois



Foto 6 : carga de pressão fora da especificação e novo extintor

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : área de vivência



Foto 8 : recomposição de travessia

Anexo Fotográfico:



Foto 9 : sinalização de obra

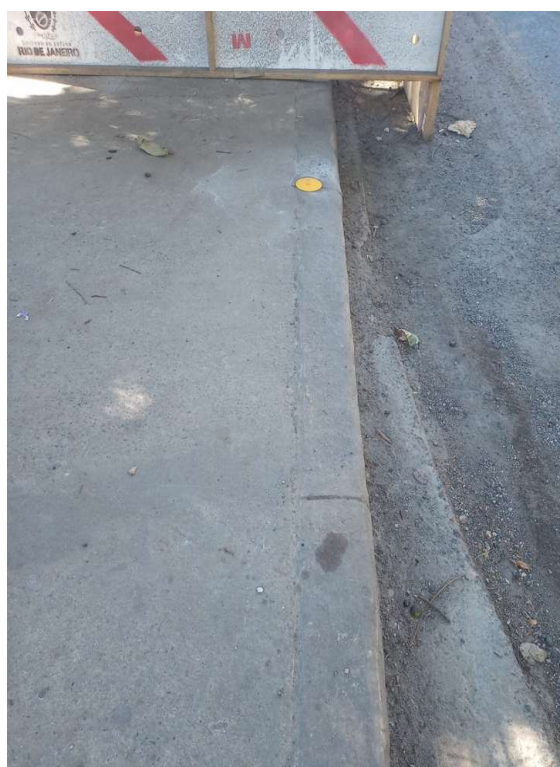


Foto 10 : instalação de marco plano
