

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_101_24	2 – Data da Fiscalização: 20/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº: 5874	5 – Bairro(s): Piratininga	6 – Município/UF: Niterói/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NT-000-52763/2022	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Finalizada	Data de início: 06/03/2024	Conclusão: 23/07/2024	Extensão projetada: 254,40 m	Total realizado: 357,4 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Os itens de 01 a 13, de 15 a 18 e 21 não se aplicam, pois a obra está finalizada.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Joel Elias, com o objetivo de verificar o resultado das obras de expansão na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no bairro de Piratininga.

Trata-se de obra de expansão para ligação de posto de GNV (Posto Jardim Ubá). O total projetado foi de 254,40 m, contudo foram executados 357,4 m, sendo 338,8 metros de rede em PE 160 mm, 8,8 metros para a ligação com o ramal em PE 90 mm e 9,8 metros para a canaleta em Aço de 3" (fotos 1 e 2).

A obra intercalou três trechos em método direcional e quatro trechos em método destrutivo. O primeiro trecho em método destrutivo ligou o ramal ao início do primeiro trecho em método direcional (foto 3). Conforme relato do Gestor, este primeiro trecho em método direcional seguiu por aproximadamente 98 metros, do posto até a esquina da Rua Rubem Risemberg, após este trecho houve um pequeno trecho em método destrutivo até o início do segundo trecho em método direcional, que seguiu por aproximadamente 96 metros, da esquina da Rua Rubem Risemberg até a esquina da Rua José Chianeli, onde novamente houve um pequeno trecho de aproximadamente 30 metros em método destrutivo (fotos 4 até 6) até o terceiro furo direcional realizado para a travessia da via, o qual atingiu a profundidade máxima de aproximadamente 5 metros abaixo da via e foi executado por inserção em tubo camisa de Aço 8". Após a travessia da via ocorreu o último trecho em método destrutivo que realizou a ligação com a rede (fotos 7 até 9).

Vale frisar que, conforme relato do Gestor de obras, toda a rede já se encontra em carga em 4 BAR, contudo o posto ainda não está consumindo.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço, conforme consta no campo "Relatório".

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 21/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Canaleta para passagem de duto de Aço de 3" e conexão com o cliente.



Foto 2: Canaleta para passagem de duto de Aço de 3" e caixa de ramal.

FOTOS

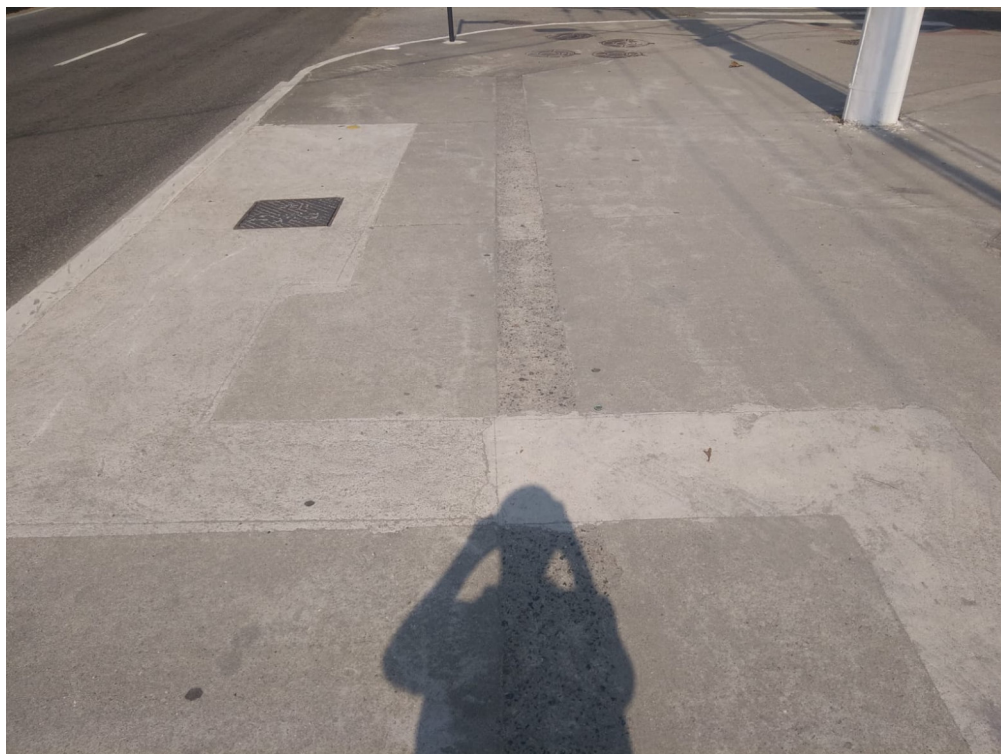


Foto 3: Recomposição definitiva para a ligação com o ramal.



Foto 4: Recomposição definitiva entre as extensões executadas pelo método direcional.

FOTOS



Foto 5: Recomposição definitiva entre as extensões executadas pelo método direcional.



Foto 6: Recomposição definitiva entre as extensões executadas pelo método direcional.

FOTOS



Foto 7: Recomposição definitiva do buraco feito para a travessia da via.



Foto 8: Recomposição definitiva no passeio.

FOTOS



Foto 9: Recomposição definitiva na ligação com a rede de distribuição.
