

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_070_25	2 – Data da Fiscalização: 16/052025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua General Mariante - Três Trechos	5 – Bairro(s): Laranjeiras	6 – Município/UF: Rio de Janeiro / RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Inspeção realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-LAR-53279/2023	Tipo de obra: renovação	Interna	Externa X
--	-----------------------------------	----------------	---------------------

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			
08. Veículos: identificação da Agência	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Inspeção realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Thais Caroline, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua.

A obra teve início no dia 19/03/2025 por emergência decorrente do forte cheiro de gás em vários pontos. Durante a investigação foi constatada a necessidade de projetar uma renovação de rede no local, substituindo antiga rede de FF 150 por PE 110 com uma extensão prevista de 213,25 m e substituição de 9 ramais, abandonando 404,90 m de rede de FF.

No entanto no dia da fiscalização constatou-se que a obra teve sua extensão ampliada com a execução chegando a 495,90 m, a quantidade de ramais ampliada de 9 para 12 e a rede abandonada atingindo 495,90 m. Quase a totalidade da renovação foi executada por inserção da tubulação de PE na antiga de FF.

A licença de obra emergencial estava sendo substituída para obra de renovação, tendo sido mostrado a Solicitação de Regularização com data de início 19/04 e término no dia 15/06.

11 – Observações: nenhuma**12 – Recomendações:** nenhuma**13 – Conclusão:**

Nenhuma irregularidade foi constatada durante a obra. Porém, cabe registrar que havia ainda pequenos pontos de recomposição à receberem acabamento final na calçada. Observamos também que a pista da rua sofria recapeamento pela Prefeitura.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Eduardo Esteves Pfaltzgraff

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

51551381

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025

AGENERSA, Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de obra, com sinalização de desvio e noturna



Foto 2: Área de convivência

FOTOS



Foto 3: Validade Extintores



Foto 4: Área de descarte de material

FOTOS



Foto 5: Sinaliação noturna e de desvio



Foto 6: Banheiro químico e sinalização de desvio

FOTOS

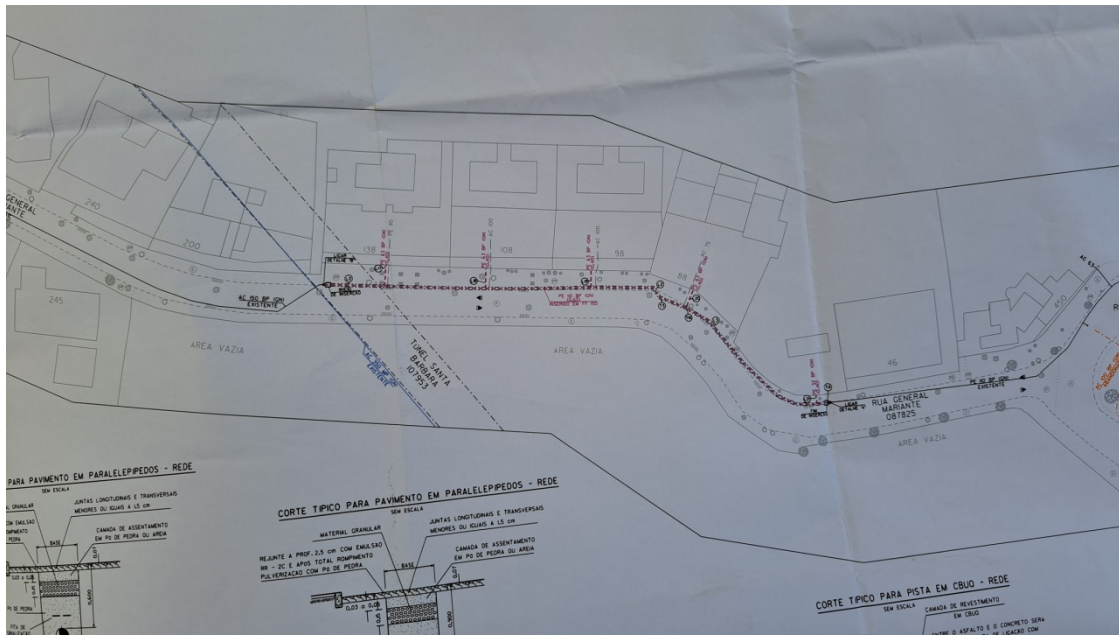


Foto 7: Projeto de Renovação

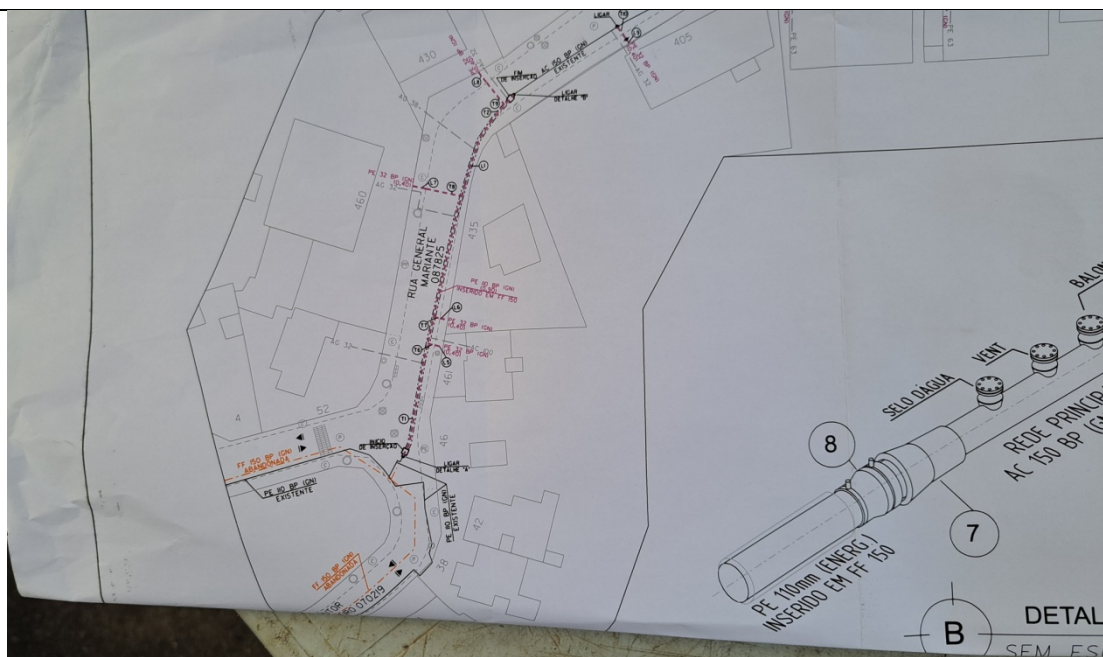


Foto 8: Projeto de Renovação (cont)

FOTOS

Processo

CSV-Proc-2025/02381

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
REQUERIMENTO: REQ

Inscrição Municipal: 047753-6

Endereço:

Tipo da Logradouro: RUA

Nome do Logradouro: CONDE DE LEOPOLDINA

Número: 304 Complemento: CRISTÓVÃO EP: R7

Bairro: S&O Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20060-400

Telefone: (21) 3860-1233

E-mail: PROCESSOS@RACORRJ.COM.BR

Profissional Responsável: CESAR AUGUSTO RODRIGUES SOUSA

Nº da CREA/CAU: 19741060892

DADOS DO REPARO EMERGENCIAL:

Local da Obra: RUA GENERAL MARIANTE EOL LARANJEIRAS

Bairro: Laranjeiras

Nº do Código de Logradouro: 07325

Nº da Gerência de Conservação: 4ª Gerência de Conservação

Função: (X) Ponto e Pá

Categoria: (L) L

Natureza: Vazamento de esgoto de gás em geral

Quantidade de Reparo (m): 1,5

Área Total do Reparo (m²): 3

Prazo Total do Reparo (dias): 14

Data Início: 18/03/2025

Data Fim: 31/03/2025

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

KALIAN DE SOUZA MENDES

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas - SC/COM VIAS,
Secretaria Municipal de Conservação,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
Rua Maua de Lacerda nº 167 - 1º andar - Estácio

Solicitação de Licença para Regularização de Obras em Vias Públicas

A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG/NATURGY, CNPJ nº 33.938.119/0000-69, sediada na Av. Das Américas, nº 4200, Bloco 6, Barra da Tijuca - RJ, telefone (21) 3543-8236, e-mail areis@naturgy.com, representada por seu representante legal, vem solicitar a Vossa Senhoria expedição de Licença para Alteração e Prorrogação de Obras em Vias Públicas.

RUA GENERAL MARIANTE EOL COM
Local da Obra: RUA DOUTOR JOÃO COQUEIRO Bairro: LARANJEIRAS

A Presente solicitação fundamenta-se na seguinte justificativa:

INFORMO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA EM QUESTÃO POIS, TEVE UM VAZAMENTO DE GÁS EM ALGUNS TRECHOS, QUANDO COMEÇAMOS A ESCAVAÇÃO DETECTAMOS QUE A TUBULAÇÃO ESTAVA MUITO DETERIORADA, E COM VÁRIOS PONTOS DE ESCAMAMENTO

ABERTURA PRAZO: 14 DIAS PERÍODO DE 17/04/2025 A 30/04/2025	1ª PRORROGAÇÃO PRAZO: _____ DIAS PERÍODO DE _____ A _____
2ª PRORROGAÇÃO PRAZO: _____ DIAS PERÍODO DE _____ A _____	REGULARIZAÇÃO PRAZO: 60 DIAS PERÍODO DE 17/04/2025 A 15/06/2025

Preencher apenas em caso de alteração de projeto

Quantos de Dutos: 1	Diâmetro dos Dutos: 32/63/110
Área da Obra: 40,45	Extensão da Obra: 40,45
Área do Canteiro: 40,45	Área Total: 80,90

Assinatura

Foto 9: Licença emergencial e Requerimento licença de renovação



Foto 10: Recomposição de ramal

FOTOS



Foto 11: Recomposição de ramal



Foto 12: Recomposição de ramal e renovação por inserção

FOTOS



Foto 11: Trecho com 5 renovações de ramais finalizado com recomposição finalizada



Foto 12: Últimas renovações de ramais em execução
