

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_105_25	2 – Data da Fiscalização: 25/07/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua da Passagem e Avn Lauro Sodre	5 – Bairro(s): Botafogo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-BOT-54365/2024	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 17/06/2025	Conclusão: 02/09/2025	Extensão projetada: 360,65m	Total realizado: 84,60m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Foi realizada vistoria conjunta com a Concessionária, representada pela Gestora de Obras, Thaís Caroline, e pelo Encarregado Operacional, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação da rede de gás na Rua da Passagem e na Avenida Lauro Sodré, no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

A obra consiste na substituição da rede antiga de ferro fundido (FF 150) por uma nova rede de polietileno (PE 110), utilizando método misto (inserção e assentamento com método destrutivo). De acordo com o projeto, estão previstos 360,65 metros de rede em PE 110, 10 ramais e o abandono de 260,49 metros da rede antiga. Até o momento da vistoria, haviam sido executados 84,60 metros de rede e instalados 5 ramais, sem que qualquer trecho da rede antiga tenha sido efetivamente abandonado.

A obra se encontra em fase intermediária de execução, com previsão de conclusão para o dia 02 de setembro de 2025. Ressalta-se que a nova rede ainda não está em carga.

Foi observado que toda a recomposição da pista e dos trechos de calçada nos pontos de intervenção dos ramais encontrava-se em estado provisório, conforme registrado nas fotografias anexas.

O uso de EPIs não se aplica, uma vez que, no momento da fiscalização, não havia trabalhadores presentes na obra.

12 – Recomendações:

É imperativo que a CAENE retorne ao local para verificar o acabamento final das recomposições nas calçadas e pista, dado ao grande número de intervenções devido ao número significativo de ramais substituídos, com objetivo de preservar a mobilidade segura dos pedestres da região.

13 – Conclusão:

Não foram encontradas nenhuma irregularidade ou não conformidade das normas aplicáveis.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/07/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Recomposição provisória.

FOTOS



Foto 3: Área de convivência ao fundo e descarte de entulho em primeiro plano.



Foto 4: Sinalização da obra e noturna.

FOTOS



Foto 5: Recomposição provisória.



Foto 6: Recomposição provisória.

FOTOS

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas
Secretaria Municipal de Conservação
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Rua Maia de Lacerda nº 167 – 1º andar – Estácio

Solicitação de Licença para em Vias Públicas

A , ,

Sediada na

,

Representada por

Vem solicitar a Vossa Senhoria expedição de Licença

Local da Obra Bairro

A Presente solicitação fundamenta-se na seguinte justificativa:

Vem ao processo.rio CSV-PRO-2024/05780, informar que estamos na etapa final do projeto. Estamos concluindo alguns trechos de rede onde a execução está prevista em ser realizada por MND e finalizando a recomposição completa de todo o trecho da obra. Diante dessa situação, solicitamos a compreensão de todos e a prorrogação do prazo para a conclusão da obra.

ABERTURA

PRAZO: 120 DIAS

PERÍODO DE 25/03/2025 A 22/07/2025

1ª PRORROGAÇÃO

PRAZO: 42 DIAS

PERÍODO DE 23/07/2025 A 02/09/2025

PRORROGAÇÃO

PRAZO: DIAS

PERÍODO DE

REGULARIZAÇÃO

PRAZO: DIAS

PERÍODO DE

Preencher apenas em caso de alteração de projeto

Quantidade de Dutos: Diâmetro dos Dutos:

Área da Obra: Extensão da Obra:

Área do Canteiro: Área total:

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.

Leandro Leal
Leandro Leal (Lef 16, 2025 13:34 ADT)

Héllo Henriques Moraes Junior
Héllo Henriques Moraes Junior (Jul 16, 2025 08:44 ADT)

MEMBRO REPRESENTANTE DA EMPRESA JUNTO À SC/COR-VIAS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO: 3 - Concessionária Fiscalizada:

Foto 7: Licença de execução da obra.

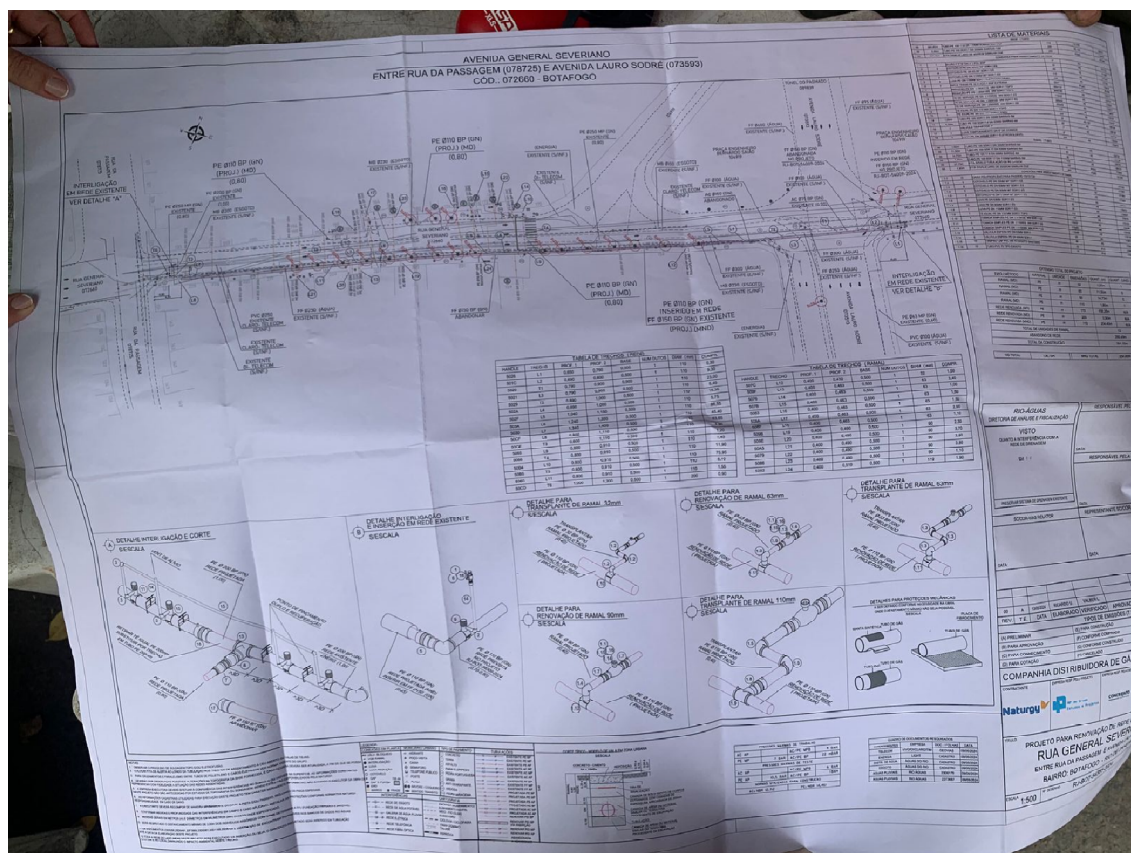


Foto 8: Projeto da obra.
