

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-166/24	2 – Data da Fiscalização: 10/12/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Estrada Pau Ferro S/N	5 – Bairro(s): Campo Redondo	6 – Município/UF: São Pedro da Aldeia

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: SP-000-53482/2023		Tipo de obra: Expansão de rede		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 17/10/2023	Conclusão: 30/12/2024	Extensão projetada: 2.787 m	Total realizado: 3.027,05 m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael Rodrigues da Silva, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Estrada Pau Ferro, conhecida agora como Rua Feliciano José Maurício, entre a Rodovia Márcio Corrêa e a Estrada Morro do Milagre/Estrada Boa Vista.

Trata-se de obra de expansão de rede com tubulação de polietileno em média pressão, com uma extensão total projetada de 2.787 metros de PE Ø200 mm. Foram de fato executados 3.027,05 metros, e o único ramal de PE Ø90 mm também já foi executado. Toda a rede já se encontra com carga.

A data oficial de início da obra foi 17 de outubro de 2023, mas a execução efetiva começou em 13 de dezembro de 2023, com previsão de conclusão para 30 de dezembro de 2024. Atualmente, a obra está quase finalizada, com alguns trechos apresentando recomposição permanente, enquanto outros ainda se encontram em recomposição provisória (fotos 5-8). O gestor informou que a recomposição permanente desses trechos será concluída em breve.

Já estão instalados os marcos planos ao longo de todo o primeiro trecho do trajeto (entre a Rodovia Márcio Corrêa e uma pedreira em torno de um pequeno lago na Rua Feliciano José Maurício) e os marcos verticais no segundo trecho (da pedreira à Estrada Morro do Milagre/Estrada Boa Vista) (fotos 9 e 10).

Ao final do segundo trecho, foram construídos um ramal de PE Ø90 mm e uma ERM da Concessionária dentro da usina de asfalto JM Extração e Beneficiamento Eirelli (fotos 11 e 12).

11 – Observações:

15-16. A área de vivência já foi levantada, pois falta apenas finalizar a recomposição de alguns trechos (fotos 5-8).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 10/12/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS

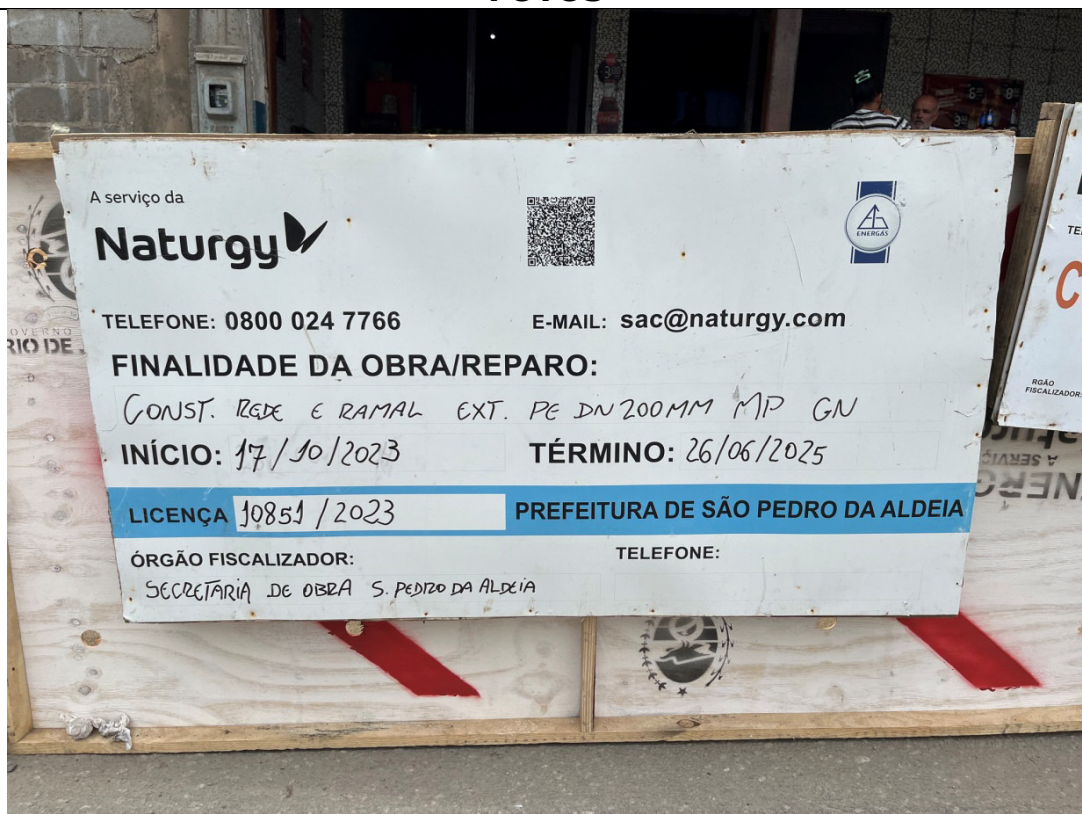


Foto 1: Identificação da obra.

FOTOS



Foto 2: Aviso de obra.

FOTOS



Foto 3: Avisos de obra e cones ao fundo.

FOTOS



Foto 4: Placas de desvio de trânsito e pedestre.

FOTOS



Foto 5: Obra de recomposição da via.

FOTOS



Foto 6: Trecho da via com recomposição provisória.

FOTOS



Foto 7: Trecho da via com recomposição provisória.

FOTOS



Foto 8: Obra de recomposição da via.

FOTOS



Foto 9: Marco vertical instalado na estrada adjacente à pedreira.

FOTOS



Foto 10: Marco vertical instalado no segundo trecho da obra.

FOTOS



Foto 11: Caixa de válvula (à esquerda) e ramal que conecta a rede com a usina de asfalto (à direita).

FOTOS



Foto 12: Estação de regulação e medição dentro da usina de asfalto.
