



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Mar 12, 2025, 11:46:42 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_Gaudência\_229\_JP\_TS\_\_14**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

**Drenagem em todo o polígono e desassoreamento do córrego. Remoção de vegetação arbórea. Foi verificada a ausência de moradores na edificação de nº 550 C.**

Fotos da ocorrência

Foto1

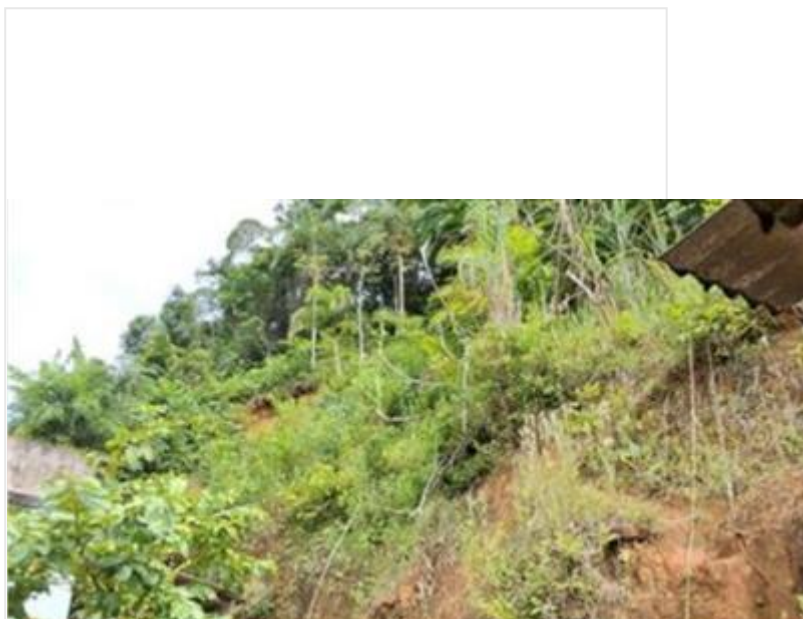


Foto1-20250312-115856.jpg

Descrição da foto1

**Execução de muro de concreto armado, em patamares, no talude de corte atrás da edificação. Destaque para execução de canaletas a montante do muro.**

Foto2



Descrição da foto2

**Cicatriz de deslizamento no trecho superior: solo grampeado para estabilização da encosta, a montante do muro. Destaque para execução de vigotas a montante do solo grampeado.**

Foto3



Descrição da foto3

**Muro de gabião nas margens do córrego.**
