

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-094/24	2 – Data da Fiscalização: 07/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Coronel Francisco Soares, 1351	5 – Bairro(s): Califórnia	6 – Município/UF: Nova Iguaçu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NI-000-53305/2023	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: Concluída	Data de início: 13/09/2023	Conclusão: 02/07/2024	Extensão projetada: 447,90 metros	Total realizado: 428,80 metros

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Ricardo Moreira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Rua Coronel Francisco Soares, entre a Rua Áurea Fonseca de Jesus e a Rua Luís Sobral.

Trata-se de uma obra de expansão praticamente finalizada, que se inicia na Rua Áurea Fonseca de Jesus, no ponto final de uma tubulação de gás pré-existente (foto 1). A partir desse ponto, a nova expansão da rede segue pela Rua Coronel Francisco Soares e termina na esquina com a Rua Luís Sobral, onde está situado o Buteco do Portuga, o cliente que solicitou o fornecimento de gás nessa região.

Essa é uma obra de expansão com tubulação de polietileno em média pressão, com uma extensão projetada de 447,90 metros de Ø63 mm. Foram realizados 428,80 metros e um ramal de 4,20 metros e Ø32 mm.

A data oficial de início da obra foi em 30/06/2023, porém seu início efetivo ocorreu somente em 13/09/2023. A previsão inicial de conclusão era para 30/10/2023, porém, após algumas prorrogações, o prazo final foi estendido para 24/07/2024 (foto 11), sendo que a obra foi efetivamente concluída em 02/07/2024. Toda a obra realizada já se encontra com carga e sinalizada com marco plano ao longo de todo o trajeto.

A obra foi executada, em sua maior parte, com o uso de uma máquina perfuratriz, empregando um método não-destrutivo. Já próximo da esquina com a Rua Áurea Fonseca de Jesus, o cruzamento da via foi realizado mediante a abertura de uma vala, pela impossibilidade de se usar a máquina naquele trecho da obra (foto 8).

Alguns trechos já se encontram com recomposição permanente, conforme observado no anexo fotográfico. Porém, outros ainda têm recomposição provisória e serão definitivamente recompostos até 20/08/2024 (fotos 4, 6 e 9).

Na esquina da Rua Coronel Francisco Soares com a Rua Áurea Fonseca de Jesus, há um trecho já recomposto da via que precisará ser refeito até o dia 20/08/2024. Isso se deve a um afundamento observado no local (foto 6).

Finalmente, há o piso do Buteco do Portuga que também deverá ser refeito (foto 9), também até o dia 20/08/2024, o que inclui a substituição das placas que foram danificadas para a conclusão da obra (foto 10).

11 – Observações:

14. Afundamento na via, recomposição será refeita até dia 20/08/2024, de acordo com o gestor (foto 6).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 07/08/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Ponto onde a rede anterior termina e onde iniciou-se a expansão.



Foto 2: Trecho da via com recomposição onde a obra se iniciou, com marco plano visível.

FOTOS



Foto 3: Ponto de recomposição permanente na via diante de uma casa em obra.



Foto 4: Recomposição provisória em trecho da Rua Áurea Fonseca de Jesus.

FOTOS



Foto 5: Recomposição da via, na Rua Áurea Fonseca de Jesus.



Foto 6: Recomposição provisória e afundamento da via.

FOTOS



Foto 7: Recomposição da via na Rua Coronel Francisco Soares.



Foto 8: Recomposição da via e travessia de rede.

FOTOS



Foto 9: Trecho de recomposição provisória no passeio do Buteco do Portuga.



Foto 10: Piso do Buteco do Portuga que deverá ser refeito.

FOTOS

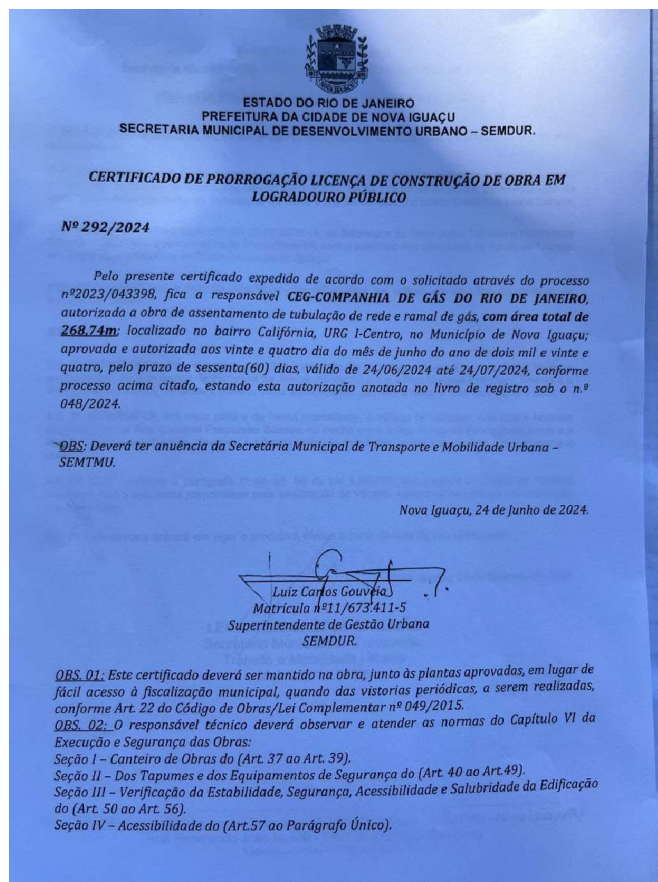


Foto 11: Certificado de prorrogação da licença.
