

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-006/22	2 - Data da Fiscalização: 30/03/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Projetada 2 PPA12597, 50	5 - Bairro(s): Campo Grande	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 30 de março de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira	13 - ID Funcional: 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 5

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede. Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo: • Cristian B. S. Ribeiro - PyC • Juarez T. F. de Moraes Jr. - Gestor de Obras Durante a visita técnica podemos verificar que as obras para assentamento dos dutos de gás já haviam sido concluídas, entretanto, restam ainda as instalações dos reguladores e dos marcos planos de sinalização da rede, que somente serão instalados na finalização das atividades da construtora no canteiro de obras para evitar avaria. A rede foi construída em PE com $\varnothing 32\text{mm}$ e foram construídos 61 ramais também em PE de $\varnothing 32\text{mm}$ para atender o conjunto habitacional composto de 461 economias.	
Conclusão	
Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural já haviam sido concluídas. Destacamos que a Concessionária segue a disponibilidade e o cronograma fornecido pela Construtora.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)	Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Área interna do conjunto habitacional

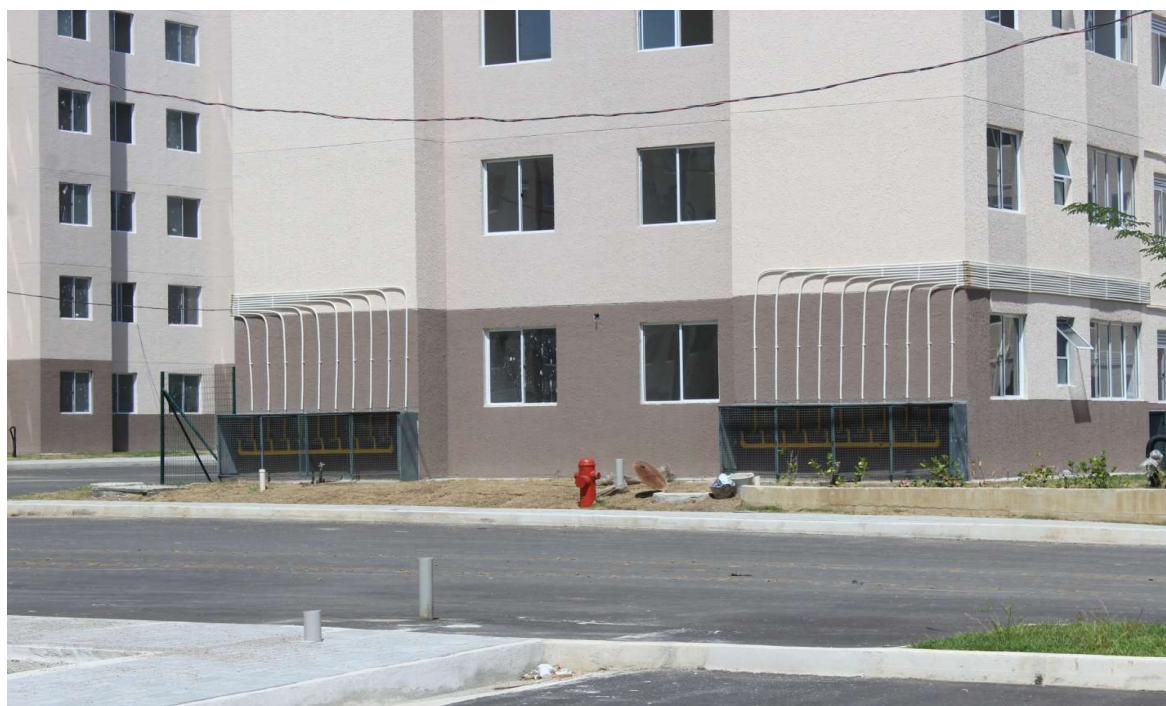


Foto 2 : Instalações internas preparadas para receber os reguladores e os medidores

Anexo Fotográfico:

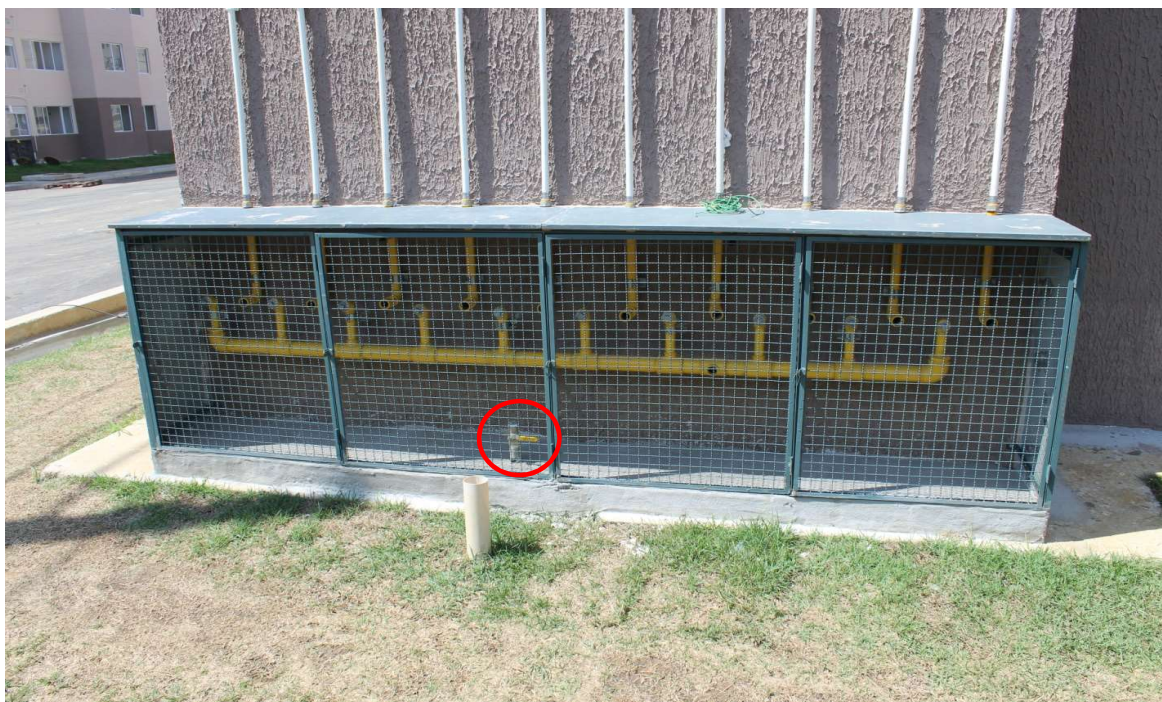


Foto 3 : Ponto de entrega de gás para alimentação dos medidores

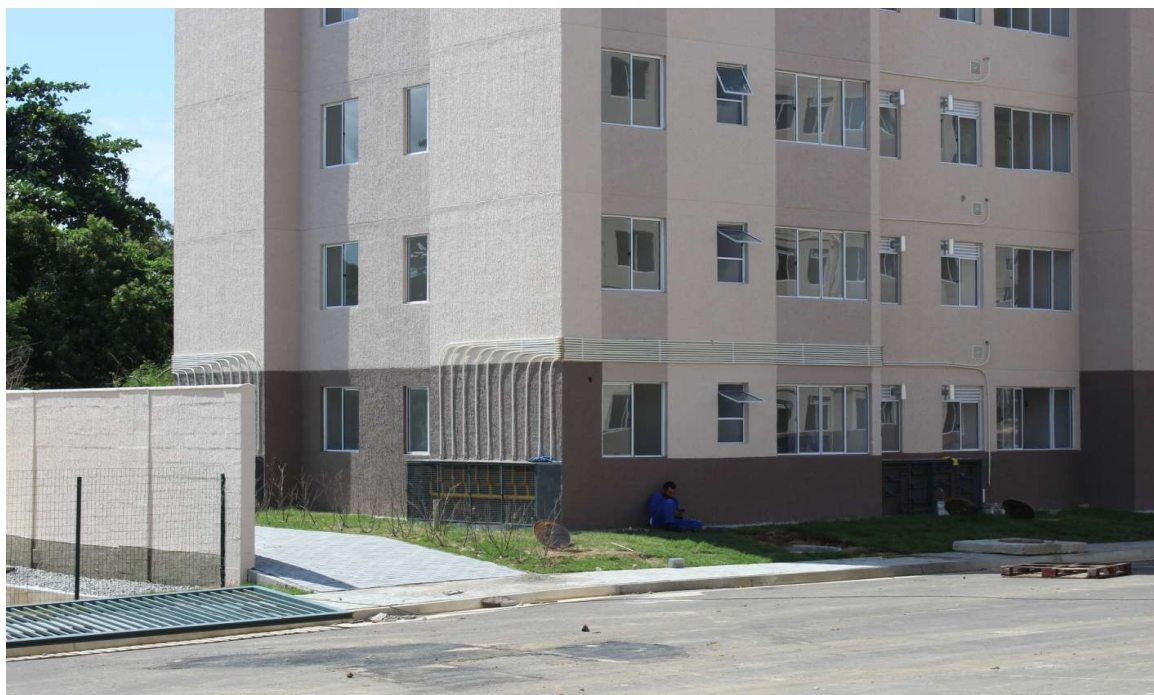


Foto 4 : Instalações internas preparadas para receber os reguladores e os medidores
