

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-008/22	2 - Data da Fiscalização: 30/03/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Campo Grande, 3680	5 - Bairro(s): Campo Grande	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 30 de março de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira	13 - ID Funcional: 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 4

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede. Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Cristian B. S. Ribeiro - PyC
- Juarez T. F. de Moraes Jr. - Gestor de Obras

Durante a visita técnica podemos verificar que as obras para assentamento dos dutos de gás encontravam-se na fase inicial, sendo assentados aproximadamente 230m de rede dos 1022,6 metros previstos, sendo que este trecho construído encontrava-se aterrado e a construção dos ramais ainda não havia sido iniciada. A rede e os ramais serão construídos em PE com diâmetro de 32mm, sendo necessária a construção de uma rede com 1022,6m e 53 ramais que somados resultam na extensão de 102m para atender o conjunto habitacional composto de 500 economias.

A previsão para conclusão dos serviços, por parte da Concessionária, é em maio de 2022, entretanto, esta data pode sofrer alterações a depender do cronograma da Construtora responsável pela construção do conjunto habitacional.

Conclusão

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural estavam em fase inicial de construção.

Destacamos que a Concessionária segue a disponibilidade e o cronograma fornecido pela Construtora.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)

Gerente/ID

Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Área interna do conjunto habitacional

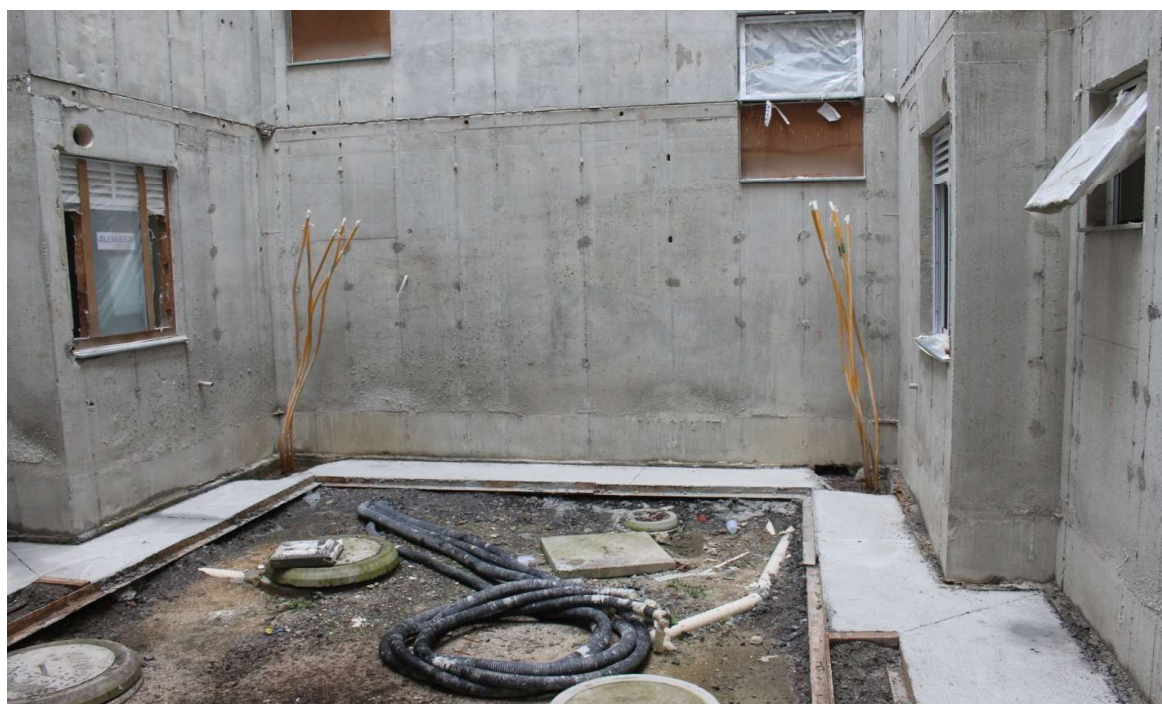


Foto 2 : Instalações internas de responsabilidade da Construtora
