

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-020/22	2 - Data da Fiscalização: 24/05/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Av. Lucio Tomé Feiteira - 312 b1	5 - Bairro(s): Vila Lage	6 - Município: São Gonçalo
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 30 de março de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 44171625
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede. Esteve presente nesta data o funcionário José Otavio de Souza - Gestor de Obras. Durante a visita técnica podemos verificar que as obras para a construção de rede e dos ramais se encontra em andamento, seguindo o cronograma da construtora e no momento da vistoria não havia atividade da Concessionária. O projeto, que se destina a atender o conjunto habitacional composto de 500 economias, contempla a construção de 1096m de rede em PE com $\varnothing 32\text{mm}$, dos quais 965m já foram construídos e 76 ramais que totalizarão 308m de tubos em PE com $\varnothing 32\text{mm}$, dos quais já foram construídos 70 ramais totalizando 200,8m de dutos.	
Conclusão	
Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural estavam em andamento. Destacamos que a Concessionária segue a disponibilidade e o cronograma fornecido pela Construtora.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)	Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Entrada do conjunto habitacional



Foto 2 : Área interna do conjunto habitacional.

Anexo Fotográfico:

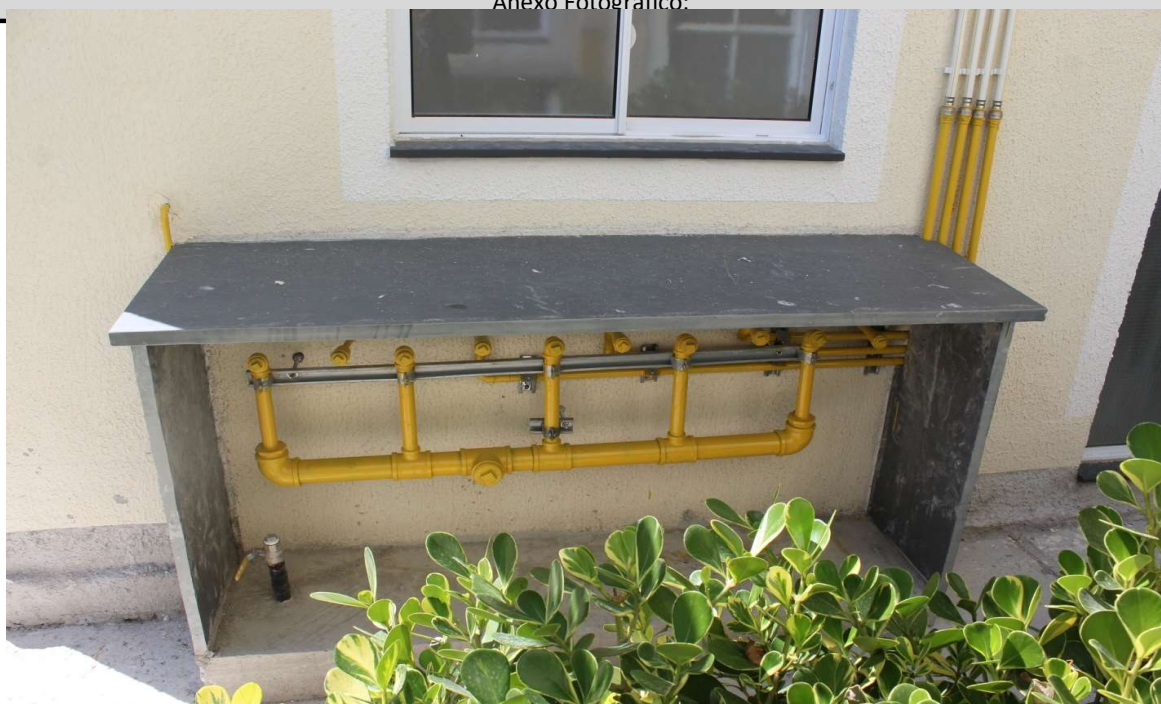


Foto 3 : Ponto de entrega de gás para alimentação dos medidores



Foto 4 : Instalações internas preparadas para receber os reguladores e os medidores
