


1- RF CAENE Nº: P-037/22		2 - Data da Fiscalização: 30/06/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Real Grandeza, n.º 04 a 118			5 - Bairro(s): Botafogo		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 30 de junho de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 08 de junho de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramais na Rua Real Grandeza (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo: • Juarez Távora - Gestor de obras (Naturgy) • Gabriel Miranda - Encarregado de obras (Braços) Trata-se de renovação de rede em substituição de tubulação de ferro fundido por uma de polietileno de 90 mm (Ø) de baixa pressão, por método destrutivo (vala aberta), em trecho que compreende a Rua São Clemente até o n.º 118 em uma primeira etapa. Obra perto de conclusão, restando 22 ramais para serem executados e colocar rede em carga.	
Conclusão	
Ainda que a recomposição do asfalto esteja em bom estado, fomos informados de que a prefeitura iniciou o programa Asfalto Liso e que está comprometendo o avanço da Concessionária nas obras e na execução das vias. No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação da obra na Rua Real Grandeza



Foto 2 : área de vivência

Anexo Fotográfico:

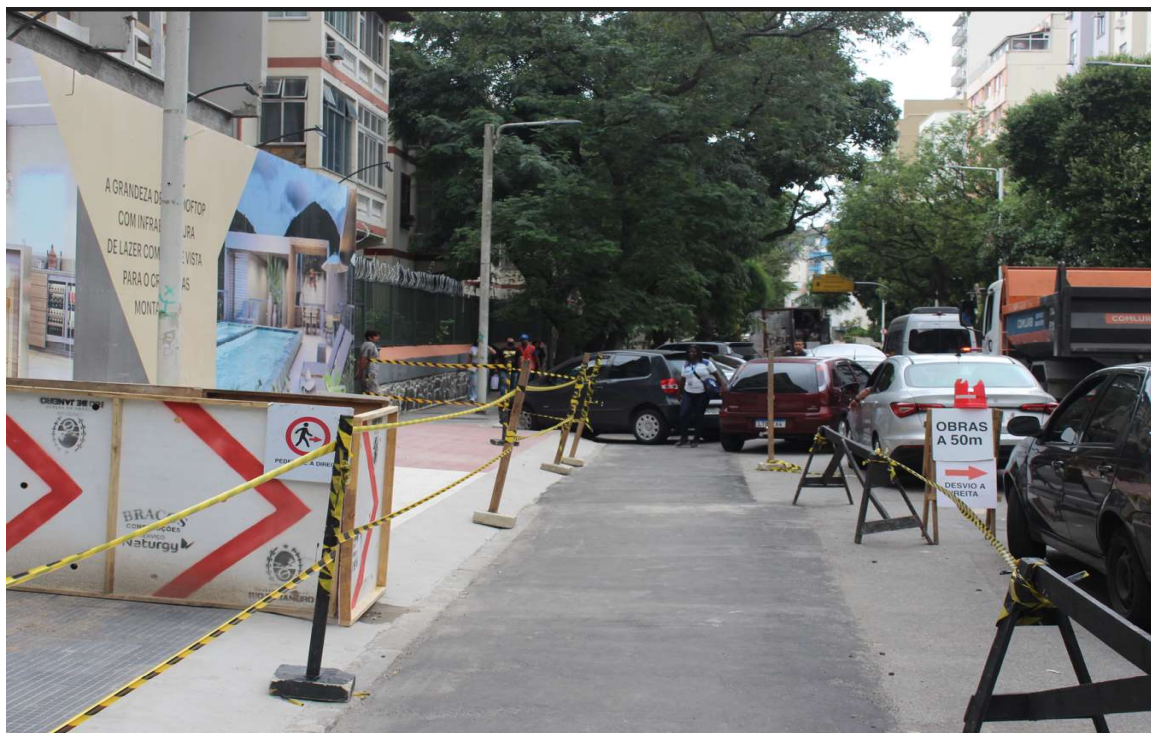


Foto 3 : identificação de existência de obra à frente

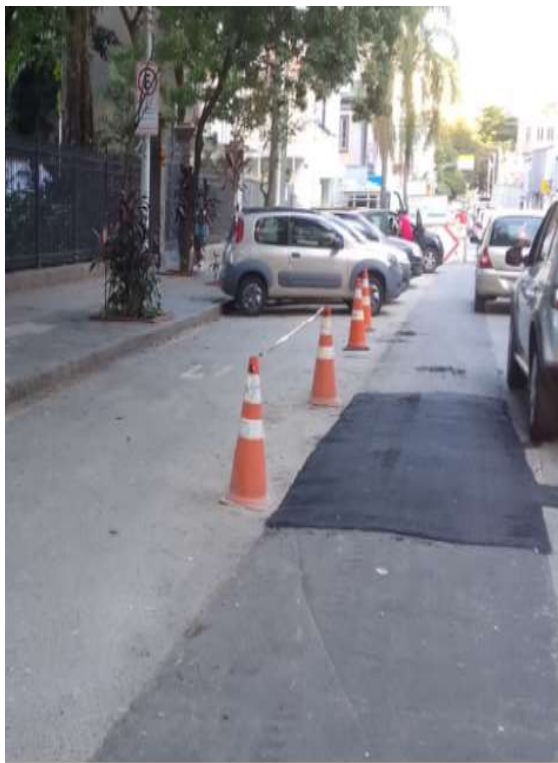


Foto 4 : recomposição antes e depois
