


1- RF CAENE Nº: P-057/22	2 - Data da Fiscalização: 17/08/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Sousa Barros, n.º 273	5 - Bairro(s): Engenho Novo	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 17 de agosto de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira	13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2022		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Sousa Barros (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Kelly Alencar - Gestora de obras (Naturgy)
- Leonardo - Supervisor (Braços)
- Lenilson Barbosa - Encarregado (Braços)

Trata-se de obra de renovação de rede de polietileno de 90, 110 e 160 mm de baixa pressão, pelos métodos destrutivo e inserção, em substituição à de aço de 350.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme campo "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : identificação de obra sem o símbolo da AGENERSA



Foto 2 : local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição provisória e sinalização



Foto 4: afundamento de recomposição

Anexo Fotográfico:

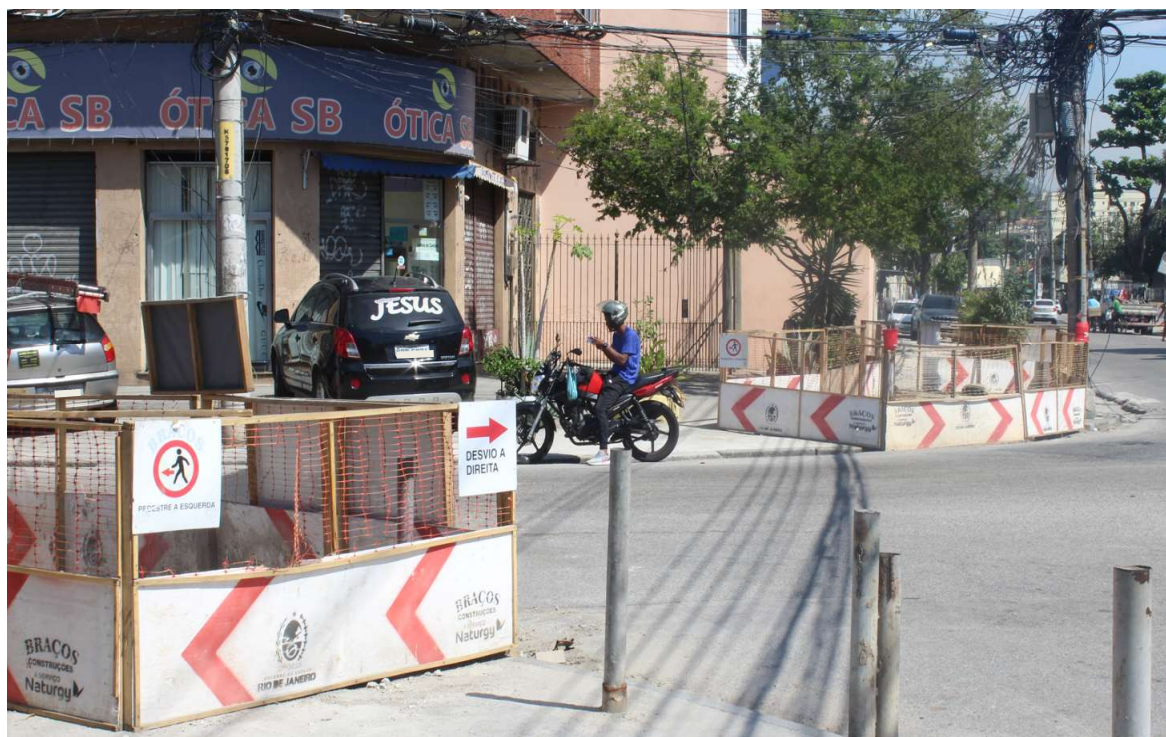


Foto 5: sinalização
