

1- RF CAENE Nº: P-057/23	2 – Data da Fiscalização: 25/05/2023	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço da Fiscalização: Ru Alberto Leite	5 – Bairro(s): Engenho de Dentro	6 – Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de maio de 2023.		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 – ID Funcional: 51355450	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023. _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Lídia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramal, executada pela prestadora de serviços, Braços Construções e Instalações Ltda, sob supervisão da Concessionária, no bairro Engenho de Dentro.

Trata-se de uma obra de renovação de rede e ramal com substituição da rede existente de ferro fundido, devido a constantes escapamentos de gás.

A extensão total construída é de 468,45 m, PE DN 90 mm de baixa pressão, iniciando na rua Itapema, intersecção com a rua Alberto Leite e terminando na rua Dias da Cruz, esquina com a rua Alberto Leite.

Foram construídos dois trechos de rede, sendo o lado ímpar, assentado em toda a extensão da rua Alberto Leite até o número 223, onde já havia rede, e o lado par, partindo da intersecção com a rua Itapema até à praça Amambai. Reinicia após a praça e termina com interligação na rua Dias da Cruz.

O total de rede abandonado é de 265,25 m de ferro fundido DN 4". Foram construídos 20 ramais (DN 63 mm e 62 mm).

A rede nova foi construída por método destrutivo, se encontra em carga e devidamente sinalizada com marco plano.

A licença para a execução da obra concedida pela prefeitura foi na modalidade de emergência, sendo retirada uma nova licença em cada fase.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização / ID

Agnaldo da Silva Santos / ID 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Início da rede



Foto 2: Recomposição da calçada e Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recoposição

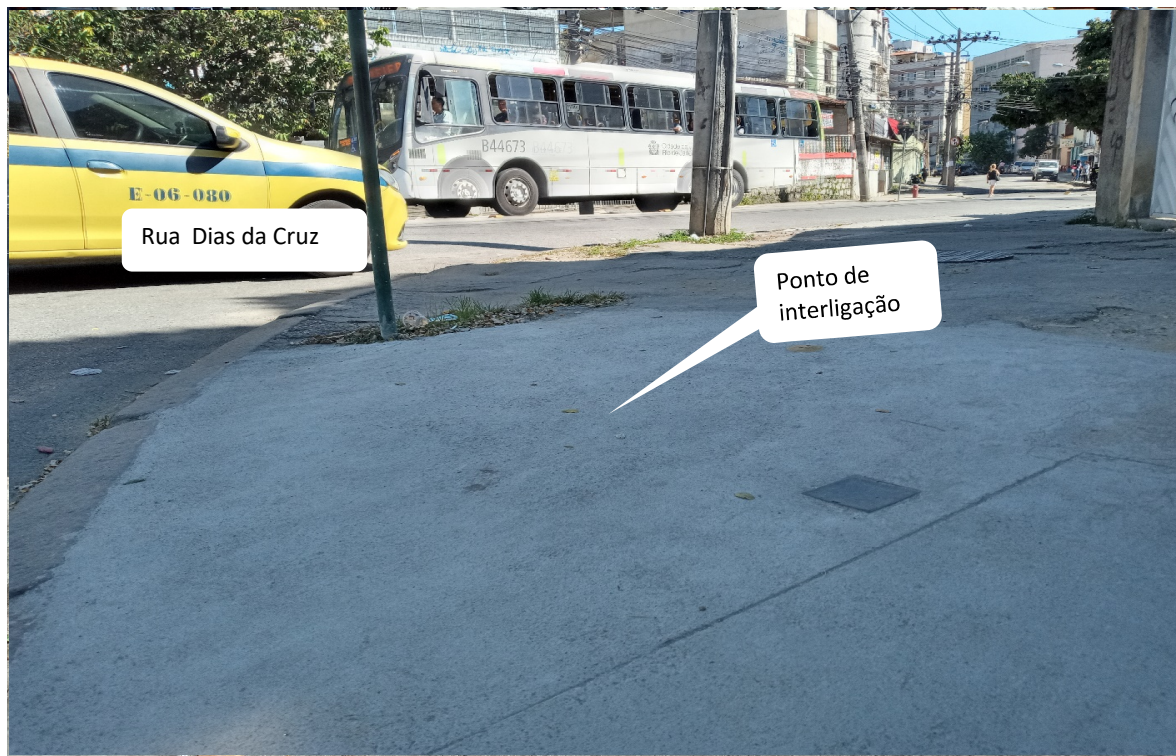


Foto 4: Recomposição da calçada

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição de travessia



Foto 6: Recomposição da calçada e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição e marco plano



Foto 8: Recomposição da calçada

Anexo Fotográfico:

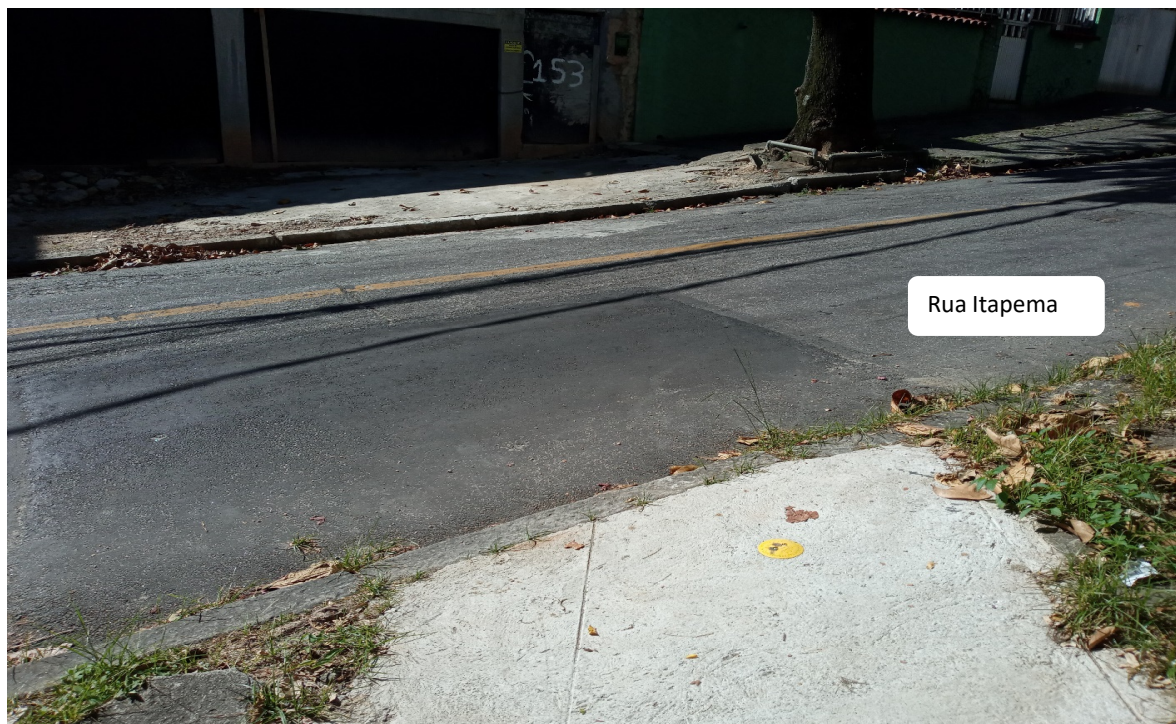


Foto 9: Ponto de interligação de rede



Foto 10: Recomposição da via
