

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-065/22		2 - Data da Fiscalização: 06/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Av. Dom Hélder Câmara, n.º 2514		5 - Bairro(s): Bonsucesso	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 06 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Av. Dom Hélder Câmara, n.º 2514 a 2756. Estiveram presentes, nesta data, o funcionário da Concessionária, Marcos Vieira - Gestor de obras, e o da empresa Braços, Allan Mendonça - Supervisor de obras.

Trata-se de obra de renovação de rede de polietileno de 110 mm de diâmetro ($\emptyset$), a baixa pressão, em substituição à rede de ferro fundido de 100 mm de diâmetro ($\emptyset$), pelo método destrutivo (vala aberta).

O projeto teve início na travessia da esquina da Rua Tenente Abel Cunha (Foto 1) com a Av. Dom Hélder Câmara e finalizou no n.º 2756, esquina com a Rua Felix Ferreira, onde providenciou-se a conexão à futura rede de polietileno de 110 mm de diâmetro ($\emptyset$) do projeto RJ-BON-50225/2021 - já assentada no momento da vistoria (Foto 2). Também houve interligação à rede existente de polietileno de $\emptyset$ 110 mm na altura do n.º 19 da Rua Felix Ferreira.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária e constatou-se a conclusão da obra mecânica e da recomposição.

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Observação: as imagens foram autorizadas pelos presentes.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:

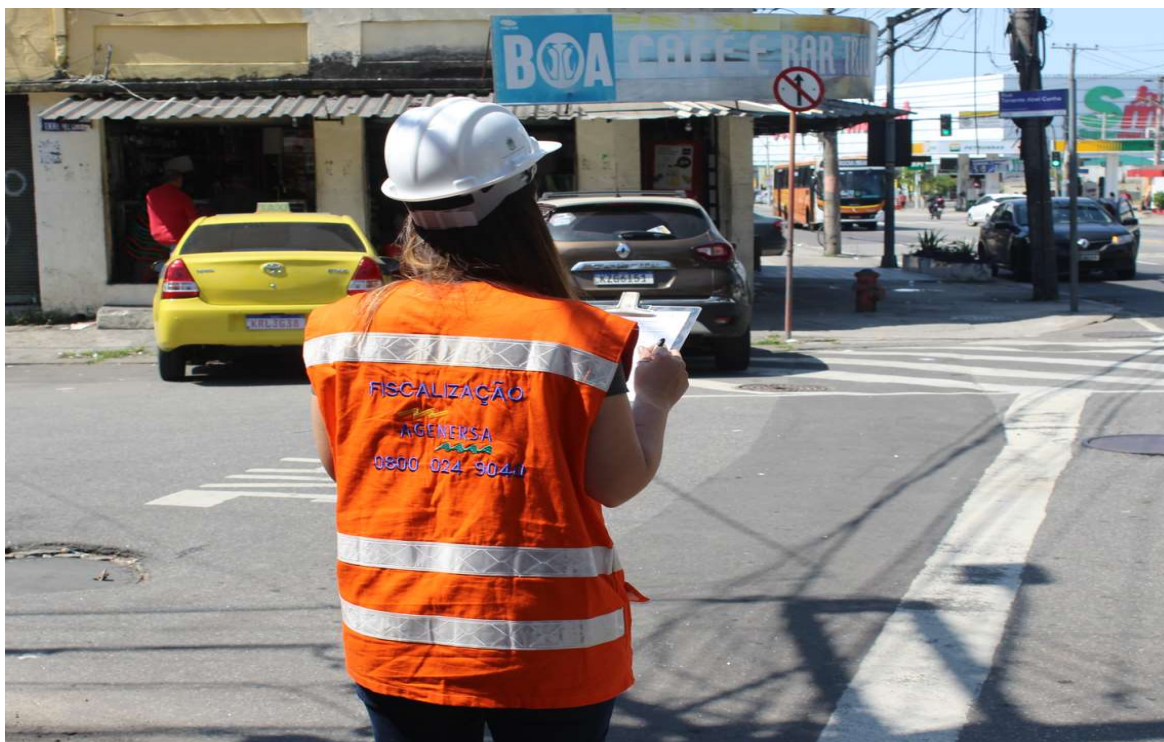


Foto 1 : ponto de travessia da obra



Foto 2 : interligação à rede existente

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição e marco plano



Foto 4 : recomposição e marco plano
