

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-069/22		2 - Data da Fiscalização: 08/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Almirante Baltazar, n.º 08 a 232			5 - Bairro(s): São Cristovão		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira				13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 08 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária das obras de renovação de rede da Rua Almirante Baltazar, n.º 08 (Início da obra, foto 1) a 232 (final da obra, foto 6).

Trata-se da renovação de rede e ramal para substituição de redes antigas de ferro fundido para redes novas em polietileno, de diâmetros e comprimentos descritos abaixo, sendo assentadas parte por método de inserção e parte por método destrutivo.

Foram construídos um total de 282 metros de rede com Ø90 mm em PE e 42,10 metros de ramal em PE, sendo, 4,20 metros com Ø90 mm, 28,75 metros com Ø63 mm e 9,15 metros com Ø32 mm.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira/44171625

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Vistoria in loco da equipe técnica da AGENERSA (CAENE).



Foto 2 : Recomposição permanente da travessia na rua Almirante Baltazar n.º 8.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Recomposição da pista no trecho da rua Almirante Baltazar, n.º 44 a 56.

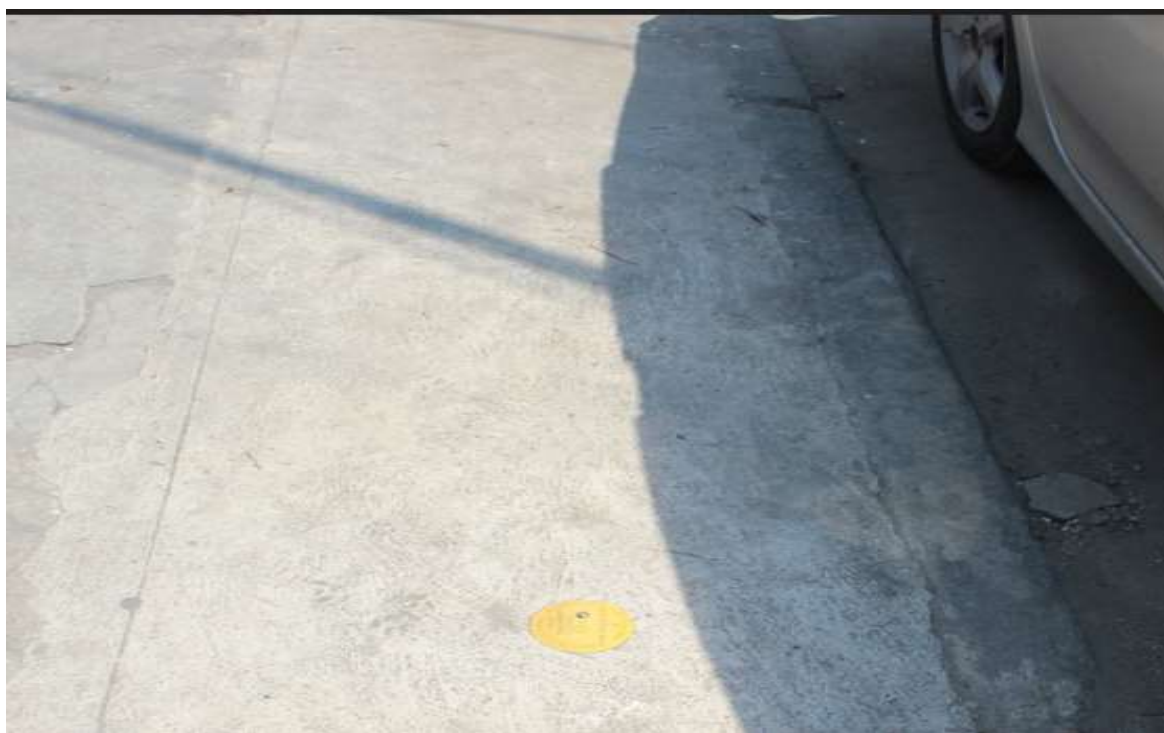


Foto 4 : Marco plano e recomposição da calçada da rua Almirante Baltazar, n.º 44.

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Marco plano e recomposição da calçada.



Foto 6 : Válvula de segurança no final da obra na rua Almirante Baltazar, n.º 230.
