



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 20, 2024, 9:28:14 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_CASTELANIA\_140\_DSS\_EA\_IR\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção de guarda-corpo
- concreto projetado
- construção/reparo de passeio
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- biomanta

## Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- dreno profundo
- escada hidráulica

## Observação:

**Obra de contenção no condomínio. Moradias em ruínas. Problema principal no local relacionado a falta de estrutura de drenagem. Recomenda-se a remoção das árvores de alto porte da crista do talude, pois o processo encontra-se ativo. Não lançar lixo e entulho na encosta.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz.**


Foto2



Descrição da foto2

**Obra de contenção sem manutenção.**

Foto3

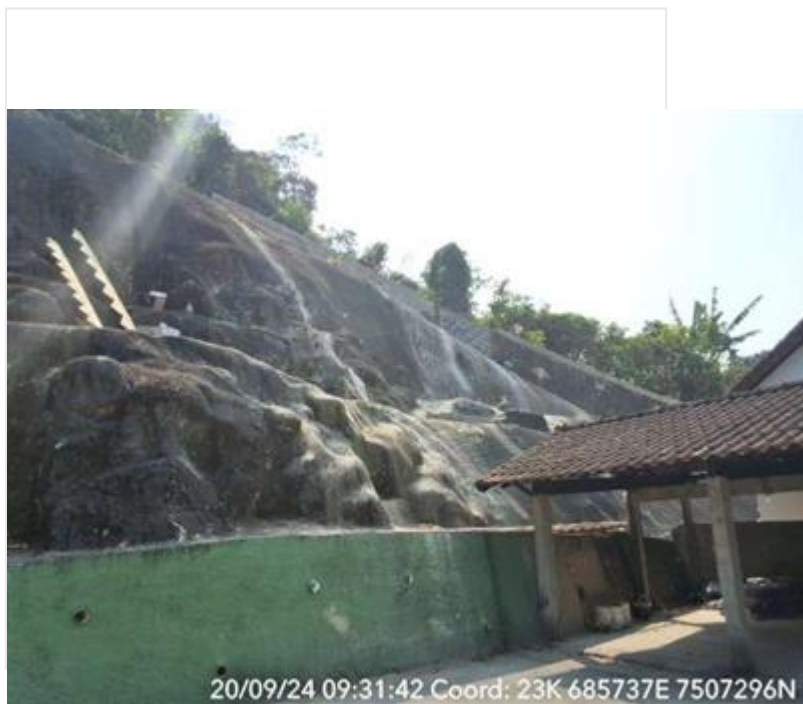

Descrição da foto3

**Condominio.**

Foto4



Descrição da foto4

**A montante do condominio. Processo ativo de deslizamento com mobilização da árvore de alto porte, em direção ao condominio.**
