

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_075_24	2 – Data da Fiscalização: 12/07/2024 e 13/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Intendente Cunha Menezes	5 – Bairro(s): Méier	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MEI-53216/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 10/06/2024	Conclusão: 28/08/2024	Extensão projetada: 300 m	Total realizado: 239,06 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

O item 14 consta como insuficiente, pois foram encontrados trechos de recomposição de asfalto desnivelados e com rachaduras.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Claudio Maia, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Intendente Cunha Menezes, no bairro do Méier.

Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação por uma nova em PE Ø160mm. Toda a extensão está sendo assentada por método destrutivo (foto 1). O trecho renovado estende-se da Rua Intendente Cunha Menezes, 229 (foto 2) até o seu cruzamento com a Rua Dias da Cruz (foto 3). Restam ainda as interligações com a malha já existente nas extremidades do trecho e em frente às Ruas Nida e Bueno de Paiva.

Durante a fiscalização, foi constatado que o trecho de recomposição do asfalto na Rua Intendente Cunha Menezes, entre as ruas Dias da Cruz e Bueno de Paiva, possuía desníveis, ondulações e rachaduras (fotos 4 e 5). Em virtude disso, foi solicitada a correção da recomposição nesse percurso, a qual foi realizada e a comprovação fotográfica enviada (fotos 6 e 7), posteriormente, pelo gestor da obra. Entretanto, para uma melhor apuração das correções executadas, foi necessária uma nova vistoria. Diante dessa nova visita, no dia 13/08/2024, entendemos que a recomposição atendeu ao requisitado (fotos 8 e 9).

12 – Recomendações:

Foi solicitada a correção da recomposição do asfalto na Rua Intendente Cunha Menezes, entre as ruas Dias da Cruz e Bueno de Paiva, conforme relatado no item 11.

13 – Conclusão:

Foi constatado que o trecho de recomposição do asfalto na Rua Intendente Cunha Menezes, entre as ruas Dias da Cruz e Bueno de Paiva, possuía desníveis, ondulações e rachaduras. A correção da recomposição nesse percurso foi realizada, comprovada pelas fotos enviadas pelo gestor e por meio de nova vistoria realizada no dia 13/08/2024, conforme descrito no item 11.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 14/08/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: tubulação assentada por método destrutivo.



Foto 2: início da obra na Rua Intendente Cunha Menezes, 229.

FOTOS



Foto 3: final da obra na esquina com a Rua Dias da Cruz.



Foto 4: recomposição com desníveis e ondulações.

FOTOS



Foto 5: recomposição com rachadura.



Foto 6: correção da recomposição enviada pelo gestor da obra.

FOTOS

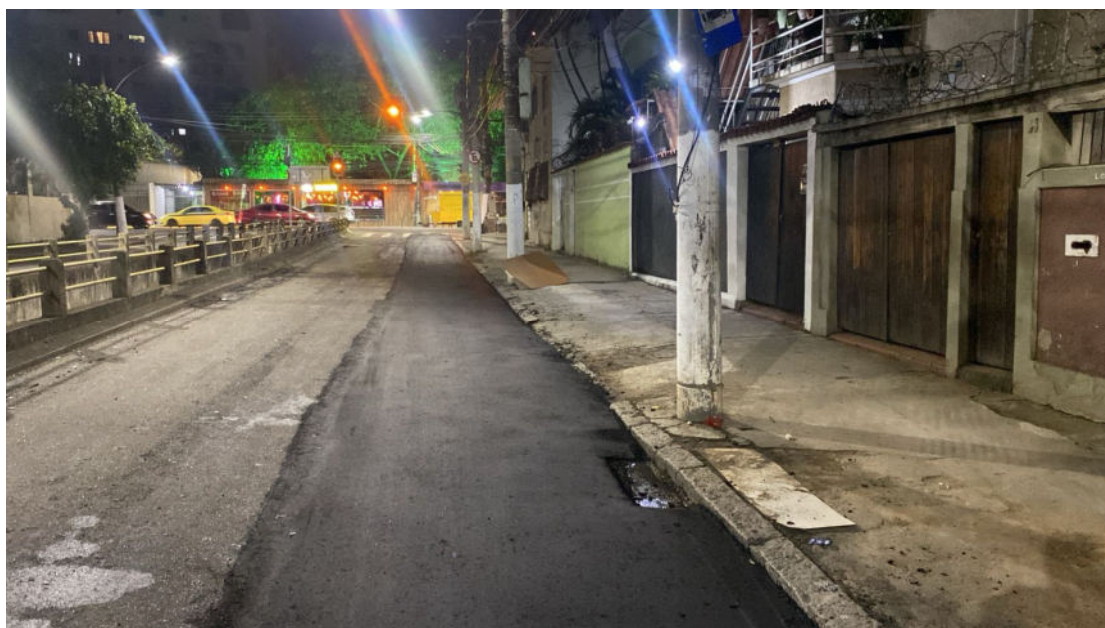


Foto 7: correção da recomposição enviada pelo gestor da obra.



Foto 8: correção da recomposição verificada na segunda vistoria.



Foto 9: correção da recomposição verificada na segunda vistoria.
