

1- RF CAENE Nº: P-063/23	2 - Data da Fiscalização: 19/06/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Nova York	5 - Bairro(s): Bonsucesso	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 19 de junho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenersa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de junho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Marcos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município.

Trata-se de obra de renovação de rede e ramal de gás natural, em fase inicial, com tubos de polietileno de baixa pressão com os seguintes diâmetros: 110 mm, 90 mm e 63 mm.

A obra será realizada nos dois lados da Avenida Nova York. No lado par já foram assentados, por método destrutivo, uma extensão de 179,20 m de PE DN 90 mm e 43,20 m de PE DN 110 mm. Esse trecho iniciou-se próximo ao nº 332 e se encontra parado na Avenida Bruxelas, nº 351.

Foram construídos 5 ramais de tubo PE DN 63 mm de baixa pressão.

A recomposição existente ainda é provisória. Foi realizada a fresagem do asfalto para proceder o recapeamento.

A obra se encontra paralisada por necessidade da equipe realizar serviço de travessia de rede sob linha férrea na estação de trem Bonsucesso.

O trecho construído ainda não está em carga e não há marco plano fixado.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra



Foto 2: Fresagem e recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória



Foto 4: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Fresagem e recomposição provisória



Foto 6: Ponto onde a obra se encontra parada

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Local de vivência

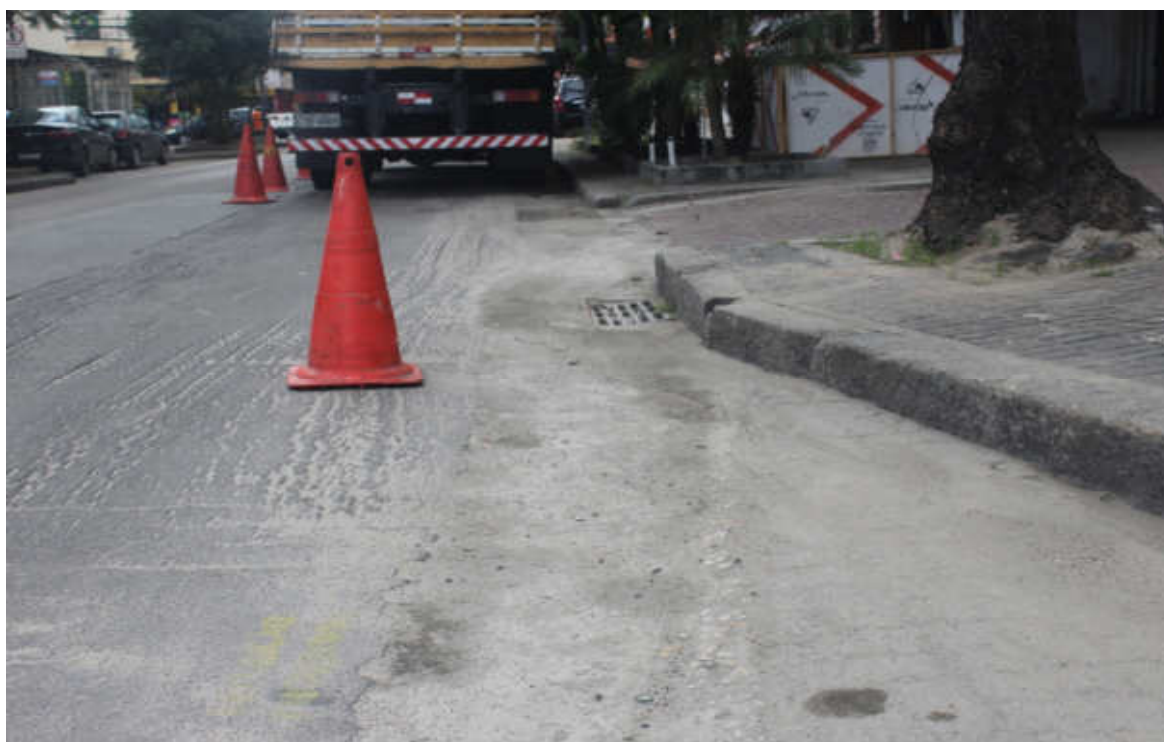


Foto 8: Sinalização de desvio de trânsito e recomposição provisória
