

1 - RF CAENE Nº: P-087/22		2 - Data da Fiscalização: 20/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Francisco Crisóstomos, Nº 56		5 - Bairro(s): São Luiz	6 - Município: Volta Redonda
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município de Volta Redonda.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 20 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 26 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Leandro Amaral, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, sob supervisão da Concessionária das obras de expansão de rede localizada na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, Nº 56.

Trata-se de obra de expansão com previsão de construção de 3989,6m de rede sendo:

- 3864,6m com Ø160mm em PE;
- 98m com Ø63mm em PE;
- 27m com Ø6" em aço.

Do previsto já foram assentados 1719m de rede, conforme lista abaixo, por método não destrutivo:

- 1621 metros de rede com Ø160 mm em PE;
- 98 metros de rede com Ø63 mm em PE.

Durante a nossa vistoria verificou insuficiência na sinalização de pedestre e de trânsito e não foi possível identificar se o extintor de incêndio estava dentro da validade, entretanto, tais irregularidades foram sanadas, conforme podemos observar nas fotografias abaixo (fotos 2,6,12 e 15).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas algumas irregularidades quanto à conservação de tapumes, sinalizações e validade do extintor de incêndio, entretanto, foram corrigidas conforme comprovação fotográfica.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Tapume sem sinalização luminosa.



Foto 2: Tapume com sinalização luminosa.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Derivação de rede e ramal.



Foto 4: Equipe da AGENERSA durante a vistoria na Avenida Francisco Torres.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Manômetro utilizado no teste de estanqueidade da rede.



Foto 6: Tapume com sinalização incompleta.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Tapume com sinalização.



Foto 8: Perfuratriz hidráulica.



Foto 9: Perfuratriz hidráulica após ser usada na obra.

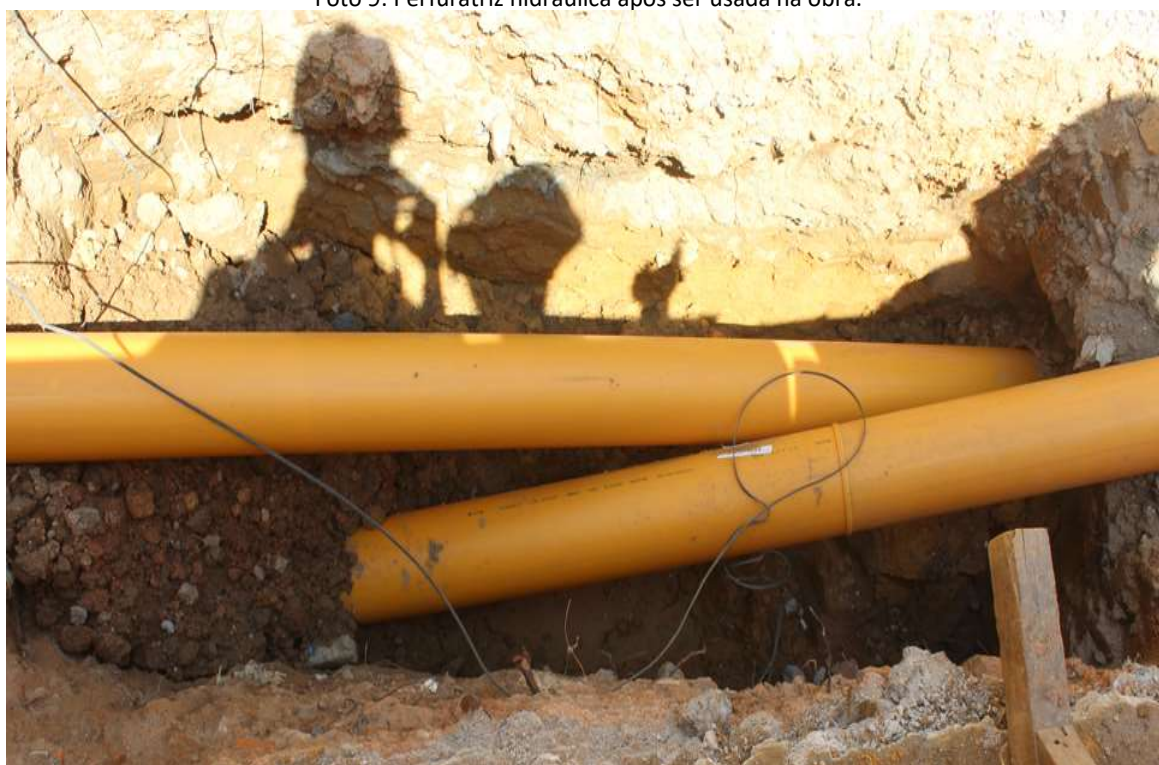


Foto 10: Interligação da rede.



Foto 11: Tapume desalinhado (antes).



Foto 12: Tapume alinhado (depois).



Foto 13: Área de vivência



Foto 14: extintores com inspeção irregular (antes).



Foto 15: extintores com inspeção regularizada (desvio)



Foto 16: Tapume com sinalização indicando o desvio.
