

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_093_24	2 – Data da Fiscalização: 05/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Cesário Alvim	5 – Bairro(s): Humaitá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Humaitá.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-HUM-53011/2022	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: Concluído	Data de início: 01/12/23	Conclusão:	Extensão projetada: 518,10 m	Total realizado: 518,10 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

- Os itens 1 ao 18 não se aplicam porque a obra já estava finalizada.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Adriano Calaça, com o objetivo de verificar o andamento das obras na rua Cesário Alvim, no Humaitá, Rio de Janeiro.

Trata-se de obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø90 e 63 mm em baixa pressão e possui uma extensão total de 518,10 metros. O trecho assentado no lado ímpar foi realizado por método destrutivo com tubulação PE Ø90 mm e no lado par está sendo realizado por método de inserção em rede de ferro fundido de Ø100 mm com tubulação de PE Ø63 mm.

A data de início da obra foi em 1 de dezembro de 2023, e foram executados cerca de 26 ramais e a mesma já está com carga. O ponto de interligação das obras está localizado na rua David Campista, e ela utiliza tubulação de ferro fundido, com cerca de 4 polegadas de diâmetro. O trecho construído se encontra em carga e com a sinalização de marco plano em toda a extensão da rede, indicando presença de rede de gás. Todos os trechos já se encontram com recomposição permanente.

Durante a vistoria, constatou-se que a obra já havia sido finalizada. Não foram encontradas grandes irregularidades, à exceção de um buraco no ramal, como mostrado na foto 18. No entanto, o gestor enviou a foto com a recomposição, conforme exibido na foto 20.

A vistoria teve início às 13h50 e encerramento às 14h30.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação.


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 06/08/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Recomposição permanente



Foto 2: Recomposição permanente.

FOTOS



Foto 3: Recomposição permanente.



Foto 4: Recomposição permanente.

FOTOS



Foto 5: Recomposição com o marco plano.



Foto 6: Recomposição na calçada.

FOTOS



Foto 7: Recomposição.



Foto 8: Recomposição.

FOTOS



Foto 9: Recomposição.

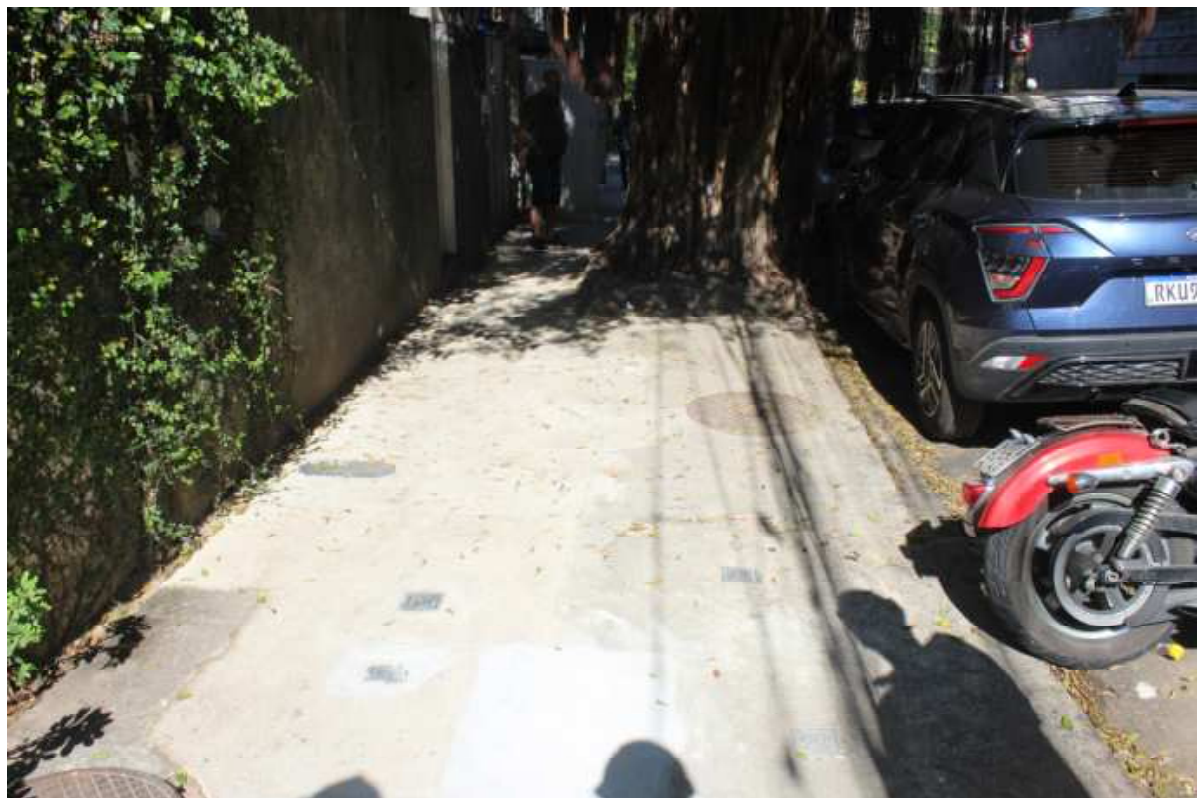



Foto 10: Recomposição.

FOTOS



Foto 11: Recomposição.



Foto 12: Recomposição.

FOTOS



Foto 13: Recomposição



Foto 14: Recomposição.

FOTOS



Foto 15: Recomposição.



Foto 16: Recomposição.

FOTOS



Foto 17: Recomposição



Foto 18: Irregularidade encontrada

FOTOS

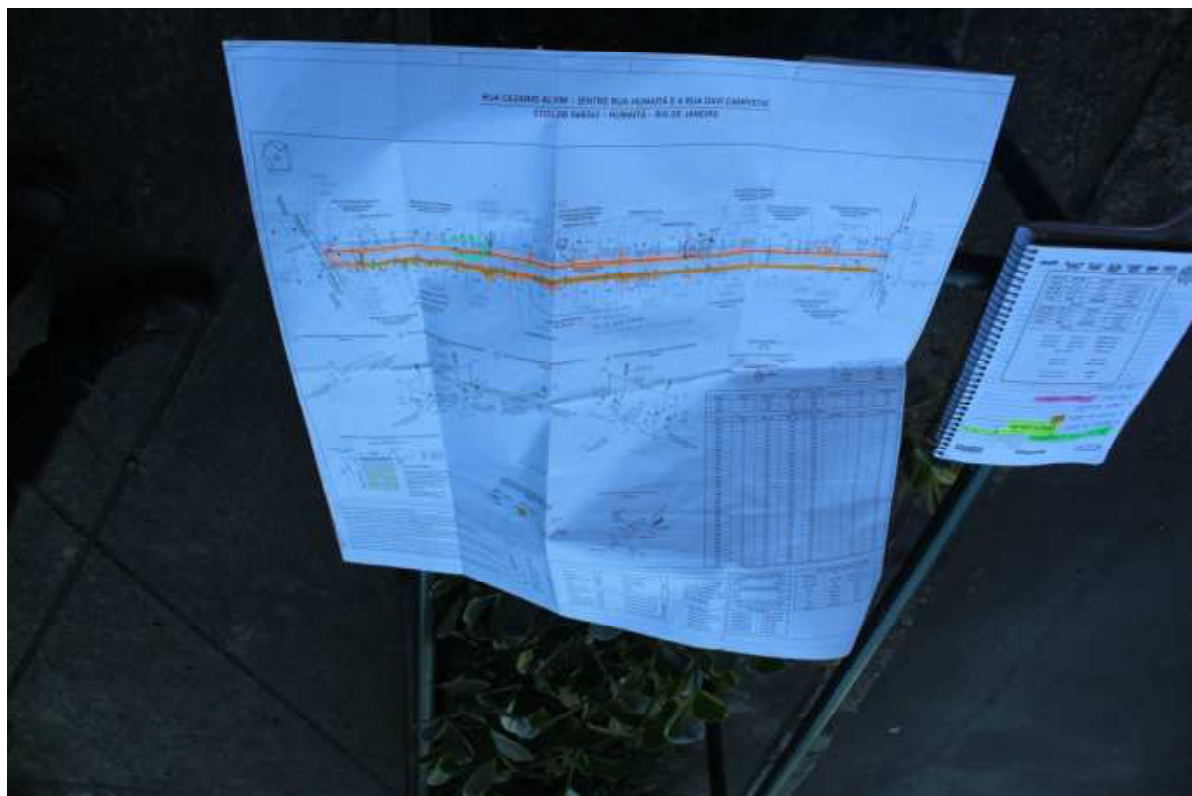


Foto 19: Projeto da obra.



Foto 20: Irregularidade sanada.
