

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_098_24	2 – Data da Fiscalização: 14/08/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Justiniano da Rocha	5 – Bairro(s): Vila Isabel	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA


Número do Projeto: RJ-VIL-53073/2023	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 31/02/2024	Conclusão: 15/09/2024	Extensão projetada: 995 m	Total realizado: 900 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:		
11 – Relatório: Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo Ricardo Pereira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Justiniano da Rocha, no bairro de Vila Isabel. Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de Ferro Fundido por uma nova em PE Ø4". Serão duas redes paralelas de PE substituindo uma rede única de FF, uma em cada lado da rua. A extensão renovada percorre a Rua Justiniano da Rocha entre as Ruas 28 de setembro (foto 1) e 8 de dezembro (foto 2). Um lado (lado ímpar) encontra-se todo assentado, com metade da linha já em carga. O outro lado (lado par) falta uma pequena extensão da obra ainda.		
12 – Recomendações:		
13 – Conclusão: No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.		
14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Liza Lopes de Moura	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144915-3
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 19/08/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS

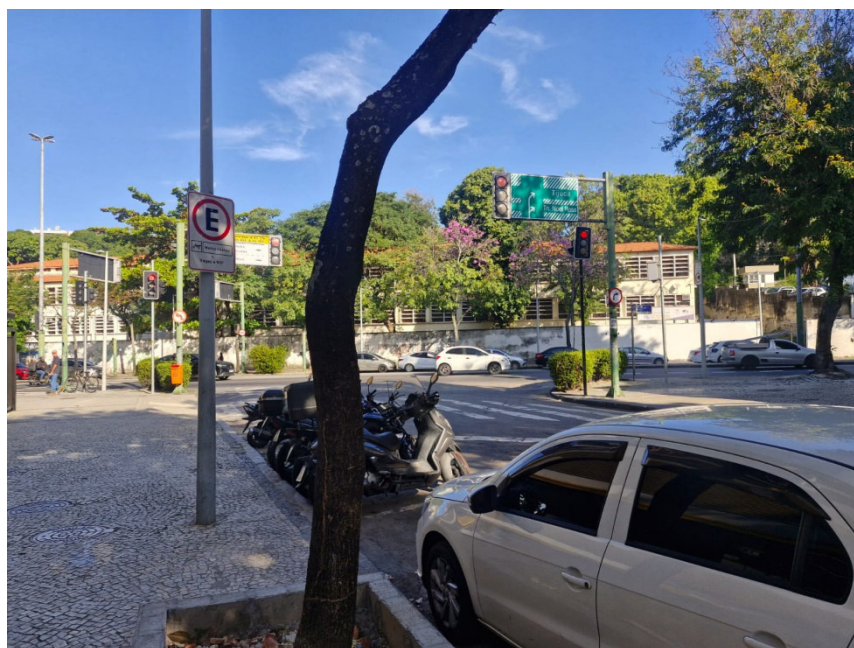


Foto 1: Rua 28 de Setembro.



Foto 2: Rua 8 de Dezembro.

FOTOS



Foto 3: Identificação da obra.



Foto 4: Rua Justiniano da Rocha.
