

1 - RF CASAN N°: 135/2023	2 - Data da Fiscalização: 04/05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: RIO + SANEAMENTO - Bloco 3
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Gen. Azeredo	5 - Bairro(s): Realengo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Água Tratada Boaçu, a cargo da Concessionária. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 – Representes designados pela Concessionária: Armindo Bruno de Jesus – Supervisor de Operações Jean Carlos Martins – Operador		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 12214 12218		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Henrique Vieira Silva	13 – ID Funcional: 5132859-3	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de junho de 2023 Luiz Henrique V. Silva Engenheiro - CASAN ID 5132859-3 De acordo Robson Cardinelli Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID -4184220-0		


A EEAT Boaçu foi implantada para abastecer a Comunidade de Boaçu, sendo ligada 2 a 3 vezes por semana pelo SR. Luiz Moraes , líder comunitário.

17. CHECKLIST (ÁGUA POTÁVEL)

DESCRIÇÃO - EEAT	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação	X		
02. Cercado e Isolado			X
03. Condições de conservação, limpeza	X		
04. Condições da estrutura e alvenaria	X		
05. Condições de acesso externo/iluminação	X		
06. Condições de acesso interna	X		
07. Condições da laje de cobertura/tampão F°F°			X
08. Esquadrias e ventilações	X		
09. Condições da tubulação de entrada	X		
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de pressão ou manômetro		X	
12. Válvula de retenção do requalque			X
13. Macromedidor		X	
14. Válvula Gaveta/ Borboleta	X		
15. Grupo reserva		X	
16. Monovia, talha			X
17. Drenagem da caixa da EEAT			X
18. Estanteidade das tubulações e bomba	X		
19. Quadro de Comando, Telemetria		X	
20. Instalações elétricas/ padrão	X		

18. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

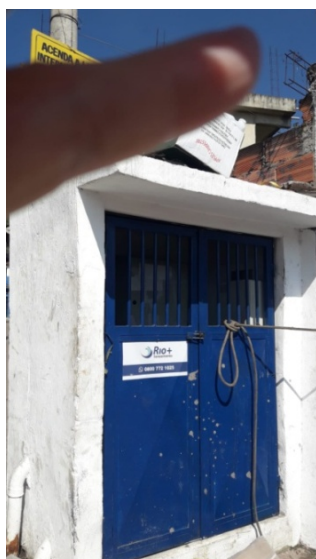

Local

EEAT Boaçu, identificada com logo da Rio + Saneamento.

FOTO 2



Local

Quadro elétrico bem montado da
EEAT de Boaçu.

FOTO 3



Local

Bomba de 3cv da **EEAT de Boaçu**, com vazamento sobre os cabos. Sr. Luiz Morais (998590579) da Comunidade que opera manualmente o sistema informou que a bomba foi trocada e esta não consegue abastecer toda a comunidade. Tem telemetria mas esta inoperante.

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Concessionária deverá assumir a operação da EEAT Boaçu apesar de ser comunidade e não trazer retorno financeiro. Verificar potência da bomba pois o Sr. Luiz que opera a bomba manualmente declarou que não consegue abastecer toda comunidade.

Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, a CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam vir referente ao relatório.
