



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 11:15:32 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar as moradias do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1

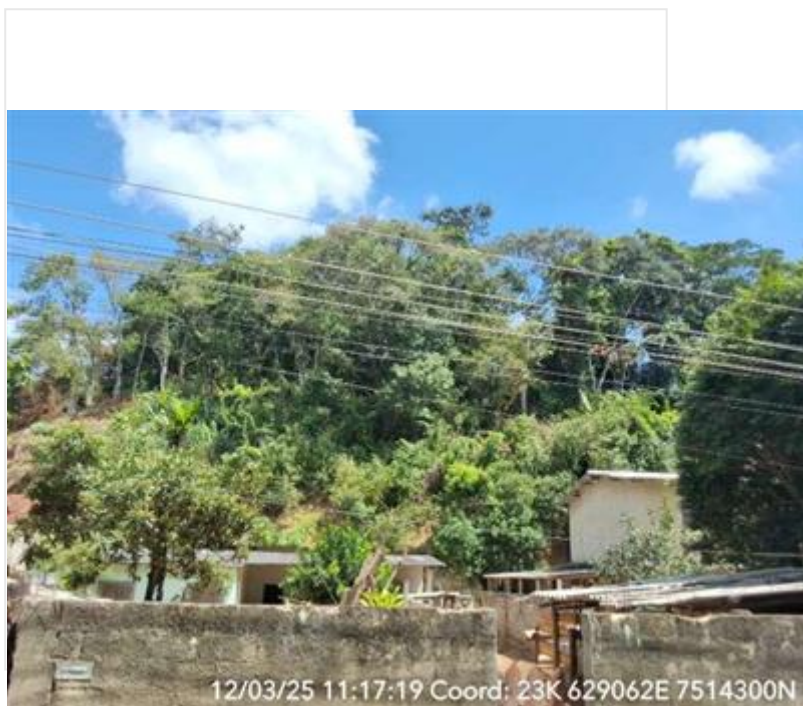

Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado na base do talude de corte/encosta.
