



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 9:25:17 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar o imóvel.

Fotos da ocorrência

Foto1

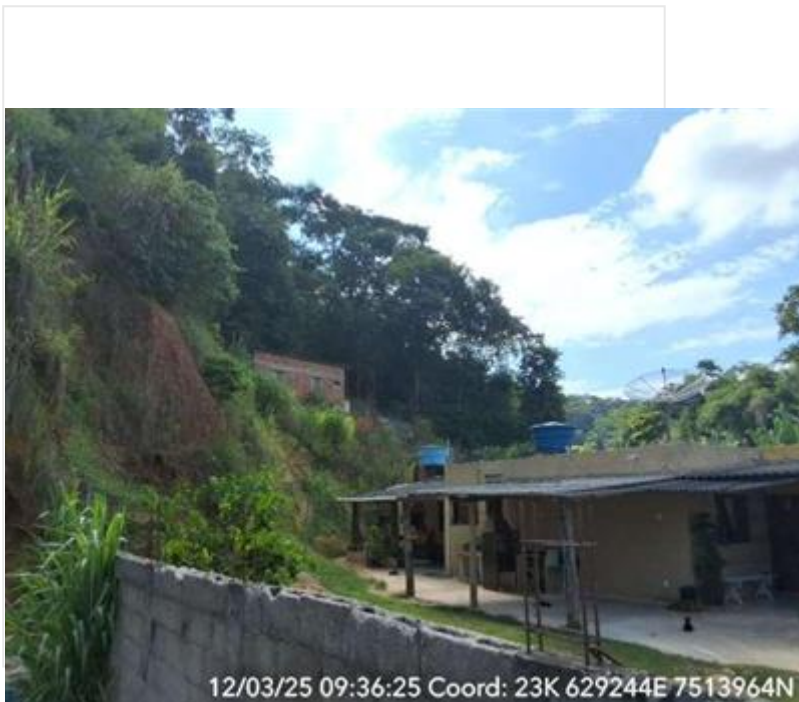

Descrição da foto1

Muro no sopé do talude de corte/encosta (em "L" invertido onde existe espaço para a sua execução e em concreto armado nos demais locais). Solo grampeado a montante, em toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Seguir com as soluções sugeridas. Executar escada hidráulica encaixada na drenagem natural.
