



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 4:03:47 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__19

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal. Moradora local relatou a ocorrência de queda de árvore com atingimento no imóvel.

Fotos da ocorrência

Foto1

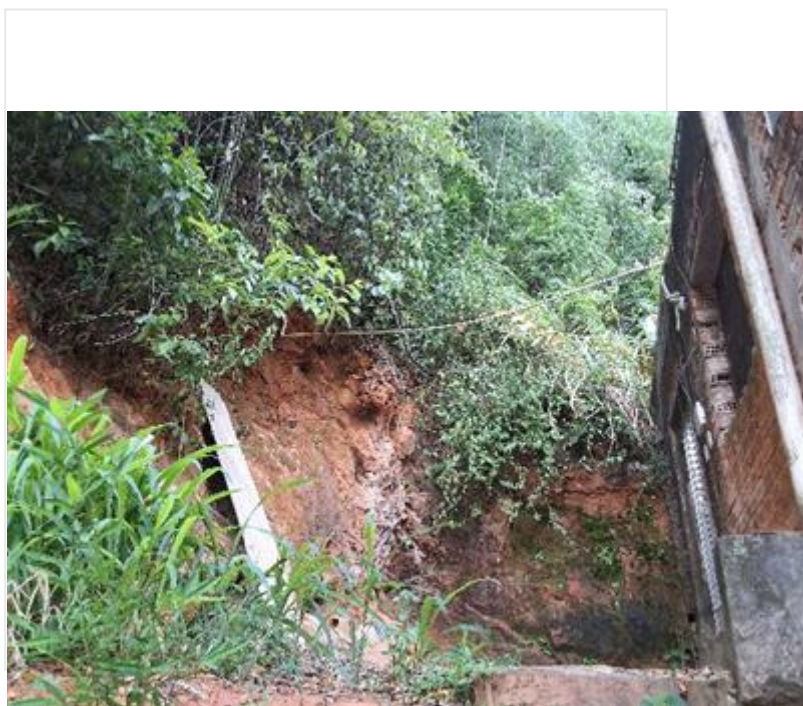

Descrição da foto1

Cicatriz pretérita: muro de concreto armado na lateral da residência.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro e contemplando a encosta à esquerda do polígono (SW), a qual apresenta feições de instabilidade.

Foto3



Descrição da foto3

Edificação localizada em drenagem natural. Reforçar as estruturas de drenagem no setor.
