



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 19, 2025, 10:24:52 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_202_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1

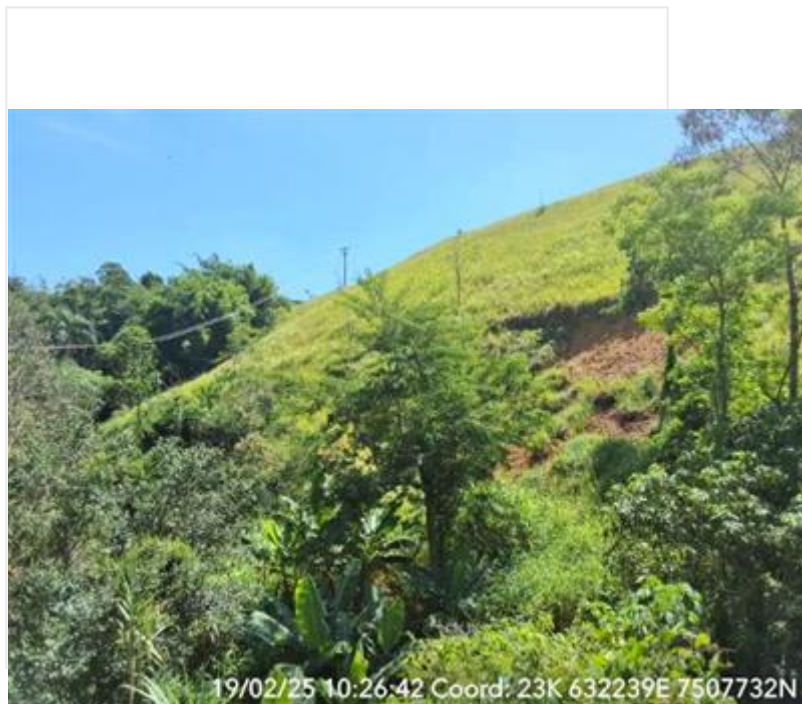

Descrição da foto1

Solo grampeado com face verde na cicatriz e no entorno da encosta. Vigota estacada a montante do solo grampeado.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado no sopé da encosta. Execução de escada hidráulica no setor e canaletas a montante do muro.

Foto3



Descrição da foto3

Guarda-corpo na passarela de acesso às moradias e muro de gabião na margens do córrego.
