



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Mar 19, 2025, 3:10:53 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_SantaRosa\_254\_DS\_TB\_\_16**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- dreno profundo

Observação:

**Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação de médio a alto porte.**

Fotos da ocorrência

Foto1

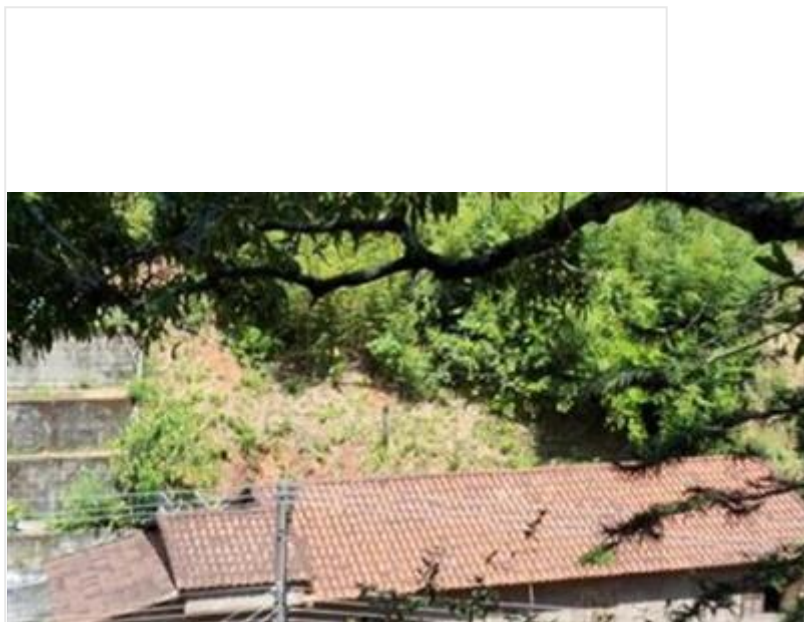


Foto1-20250320-112831.jpg

Descrição da foto1

**Muro de concreto armado em edificação encaixada em talude de corte. Biomanta a montante do muro.**

Foto2



Foto2-20250320-112154.jpg

Descrição da foto2

**Remover o muro de contenção que apresenta avarias, e executar muro de concreto armado no local. Reforçar trechos do muro com dhps.**

Foto3



Foto3-20250320-112424.jpg

Descrição da foto3

**Executar solo grampeado contemplando todo o polígono onde há feições de instabilidade. Ressalta-se a necessidade de estruturas de drenagem eficientes.**

