



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 16, 2024, 9:35:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__23

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Solo grampeado na área vegetada à jusante das moradias. Drenagem em todo o polígono. FORAM OBSERVADOS NOVOS DESLIZAMENTOS EM AGOSTO DE 2024.

Fotos da ocorrência

Foto1

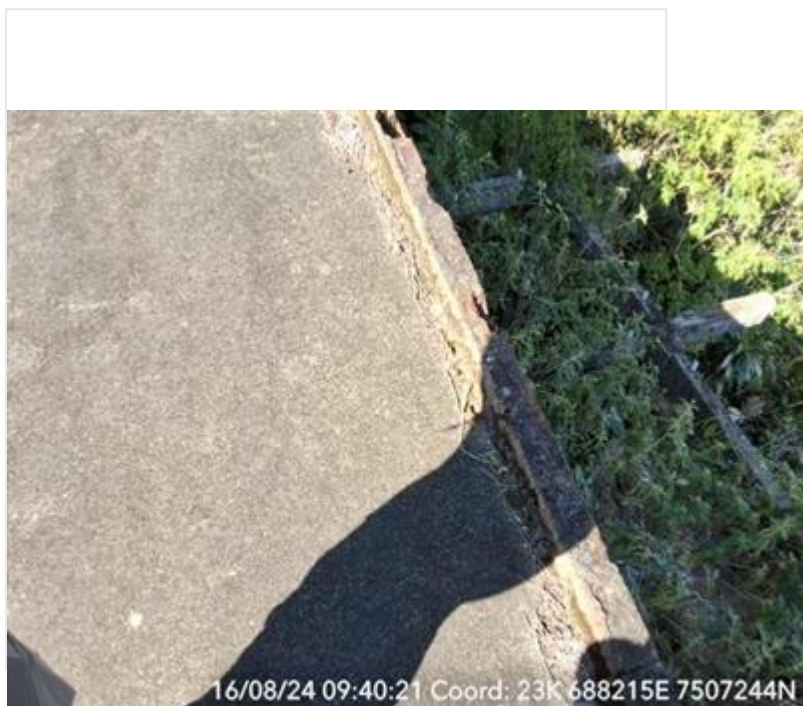

Descrição da foto1

Novo deslizamento observado.

Foto2



Descrição da foto2

Moradias à montante de talude com sinais de movimentação.
