



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 9:43:01 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_252_DSS_JP_MR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução de DHP
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Muro de concreto armado atrás da casa ao lado do no. 267s. Solo grampeado para suporte da servidão. Refazer muro de pedra rompido na servidão próximo ao no. 267e. Muro de concreto ciclópico na base da rua, na lixeira. Tela chumbada na base da servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1

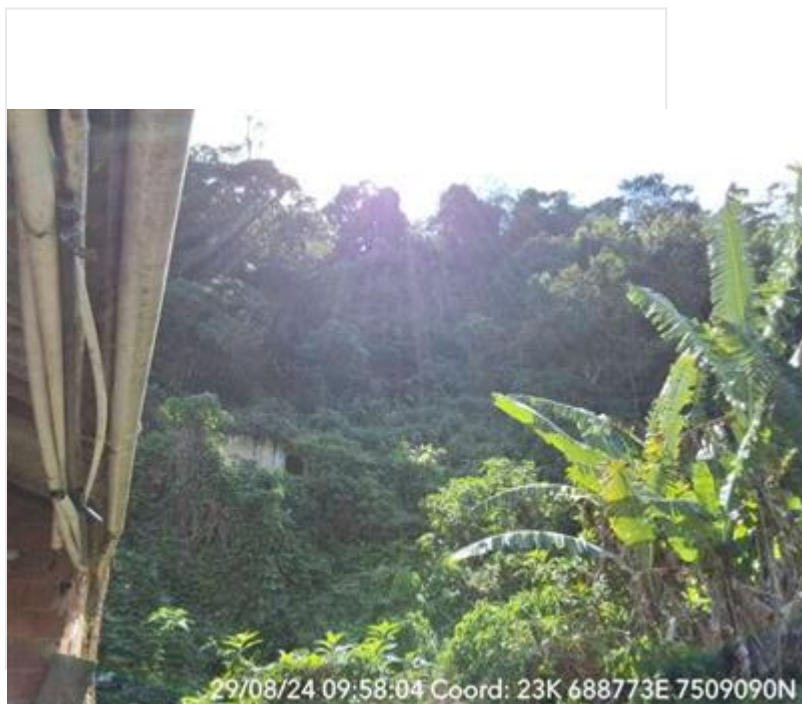

Descrição da foto1

Casa ao lado do no. 267s

Foto2



Descrição da foto2

Escorregamento à jusante da servidão.

Foto3



Descrição da foto3

Muro necessita de reparo.

Foto4



Descrição da foto4

Necessita de um muro de contenção.
