



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 27, 2024, 11:18:09 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Escorregamento abaixo da rua: cortina atirantada e solo grampeado abaixo (em todo o anfiteatro). No maciço rochoso fraturado: contrafortes, tela chumbada e barreira dinamica para proteger as moradias à jusante. Drenagem em TODO o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1

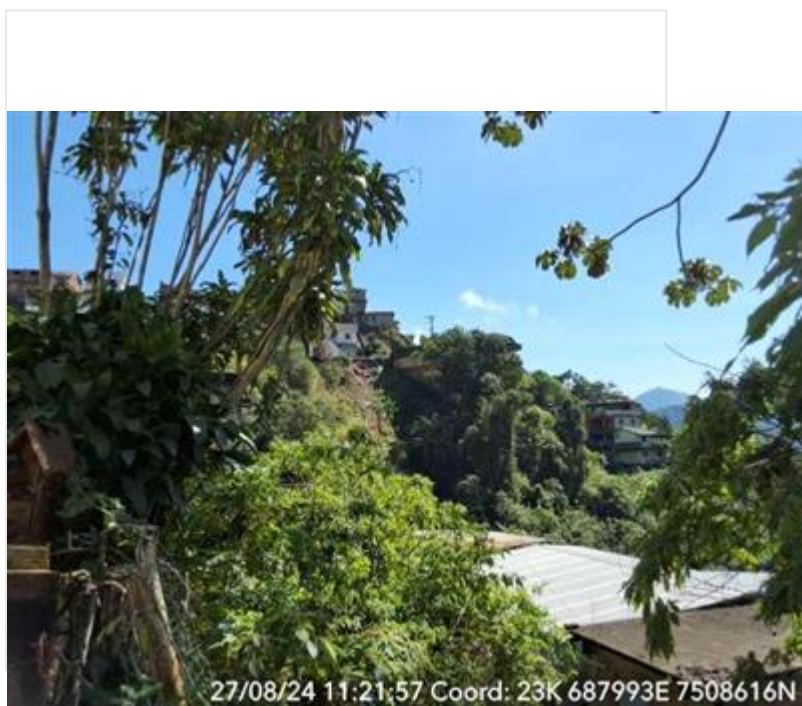

Descrição da foto1

Escorregamento abaixo da rua.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso fraturado.

Foto3



Descrição da foto3

Drenagem necessita ser refeita.
