



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 11:34:17 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_334_DSS_EA_IR__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- concreto projetado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

No início da servidão, à esquerda: muro à montante para suporte de material e concreto projetado à jusante. Muro para suporte da 1a casa da escadaria. Solo grampeado com concreto projetado entre a 1a e a 2a casas da escadaria. Solo grampeado com face verde à montante do polígono. Drenagem no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz com material à montante.


Foto2



Descrição da foto2

1a casa na escadaria.

Foto3

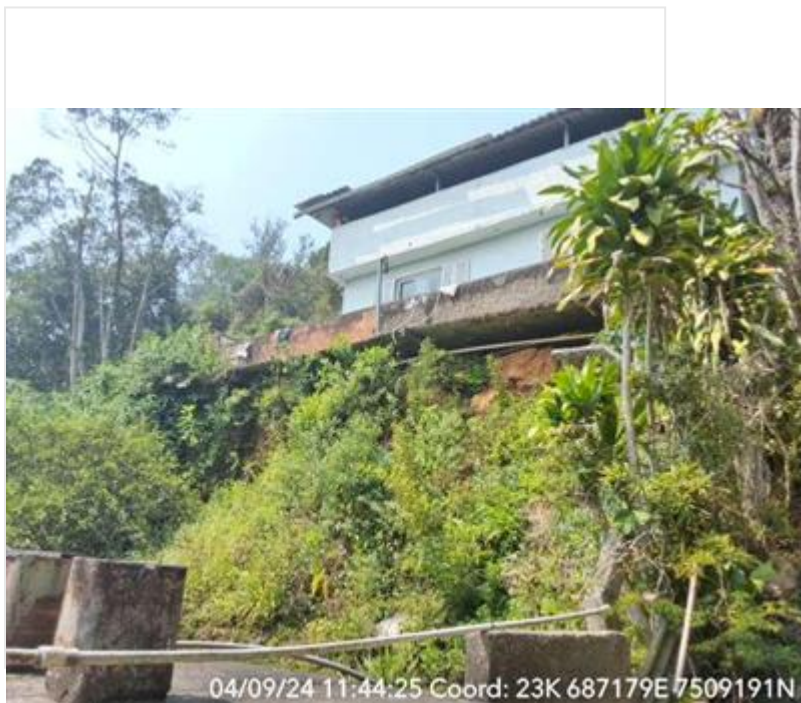

Descrição da foto3

Cicatriz entre a 1a e a 2a casas da escadaria.
