



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:19:28 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Cortina atirantada para suporte das moradias à montante e muro na base. Biomanta entre a cortina e o muro. Remoção de lixo.

Fotos da ocorrência

Foto1

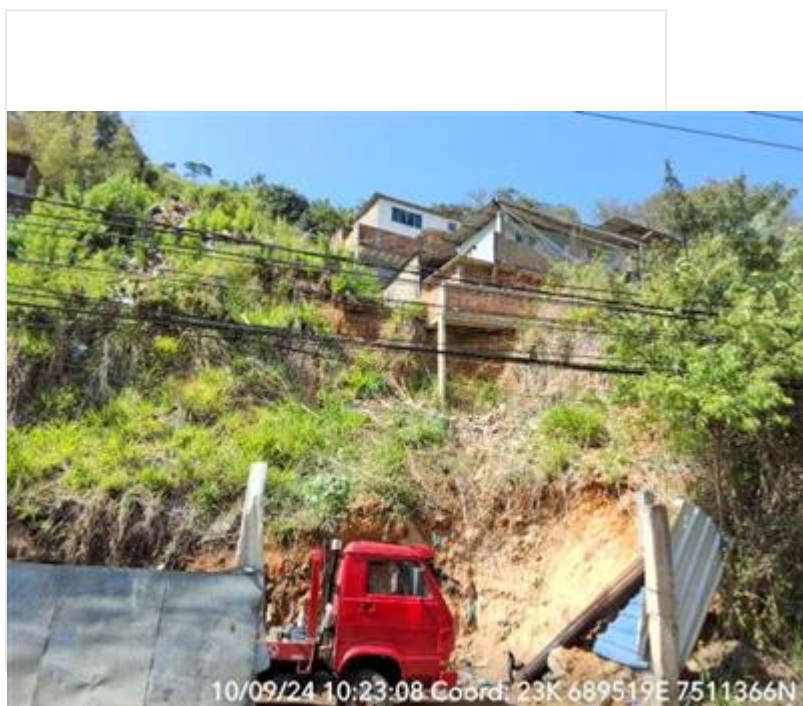

Descrição da foto1

Cicatriz à jusante de moradias.
