



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 11:45:39 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

À direita do n. 1752: cortina atirantada (a moradia aparenta não apresentar boa fundação - casa apoiada em aterro - e necessita suporte) e muro de concreto ciclópico na base. À jusante da moradia n. 1752: muro de concreto armado até a servidão e concreto projetado. No talude à montante do n. 1708: solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1

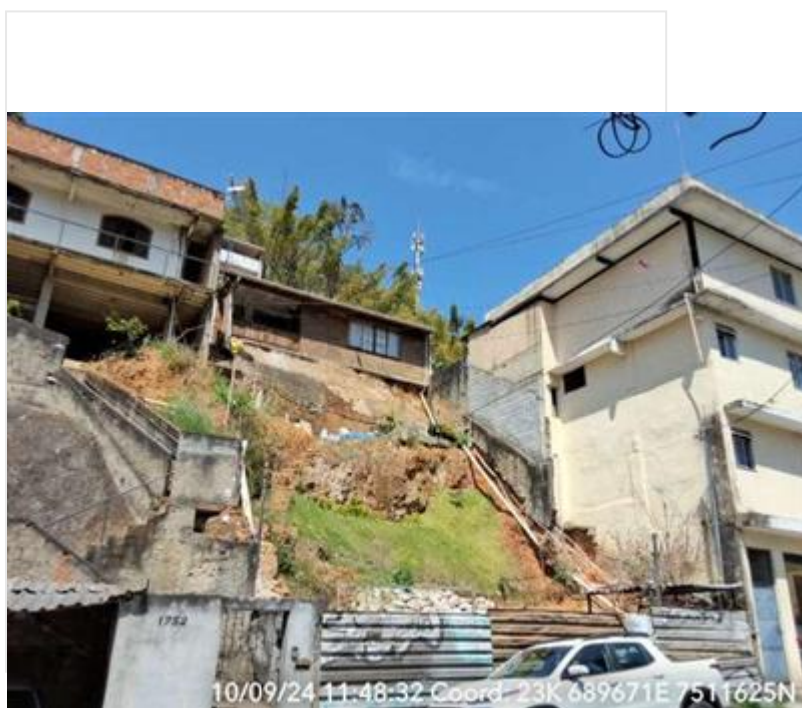

Descrição da foto1

À direita do n. 1752.

Foto2



Descrição da foto2

À jusante da moradia n. 1752.

Foto3



Descrição da foto3

Talude à montante do n. 1708.
