



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 11:45:12 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_LOPEZTROVAO_111_DSS_LT_MR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na cicatriz maior: solo grampeado, muro na base. Barreira dinamica encaixada na drenagem ao lado da lixeira. Cortina atirantada para suportar moradias à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1

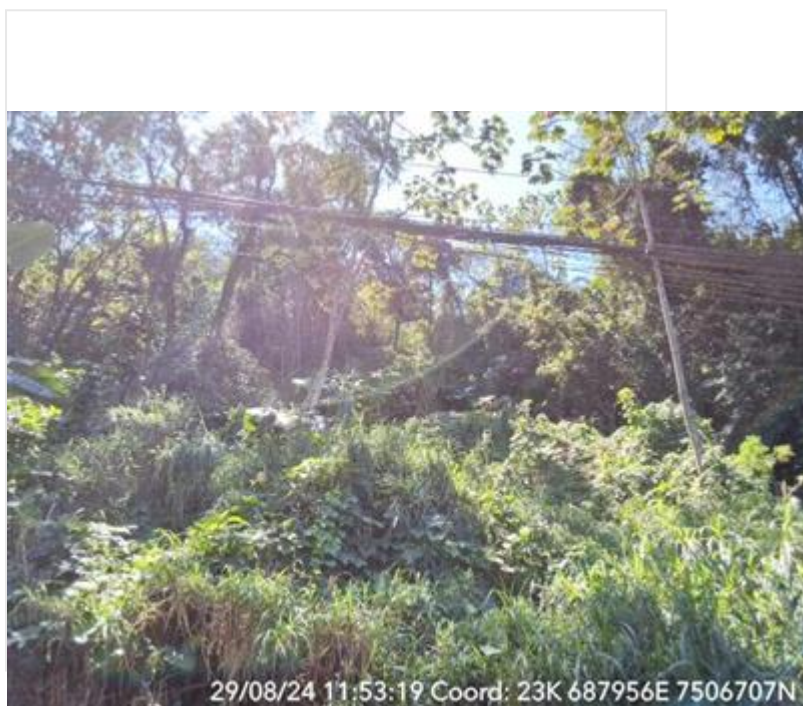

Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.

Foto2



Descrição da foto2

Drenagem ao lado da lixeira.

Foto3



Descrição da foto3

Casas à montante.
