



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 29, 2024, 10:13:43 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MORIN_212_DSS_MR_SC__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Cicatriz maior: vigota chumbada para conter solo mais desenvolvido à montante da cicatriz e biomanta ao longo da cicatriz. Barreira dinamica encaixada na drenagem. Cicatriz menor: solo grampeado e muro na base.

Fotos da ocorrência

Foto1

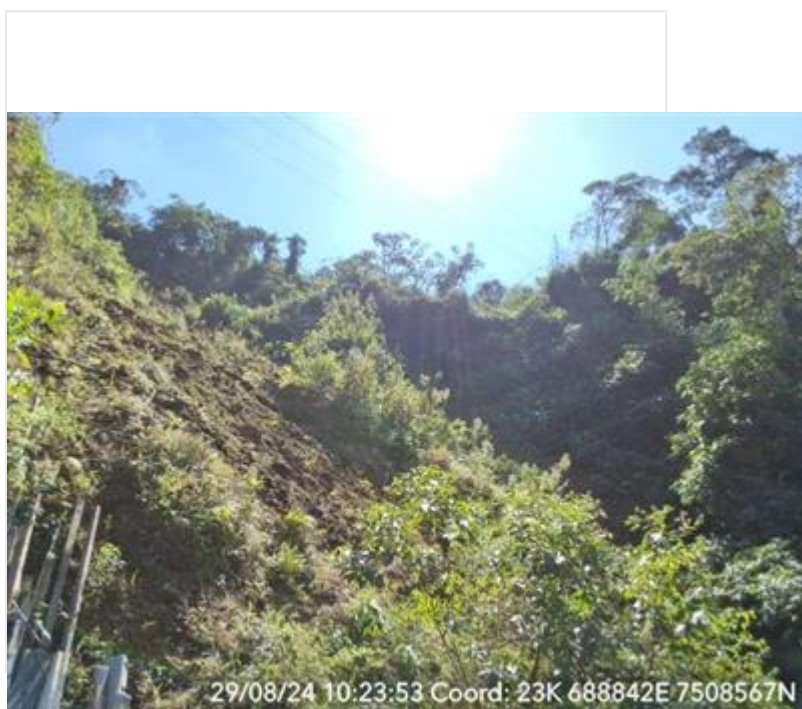

Descrição da foto1

Cicatriz maior.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz menor.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz menor.
