



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 11:04:50 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_MOSELA_390_DSS_IR_LT__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Solo grampeado no trecho da escadaria (em ambos os lados). Refazer concreto projetado onde necessário. Solo grampeado na cicatriz vegetada entre a antepenúltima e a penúltima casas do polígono, no patamar sem escadas. Solo grampeado à jusante da última casa. Muro na esquerda da escadaria, no final do polígono, para suportar o talude. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1

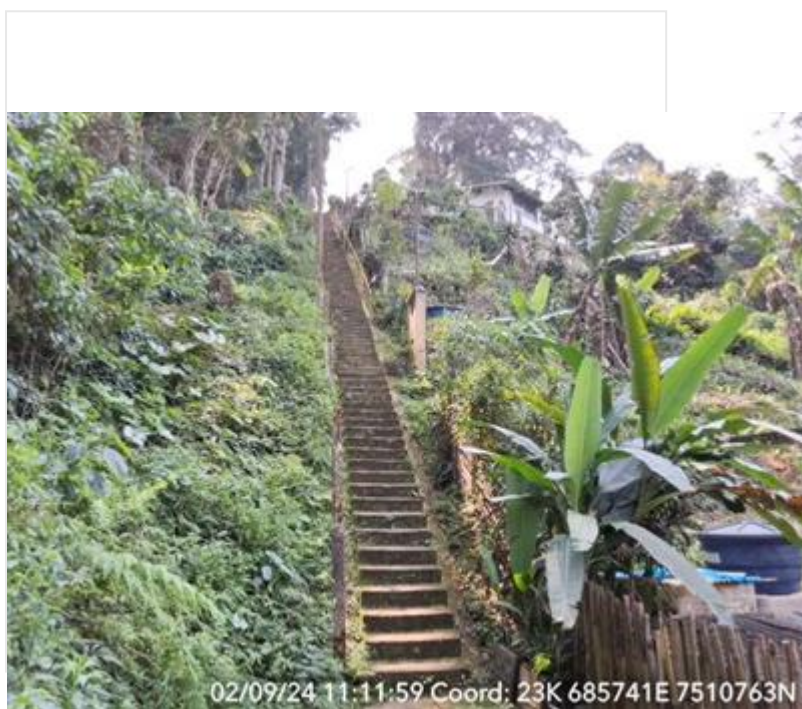

Descrição da foto1

Talude íngreme nas laterais da escadaria e entre moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Talude à jusante da última moradia.
