



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 16, 2024, 1:20:17 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_QUARTEIRAOINGELHEIM_351_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)
- estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)
- muros

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- solo grampeado com face "verde"

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- tela chumbada
- vigotas chumbadas
- contrafortes

Muro:

- muro de concreto armado estaqueado

Ações complementares:

- concreto projetado
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:


- vigotas chumbadas
- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Relato pelo morador da interdição das residencias 173 e 177 há 13 anos. Recomenda-se retirada de árvores de alto porte da crista do deslizamento. Muro de concreto e solo grampeado atras da residencia.

Fotos da ocorrência

Foto1

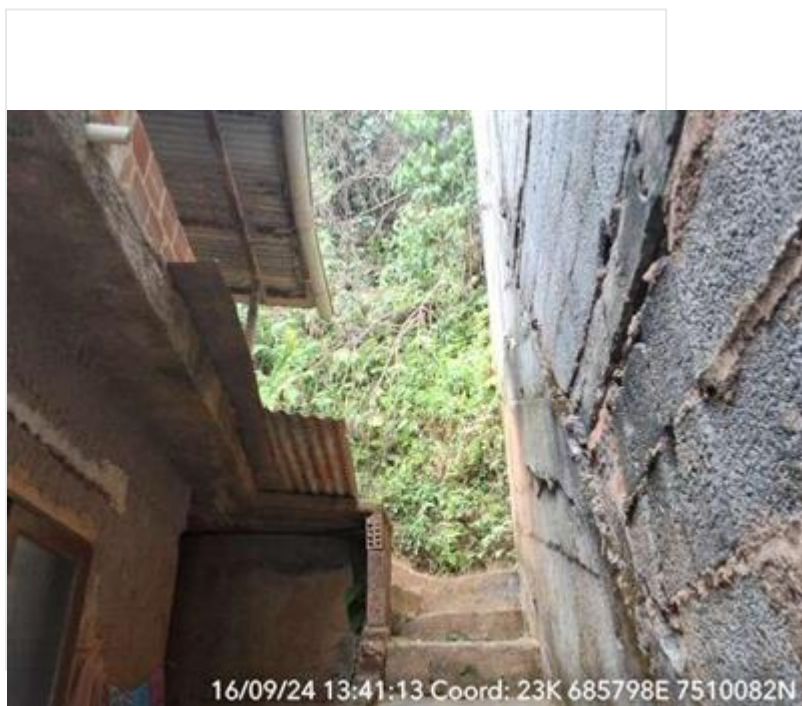

Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento de 2022.

Foto2



Descrição da foto2

Maciço rochoso fraturado

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz

Foto4

