



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 10:33:18 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_QUITANDINHA_190_DSS_AS_BC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**


Observação:

Muro de concreto armado estaqueado: na cota inferior do polígono, no trecho com asfalto e na cota superior, abaixo da casa. Necessidade de remoção da árvore na cota inferior devido à inclinação.

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1

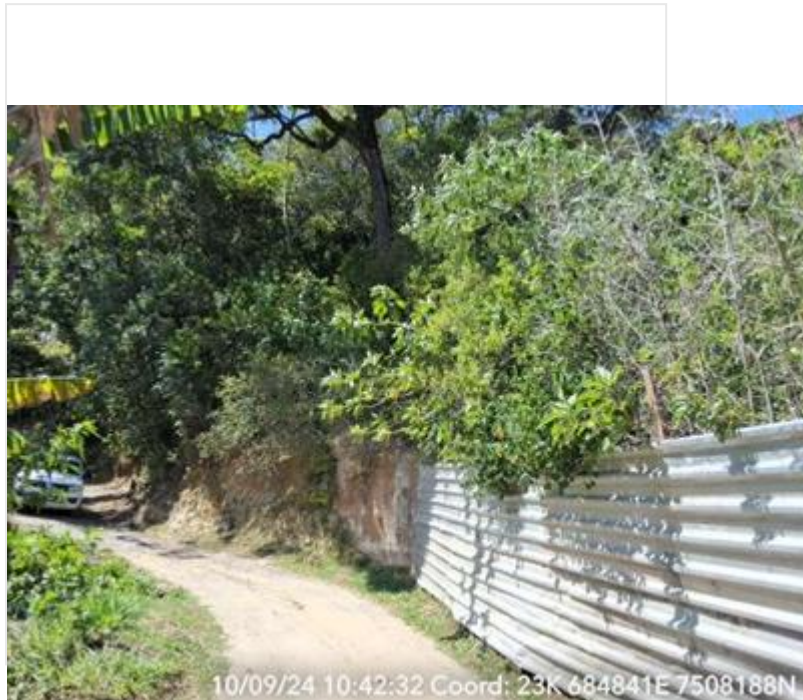

Descrição da foto1

Cota inferior da rua A.
