



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:48:37 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D2_ARARAS_1245_DSS_AS_EA__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- dreno profundo

Observação:

Foram observados obra de contenção realizada por moradores, com ausencia de drenos no concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1

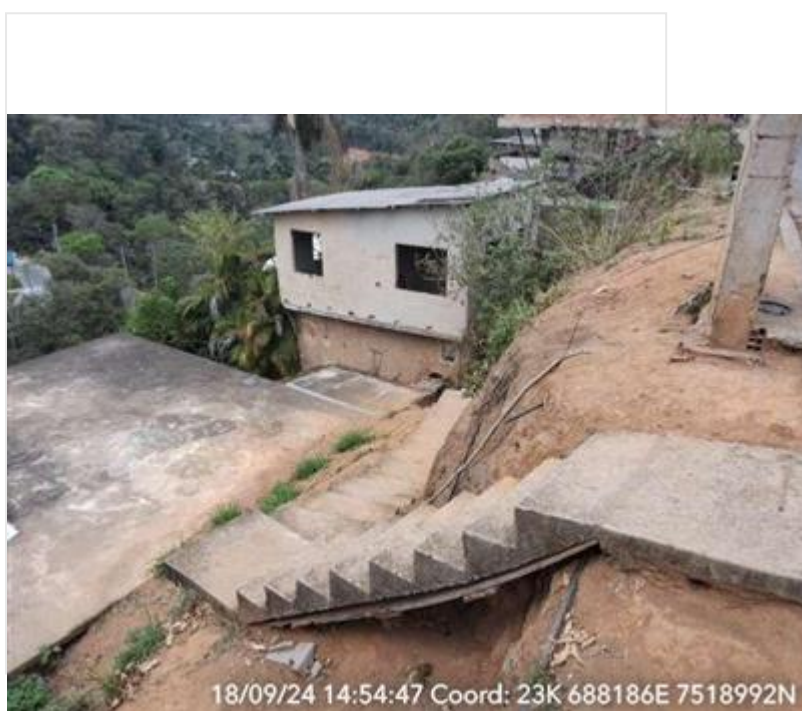

Descrição da foto1

Mobilização de material.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.

Foto3



Descrição da foto3

Realização de obra de contenção.
