



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 10:09:22 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_HUMBERTOROVIGATTI_786_DSS_AS_LT__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução de DHP
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

À jusante da via: cortina atirantada. À montante da via: reconstruir muro rompido e aplicar biomanta. Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

A via já apresenta sinais de que está cedendo.


Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz à jusante da via.

Foto3

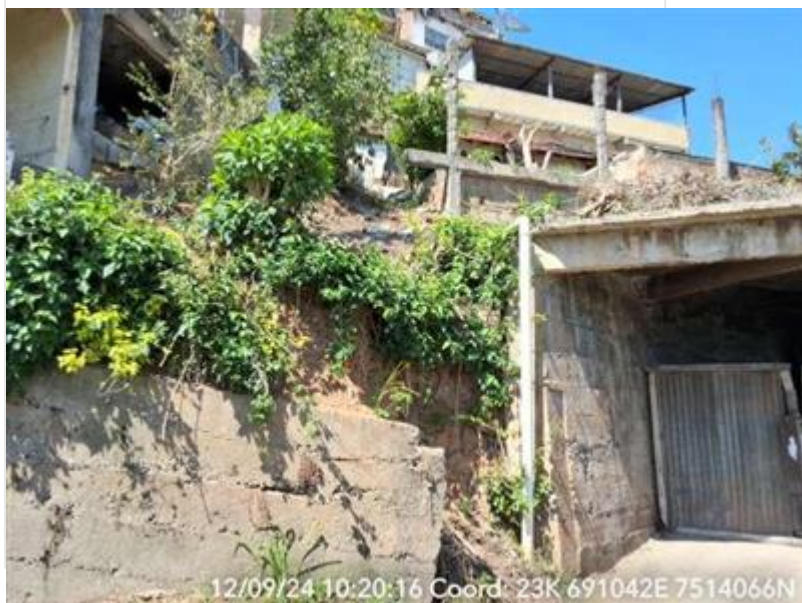

Descrição da foto3

Talude e muro rompidos à montante da via.
