

Itens de relevância técnica



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
Município	Cardoso Moreira
Endereço	Cardoso Moreira
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
ÁREA	550,610 m ²

Item	Descrição	Quantidade	Unid	%	Quantidade mínima
1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA	647,00	M ²	50,00%	323,50
2	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)	159,60	M ²	50,00%	79,80
3	ASSENTAMENTO DE ESPELHO, CHAPIM OU SIMILARES EM GRANITO	601,99	M	50,00%	301,00

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:1388349
5743

Assinado de forma digital por
JEFFERSON GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09 15:11:12 -03'00'



Documento assinado digitalmente
RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:42:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cotação IV	Forro De Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m	UN				130,81

		CÁLCULO PREÇO MERCADO	VALOR. UN	FRETE	TOTAL	MÉDIA SIMPLES
02/02/2026	LEROY MERLIN CNPJ:01.438.78 4/0048-60	https://www.leroymerlin.com.br/forro-de-pvc-plus-8mm-x-20cm-x-3,00m-bariri-caixa-com-6m2-imbuaia_1572273010?region=outros&gad_source=1&gad_campaignid=21862082284&gbraid=0AAAAADkzLZ5n3sSS02PvS0mkrV-Zy9G9T&gclid=Cj0KCQjwI5jHBhDHARisAB0YqjxJ1bUbu8pBaZPRnRbsITAMnpaHLyI4R64LizL2KRPTvX0wPx2q_YaAif4EALw_wcB	R\$ 31,98	99,99	R\$ 131,97	R\$ 165,88
02/02/2026	MADEIRA- MADEIRA - CNPJ: 10.490.181/0001- 35	https://www.madeiramadeira.com.br/forro-de-pvc-plus-8mm-x-20cm-x-3-00m-bariri-871548.html	R\$ 35,98	99,99	R\$ 135,97	R\$ 179,88
02/02/2026	CARREFOUR - CNPJ: 45.543.915/0846- 95	https://www.carrefour.com.br/forro-de-pvc-8mmx20cmx3m6m2-p-cx-caixa-com-6m2-mp955577348/p	R\$ 24,50	99,99	R\$ 124,49	R\$ 169,88
					TOTAL	R\$ 130,81

***Considerando que a caixa possui 6 m², os valores totais foram divididos por 6 para a obtenção do valor unitário por metro quadrado (1 m²).

*** Foi considerada o mesmo valor de frete entre os fornecedores Leroy Merlin e Madeira Madeira para o fornecedor Casa Saldão.

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138834
95743

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09
15:10:51 -03'00'



Documento assinado digitalmente

RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:16:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cotação I	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DE ALUMÍNIO - SIA (15X15cm)	UN				47,88
CÁLCULO PREÇO MERCADO			VALOR. UN	FRETE	TOTAL	MÉDIA SIMPLES	
02/02/2026	Reis Lixeiras CNPJ: 27.717.546/000114	https://www.loja.reislixearas.com.br/placas-de-sinalizacao/placa-de-aluminio/placa-sinalizadora-aluminio-15-x-15-cm-deficiente-fisico?parceiro=5426&gad_source=4&gad_campaignid=23056472146&gbraid=0AAAAABcYGIUadLV-cjLqivXhCaoHYfXOY&gclid=CjwKCAjw6P3GBhVeiwAJPjmLmrrQn-S6u8L_vx-1nFZ7ACjcmrsip7PCEdov0YRxeXRAVAj5bvBJxoCd18QAvD_BwE	R\$	25,90	12,51	R\$ 38,41	
02/02/2026	Gimba CNPJ: 54.651.716/001150	https://www.gimba.com.br/sinalizacao-e-isolamento/placa-de-aluminio-acessibilidade-azul-sinalize/?PID=34101&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&srsltid=AfmBOopjXyUpJ0mTbLntEsxPfQfqn80OGVm86e0Upsc9DIUcosnSyQ2BNI	R\$	21,99	35,71	R\$ 57,70	
02/02/2026	Certiva CNPJ: 49.600.715/000174	https://www.certiva.com.br/placa-sinalizadora-deficiente-fisico-em-aluminio-15x15-cm-01272?variation_id=3435562&ncm=&zipcode=	R\$	24,10	23,44	R\$ 47,54	
						TOTAL	R\$ 47,88

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138834
95743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09 15:10:19 -03'00'



Documento assinado digitalmente

RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:16:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Cotação II	PEDRA DE MADEIRA BRUTA BRANCA	M²				299,44
CÁLCULO PREÇO MERCADO			VALOR. UN	FRETE	TOTAL	MÉDIA SIMPLES	
02/02/2026	Global Pedras - CNPJ: 38.012.056/0001-38	https://www.globalpedras.com.br/pedra-madeira-bruta-branca-bj6zs75uu?gad_source=4&gad_campaignid=21913130840&gbraid=0AAAAACOkjPuDW1E5dc-dVSb2T0jLnAuU&gclid=CjwKCAjw6P3GBhBVEiWAPjmlmw96ITzFD6Y9uTSdYB_YCHgbDk7RMEvqsVp_SxVu7Wd0b_gg5SnBoCpTsQAvD_BwE	R\$ 84,96	R\$ 214,12	R\$ 299,08		
02/02/2026	Pedra Brasil - CNPJ: 38.612.656/0001-38	https://www.pedrasbrasil.com.br/p-pedra-madeira-bruta-branca-7waw4yetj	R\$ 88,96	R\$ 214,14	R\$ 303,10		
02/02/2026	Pedra Santos - CNPJ: 41.769.941/0001-71	https://www.pedrasantos.com.br/5yldrji79-pedra-madeira-bruta-branca-m2-2024-10-24-12-45-42	R\$ 82,00	R\$ 214,13	R\$ 296,13		
TOTAL						R\$ 299,44	

** Foi considerada a média de frete entre os fornecedores Global Pedras e Pedra Brasil para o fornecedor Pedra Santos.

**JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:1388
3495743**

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09
15:09:46 -03'00'



Documento assinado digitalmente
RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:16:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
Endereço	Cardoso Moreira
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
Extensão das vias	550,61 m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					UN	VALOR	
05.054.0001-5	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15 cm					UN	58,79	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	Cotação I	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DE ALUMÍNIO - SIA (15X15cm)	UN	1,000000		47,8800	47,88	
01967	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,200000		31,7200	6,34	
01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,200000		21,3000	4,26	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,030000		10,6000	0,32	
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	C4641 SEINFRA: SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15cm							
05.054.0001-F	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15 cm					UN	57,7	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	Cotação I	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DE ALUMÍNIO - SIA (15X15cm)	UN	1,000000		47,8800	47,88	
20045	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	0,200000		28,5500	5,71	
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,200000		19,1600	3,83	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,030000		9,5400	0,29	
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	C4641 SEINFRA: SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15cm							
13.035.0025-5	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GE RAL COM AGUA ACIDULADA					M2	951,04	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	Cotação II	PEDRA DE MADEIRA BRUTA BRANCA	M²	1,0000		299,4400	299,44	
1605	EMOP	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,0150		471,9463	7,08	
3429	EMOP	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL	M3	0,0200		560,1954	11,20	
1968	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12,0000		29,4700	353,64	
1999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	12,0000		21,3000	255,60	
8	EMOP	ACIDO MURIATICO	L	1,0000		5,8100	5,81	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		609,2400	18,28	
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 13.035.0025-0: REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E							
13.035.0025-F	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GE RAL COM AGUA ACIDULADA					M2	887,55	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
	Cotação II	PEDRA DE MADEIRA BRUTA BRANCA	M²	1,0000		299,4400	299,44	
30163	EMOP	ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO	M3	0,0150		465,1220	6,98	
30153	EMOP	ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL	M3	0,0200		535,9492	10,72	
20115	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,0000		26,5200	318,24	
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	12,0000		19,1600	229,92	
8	EMOP	ACIDO MURIATICO	L	1,0000		5,8100	5,81	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		548,1600	16,44	
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 13.035.0025-0: REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G RANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO, CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E							
18.027.0575-5	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.					UN	159,23	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO	
07060/ORSE	ORSE	Lampada fluorescente eletrônica PL 26W / 127V (compacta integrada)	UN.	1		7,4000	7,40	
11183/ORSE	ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	UN.	1		71,1400	71,14	
11189/ORSE	ORSE	Globo leitoso (10 x 20cm) em polietileno para luminária da Eterna ref. 951 ou similar	UN.	1		28,4000	28,40	
1999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,0000		21,3000	21,30	
1983	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,0000		29,4700	29,47	
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		50,7700	1,52	
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	10409/ORSE: Arandela de alumínio para globo 10x20cm. Ref.: 951, da Eterna ou similar							

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
Endereço	Cardoso Moreira
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
Extensão das vias	550,61 m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UN	VALOR	
18.027.0575-F	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.				UN	153,99	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
07060/ORSE	ORSE	Lampada fluorescente eletrônica PL 26W / 127V (compacta integrada)	UN.	1		7,4000	7,40
11183/ORSE	ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	UN.	1		71,1400	71,14
11189/ORSE	ORSE	Globo leitoso (10 x 20cm) em polietileno para luminária da Eterna ref. 951 ou similar	UN.	1		28,4000	28,40
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000		19,1600	19,16
20060	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000		26,5200	26,52
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		45,6800	1,37
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	10409/ORSE: Arandela de alumínio para globo 10x20cm. Ref.: 951, da Eterna ou similar						
14.005.0025-5	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA DE 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS. FORNECIMENTO e COLOCACAO				M2	613,14	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
11381	EMOP	PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, COM ESPESSURA DE 8MM	M2	1,0000		442,8942	442,89
14637	EMOP	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,9920		0,2700	0,81
11073	EMOP	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42	KG	0,9640		35,2900	34,02
5881	EMOP	BUCHA DE NYLON, TIPO S-06	UN	2,1960		0,0215	0,05
20259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12X15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,4160		13,3000	45,43
1967	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,6660		31,7200	52,85
1999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1,6190		21,3000	34,48
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		87,3300	2,62
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	102176/SINAPI: INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS						
14.005.0025-F	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA DE 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS. FORNECIMENTO e COLOCACAO				M2	604,13	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
11381	EMOP	PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, COM ESPESSURA DE 8MM	M2	1,0000		442,8942	442,89
14637	EMOP	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X150MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,9920		0,2700	0,81
11073	EMOP	PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42	KG	0,9640		35,2900	34,02
5881	EMOP	BUCHA DE NYLON, TIPO S-06	UN	2,1960		0,0215	0,05
20259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12X15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,4160		13,3000	45,43
20045	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS	H	1,6660		28,5500	47,56
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,6190		19,1600	31,02
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		78,5800	2,36
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	102176/SINAPI: INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS						
16.001.0119-5	FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 2X10CM, COM COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAQ DE VERNIZ IMUNIZANTE e IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA e DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO				M2	81,18	
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	%	R\$	PREÇO
453	EMOP	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	KG	0,1000		14,3200	1,43
379	EMOP	MACARANDUBA EM RIPAS, DE (2X10)CM	M	2,0000		19,6800	39,36
324	EMOP	LIXA P/MADEIRA Nº100	UN	0,5000		0,7000	0,35
597	EMOP	VERNIZ COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR	GL	0,0041		93,8600	0,38
3878	EMOP	VERNIZ ISOLANTE INCOLOR	GL	0,0028		120,2100	0,34
1967	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,7200		31,7200	22,84
1999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,7200		21,3000	15,34
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	%	0,0300		38,1800	1,15

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
Endereço	Cardoso Moreira
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
Extensão das vias	550,61 m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 17.020.0060-0: ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAQ DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO TO e 04749/ORSE: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 5X1,5CM		
16.001.0119-F	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 2X10CM, COM COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAQ DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	77,25
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN. QTD. % R\$ PREÇO
453	EMOP	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	KG 0,1000 14,3200 1,43
379	EMOP	MACARANDUBA EM RIPAS, DE (2X10)CM	M 2,0000 19,6800 39,36
324	EMOP	LIXA P/MADEIRA Nº100	UN 0,5000 0,7000 0,35
597	EMOP	VERNIZ COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR	GL 0,0041 93,8600 0,38
3878	EMOP	VERNIZ ISOLANTE INCOLOR	GL 0,0028 120,2100 0,34
20045	EMOP	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H 0,7200 28,5500 20,56
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H 0,7200 19,1600 13,80
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	% 0,0300 34,3600 1,03
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 17.020.0060-0: ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAQ DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO TO e 04749/ORSE: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 5X1,5CM		
09.026.0025-5	LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICA 94L OM SUPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1055,93
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN. QTD. % R\$ PREÇO
	COTAÇÃO III	LIXEIRA MADEIRA ECOLÓGICA 94L COM SUPORTE	UN 1 1.052,2100 1.052,21
1999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H 0,1700 21,3000 3,62
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	% 0,0300 3,6200 0,11
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 09.026.0025-0: PAPELEIRA PLÁSTICA P/VIAS E PRACAS PÚBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
09.026.0025-F	LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICA 94L OM SUPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1055,56
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN. QTD. % R\$ PREÇO
	COTAÇÃO III	LIXEIRA MADEIRA ECOLÓGICA 94L COM SUPORTE	UN 1 1.052,2100 1.052,21
20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H 0,1700 19,1600 3,26
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	% 0,0300 3,2600 0,10
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	EMOP 09.026.0025-A: PAPELEIRA PLÁSTICA P/VIAS E PRACAS PÚBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
13.175.0010-5	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	173,53
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN. QTD. % R\$ PREÇO
	COTAÇÃO IV	Forro De Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m	UN 1 130,8100 130,81
3302	EMOP	ARAME GALV. Nº 10	KG 0,0370 15,4840 0,57
952	EMOP	PARAFUSO DE LATAO NIQUELADO, COM ANILHACROMADA DE 6MM E COM ESPESURA DE 1.1/4"X4,8 OU 5,5MM	UN 0,0336 0,7711 0,03
40547	SINAPI	PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.	CENTO 0,0123 34,0900 0,42
14894	EMOP	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), COMPRIMENTO 13MM	UN 2,2134 0,0502 0,11
39430	EMOP	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN 1,2267 1,6800 2,06
14650	EMOP	PERFIL MONTANTE, FORMATO "C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)	M 3,5470 5,6200 19,93
1975	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H 0,6000 31,7200 19,03
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	% 0,0300 19,0300 0,57
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	SINAPI 96486: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		
13.175.0010-F	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	171,57
ELEMENTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UN. QTD. % R\$ PREÇO
	COTAÇÃO IV	Forro De Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m	UN 1 130,8100 130,81
3302	EMOP	ARAME GALV. Nº 10	KG 0,0370 15,4840 0,57
952	EMOP	PARAFUSO DE LATAO NIQUELADO, COM ANILHACROMADA DE 6MM E COM ESPESURA DE 1.1/4"X4,8 OU 5,5MM	UN 0,0336 0,7711 0,03
40547	EMOP	PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.	CENTO 0,0123 34,0900 0,42
14894	EMOP	PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), COMPRIMENTO 13MM	UN 2,2134 0,0502 0,11
39430	EMOP	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN 1,2267 1,6800 2,06
14650	EMOP	PERFIL MONTANTE, FORMATO "C", EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)	M 3,5470 5,6200 19,93
20102	EMOP	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H 0,6000 28,5500 17,13
		DESGASTE DE FERRAMENTA E EPI	% 0,0300 17,1300 0,51
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:	SINAPI 96486: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS		

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743

Assinado de forma digital por
JEFFERSON GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09 15:08:52-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:16:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	18,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	10,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória				
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI	
1		SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			R\$	65.458,13		R\$	77.240,56
1.1	01.001.0076-0	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8"	M	4,00	R\$ 20,84	R\$ 83,36	18,00%	R\$	98,36
1.2	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	550,61	R\$ 21,93	R\$ 12.074,87	18,00%	R\$	14.248,34
1.3	01.050.0353-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI CO EXISTENTE, PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO NOS S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT ARES	M2	156,00	R\$ 119,62	R\$ 18.660,72	18,00%	R\$	22.019,64
1.4	01.050.0525-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	156,00	R\$ 0,86	R\$ 134,16	18,00%	R\$	158,30
1.5	01.050.0546-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M 2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PA DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES	M2	156,00	R\$ 82,77	R\$ 12.912,12	18,00%	R\$	15.236,30
1.6	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO,INFORMACOES CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARI A E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMEN DACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA S ER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	10,00	R\$ 2.159,29	R\$ 21.592,90	18,00%	R\$	25.479,62
2		CANTEIRO DE OBRAS			R\$	90.105,69		R\$	106.324,68
2.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,48	R\$ 556,55	R\$ 3.606,44	18,00%	R\$	4.255,59
2.2	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	32,00	R\$ 1.350,00	R\$ 43.200,00	18,00%	R\$	50.976,00
2.3	02.004.0001-0	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	58,00	R\$ 568,52	R\$ 32.974,16	18,00%	R\$	38.909,50
2.4	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA,FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	87,00	R\$ 111,24	R\$ 9.677,88	18,00%	R\$	11.419,89
2.5	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	743,92	R\$ 0,87	R\$ 647,21	18,00%	R\$	763,70
3		MOVIMENTO DE TERRA			R\$	14.544,30		R\$	17.162,27
3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	194,99	R\$ 74,59	R\$ 14.544,30	18,00%	R\$	17.162,27
4		TRANSPORTE			R\$	56.361,46		R\$	66.506,49
4.1	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA Q 2.006	UN	8,00	R\$ 96,79	R\$ 774,32	18,00%	R\$	913,69
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	431,20	R\$ 35,76	R\$ 15.419,71	18,00%	R\$	18.195,25
4.3	04.012.0076-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	469,18	R\$ 3,70	R\$ 1.735,96	18,00%	R\$	2.048,43
4.4	04.005.0143-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	21.863,79	R\$ 1,57	R\$ 34.326,15	18,00%	R\$	40.504,85
4.5	TC10.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	469,18	R\$ 8,75	R\$ 4.105,32	18,00%	R\$	4.844,27
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	62.784,74		R\$	74.085,98
5.1	05.055.0010-0	LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR A,ESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXACAO,FORNECIMENTO E COL OCACAO	UN	343,00	R\$ 121,30	R\$ 41.605,90	18,00%	R\$	49.094,96
5.2	05.054.0001-5	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15 cm	UN	30,00	R\$ 58,79	R\$ 1.763,70	18,00%	R\$	2.081,16
5.3	05.002.0002-0	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO DE PISOS OU PAVI MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	M3	55,08	R\$ 352,49	R\$ 19.415,14	18,00%	R\$	22.909,86

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	18,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	10,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória					
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI		
8		BASES E PAVIMENTOS			R\$	62.004,19		R\$	73.164,94	
8.1	08.020.0010-0	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SU BLEITO E BASE	M2	550,61	R\$ 112,61	R\$ 62.004,19	18,00%	R\$	73.164,94	
9		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				R\$	72.807,58		R\$	85.747,69
9.1	09.010.0001-0	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	634,26	R\$ 61,59	R\$ 39.064,07	18,00%	R\$	46.095,60	
9.2	09.001.0020-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	118,85	R\$ 17,38	R\$ 2.065,61	10,00%	R\$	2.272,17	
9.3	09.026.0025-5	LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICA 94L OM SUPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	30,00	R\$ 1.055,93	R\$ 31.677,90	18,00%	R\$	37.379,92	
10		FUNDAÇÕES				R\$	373,80		R\$	441,08
10.1	10.028.0010-0	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO	M	4,00	R\$ 93,45	R\$ 373,80	18,00%	R\$	441,08	
11		ESTRUTURAS				R\$	305.309,65		R\$	360.234,24
11.1	11.026.0030-0	MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL	M2	55,51	R\$ 324,32	R\$ 18.003,00	18,00%	R\$	21.243,54	
11.2	11.023.0032-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 4,2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	M2	36,73	R\$ 10,58	R\$ 388,60	10,00%	R\$	427,46	
11.3	11.011.0045-0	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	M2	54,36	R\$ 2,61	R\$ 141,88	18,00%	R\$	167,41	
11.4	11.003.0006-0	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	98,67	R\$ 715,04	R\$ 70.552,99	18,00%	R\$	83.252,52	
11.5	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,20	R\$ 685,44	R\$ 30.296,44	18,00%	R\$	35.749,79	
11.6	11.003.0002-0	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,02	R\$ 640,60	R\$ 4.497,01	18,00%	R\$	5.306,47	
11.7	11.009.0074-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,C ORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	175,10	R\$ 12,01	R\$ 2.102,95	18,00%	R\$	2.481,48	
11.8	11.009.0072-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	5.287,91	R\$ 13,08	R\$ 69.165,86	18,00%	R\$	81.615,71	
11.9	11.009.0070-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	707,07	R\$ 13,79	R\$ 9.750,49	18,00%	R\$	11.505,57	

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	18,00%
ÁREA	550,61 m ²	BDI DIF.	10,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
11.10	11.009.0060-1	FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS	KG	2.513,14	R\$ 13,43	R\$ 33.751,47	18,00%	R\$ 39.826,73
11.11	11.004.0022-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVIÇO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	421,94	R\$ 101,79	R\$ 42.949,27	18,00%	R\$ 50.680,13
11.12	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	307,20	R\$ 77,18	R\$ 23.709,69	18,00%	R\$ 27.977,43
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$ 22.346,74		R\$ 26.369,15
12.1	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	99,30	R\$ 71,49	R\$ 7.098,95	18,00%	R\$ 8.376,76
12.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	156,50	R\$ 97,43	R\$ 15.247,79	18,00%	R\$ 17.992,39
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				R\$ 966.662,74		R\$ 1.140.662,00
13.1	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	130,61	R\$ 59,43	R\$ 7.762,15	18,00%	R\$ 9.159,33
13.2	13.301.0080-1	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	61,20	R\$ 48,25	R\$ 2.952,90	18,00%	R\$ 3.484,42
13.3	13.168.0010-0	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT./PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP., PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500, NO SISTEMA COIL COATING, ESP.DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO), INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.	M2	159,60	R\$ 950,00	R\$ 151.620,00	18,00%	R\$ 178.911,60
13.4	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	957,58	R\$ 38,02	R\$ 36.407,19	18,00%	R\$ 42.960,48
13.5	13.175.0010-5	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	357,97	R\$ 173,53	R\$ 62.118,53	18,00%	R\$ 73.299,86
13.6	13.365.0087-0	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESURA DE 2CM, LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	M	601,99	R\$ 150,30	R\$ 90.479,09	18,00%	R\$ 106.765,32
13.7	13.035.0025-5	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA, IRREGULARES, COM 6CM DE ESPESURA, ACABAMENTO RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA	M2	647,00	R\$ 951,04	R\$ 615.322,88	18,00%	R\$ 726.080,99

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	18,00%
ÁREA	550,61 m ²	BDI DIF.	10,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória				
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI	
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			R\$	72.310,01		R\$	85.325,80
14.1	14.005.0025-5	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA DE 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	105,39	R\$ 613,14	R\$ 64.618,82	18,00%	R\$	76.250,20
14.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	M2	13,95	R\$ 551,34	R\$ 7.691,19	18,00%	R\$	9.075,60
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			R\$	42.967,67		R\$	50.701,81
15.1	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"X4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	R\$ 11,20	R\$ 336,00	18,00%	R\$	396,48
15.2	15.018.0125-0	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 3" X 3", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	156,00	R\$ 12,61	R\$ 1.967,16	18,00%	R\$	2.321,24
15.3	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	467,70	R\$ 3,19	R\$ 1.491,96	18,00%	R\$	1.760,51
15.4	15.036.0052-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	187,32	R\$ 37,25	R\$ 6.977,67	18,00%	R\$	8.233,65
15.5	15.001.0026-0	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	R\$ 405,68	R\$ 11.764,72	18,00%	R\$	13.882,36
15.6	15.001.0027-0	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	R\$ 650,95	R\$ 1.301,90	18,00%	R\$	1.536,24
15.7	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00	R\$ 13,61	R\$ 394,69	18,00%	R\$	465,73
15.8	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	88,00	R\$ 170,51	R\$ 15.004,88	18,00%	R\$	17.705,75
15.9	15.008.0200-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 1,5MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.032,88	R\$ 3,61	R\$ 3.728,69	18,00%	R\$	4.399,85
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			R\$	84.581,92		R\$	99.806,64
16.1	16.030.0001-0	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO), CONSUMO DE 1,2KG /M2, EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	8,61	R\$ 28,17	R\$ 242,54	18,00%	R\$	286,19
16.2	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO III-B, E SP. 4,0MM, APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO O BASE AGUA ISENTA SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/C AUMENTO DE 1%, EXCLUSIVE REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA, CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	357,97	R\$ 95,74	R\$ 34.272,04	18,00%	R\$	40.441,00
16.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	M2	357,97	R\$ 46,84	R\$ 16.767,31	18,00%	R\$	19.785,42
16.4	16.001.0119-5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 2X10CM, COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO	M2	410,20	R\$ 81,18	R\$ 33.300,03	18,00%	R\$	39.294,03

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	18,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	10,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória				
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI	
17 PINTURAS					R\$	9.325,11		R\$	11.003,62
17.1	17.020.0010-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	357,97	R\$ 18,45	R\$ 6.604,54	18,00%	R\$	7.793,35
17.2	17.020.0021-0	UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVIÇO DO ITEM 17.020.0010	M2	357,97	R\$ 7,60	R\$ 2.720,57	18,00%	R\$	3.210,27
18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS					R\$	14.531,90		R\$	17.147,64
18.1	18.027.0434-0	LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	125,00	R\$ 78,04	R\$ 9.755,00	18,00%	R\$	11.510,90
18.2	18.027.0575-5	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar. FORNECIMENTO e COLOCACAO.	UN	30,00	R\$ 159,23	R\$ 4.776,90	18,00%	R\$	5.636,74
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$	1.558,50		R\$	1.782,05
21.1	21.031.0015-0	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, TIPO FAIL OFF, TENSÃO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V, POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA, CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A, CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV, PINOS EM LATAO ESTANHADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM RIOLUZ-66 E ANSI C136.10, NO QUE COUBER. FORNECIMENTO	UN	30,00	R\$ 23,74	R\$ 712,20	10,00%	R\$	783,42
21.2	21.031.0030-0	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL, COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE ASSENTAMENTO	UN	30,00	R\$ 28,21	R\$ 846,30	18,00%	R\$	998,63
22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	294.238,30		R\$	347.201,19
22.1	01.090.0000-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 2.942,38	R\$ 294.238,30	18,00%	R\$	347.201,19
23 ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$	48.552,00		R\$	57.291,36
23.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 485,52	R\$ 48.552,00	18,00%	R\$	57.291,36
TOTAIS						TOTAL S/BDI		TOTAL C/BDI	
					R\$	2.286.824,43		R\$	2.698.199,19

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA: 138834
95743

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA: 13883495743
Dados: 2026.02.09
15:08:27 -03'00'

Documento assinado digitalmente



RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:14:29-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória				
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI	
1		SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			R\$	58.901,23		R\$	71.859,47
1.1	01.001.0076-A	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8"	M	4,00	R\$ 18,74	R\$ 74,96	22,00%	R\$	91,45
1.2	01.005.0004-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEDOR ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	550,61	R\$ 19,73	R\$ 10.863,53	22,00%	R\$	13.253,50
1.3	01.050.0353-A	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA PREDIÇOS CULTURAIS ATÉ 500M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	156,00	R\$ 107,64	R\$ 16.791,84	22,00%	R\$	20.486,04
1.4	01.050.0525-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, PARA URBANIZAÇÃO ACIMA DE 1500M2, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	M2	156,00	R\$ 0,77	R\$ 120,12	22,00%	R\$	146,54
1.5	01.050.0546-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIÇOS CULTURAIS ATÉ 500M2, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES	M2	156,00	R\$ 74,48	R\$ 11.618,88	22,00%	R\$	14.175,03
1.6	01.050.0300-A	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, INFORMAÇÕES CONTRATUAIS, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O ITEM DEVERÁ SER MEDIDO PELO NÚMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATÓRIO	UN	10,00	R\$ 1.943,19	R\$ 19.431,90	22,00%	R\$	23.706,91
2		CANTEIRO DE OBRAS			R\$	86.666,85		R\$	105.733,54
2.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	6,48	R\$ 530,50	R\$ 3.437,64	22,00%	R\$	4.193,92
2.2	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIÊNICO E VEÍCULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUÇÃO PARA LIMPEZA	UNXMES	32,00	R\$ 1.350,00	R\$ 43.200,00	22,00%	R\$	52.704,00
2.3	02.004.0001-A	BARRACÃO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	58,00	R\$ 523,21	R\$ 30.346,18	22,00%	R\$	37.022,33
2.4	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	87,00	R\$ 103,86	R\$ 9.035,82	22,00%	R\$	11.023,70
2.5	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA	M2	743,92	R\$ 0,87	R\$ 647,21	22,00%	R\$	789,59
3		MOVIMENTO DE TERRA			R\$	13.081,87		R\$	15.959,88
3.1	03.001.0001-B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	194,99	R\$ 67,09	R\$ 13.081,87	22,00%	R\$	15.959,88

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória				
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI	
4		TRANSPORTE			R\$	55.707,49		R\$	67.963,13
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	8,00	R\$ 91,66	R\$ 733,28	22,00%	R\$	894,60
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	431,20	R\$ 34,90	R\$ 15.048,88	22,00%	R\$	18.359,63
4.3	04.012.0076-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDEDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	469,18	R\$ 3,65	R\$ 1.712,50	22,00%	R\$	2.089,25
4.4	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S VERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	21.863,79	R\$ 1,56	R\$ 34.107,51	22,00%	R\$	41.611,16
4.5	TC09.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente. (Desonerado)	t	469,18	R\$ 8,75	R\$ 4.105,32	22,00%	R\$	5.008,49
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	60.979,12		R\$	74.394,52
5.1	05.055.0010-A	LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR A,ESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXAÇÃO.FORNECIMENTO E COL OCAÇÃO	UN	343,00	R\$ 119,46	R\$ 40.974,78	22,00%	R\$	49.989,23
5.2	05.054.0001-F	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15 cm	UN	30,00	R\$ 57,70	R\$ 1.731,00	22,00%	R\$	2.111,82
5.3	05.002.0002-A	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAV IMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICIO	M3	55,08	R\$ 331,76	R\$ 18.273,34	22,00%	R\$	22.293,47
8		BASES E PAVIMENTOS			R\$	60.330,33		R\$	73.603,00
8.1	08.020.0010-A	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICA DAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SU BLEITO E BASE	M2	550,61	R\$ 109,57	R\$ 60.330,33	22,00%	R\$	73.603,00
9		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			R\$	70.419,23		R\$	85.752,19
9.1	09.010.0001-A	CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE (10X25)CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	634,26	R\$ 57,96	R\$ 36.761,70	22,00%	R\$	44.849,27
9.2	09.001.0020-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	118,85	R\$ 16,75	R\$ 1.990,73	14,00%	R\$	2.269,43
9.3	09.026.0025-F	LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICA 94L OM SUPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	30,00	R\$ 1.055,56	R\$ 31.666,80	22,00%	R\$	38.633,49
10		FUNDAÇÕES			R\$	354,12		R\$	432,02
10.1	10.028.0010-A	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DI AMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL USIVE PERFURACAO	M	4,00	R\$ 88,53	R\$ 354,12	22,00%	R\$	432,02
11		ESTRUTURAS			R\$	292.988,53		R\$	357.414,87
11.1	11.026.0030-A	MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE TO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO B ASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL	M2	55,51	R\$ 316,57	R\$ 17.572,80	22,00%	R\$	21.438,81
11.2	11.023.0032-A	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE A CO CA-60,COM DIAMETRO DE 4,2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	M2	36,73	R\$ 10,58	R\$ 388,60	14,00%	R\$	443,00
11.3	11.011.0045-A	CORTE,MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	M2	54,36	R\$ 2,35	R\$ 127,74	22,00%	R\$	155,84
11.4	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSÃO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	98,67	R\$ 690,22	R\$ 68.104,00	22,00%	R\$	83.086,88

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
11.5	11.003.0005-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,20	R\$ 660,62	R\$ 29.199,40	22,00%	R\$ 35.623,26
11.6	11.003.0002-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,02	R\$ 615,79	R\$ 4.322,84	22,00%	R\$ 5.273,86
11.7	11.009.0074-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,C	KG	175,10	R\$ 11,54	R\$ 2.020,65	22,00%	R\$ 2.465,19
11.8	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPR	KG	5.287,91	R\$ 12,53	R\$ 66.257,51	22,00%	R\$ 80.834,16
11.9	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	707,07	R\$ 13,16	R\$ 9.305,04	22,00%	R\$ 11.352,14
11.10	11.009.0060-B	FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONC RETO ARMADO,COMPREENDEDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 .FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	2.513,14	R\$ 12,85	R\$ 32.293,84	22,00%	R\$ 39.398,48
11.11	11.004.0022-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCO RAMENTO	M2	421,94	R\$ 95,95	R\$ 40.485,14	22,00%	R\$ 49.391,87
11.12	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	307,20	R\$ 74,58	R\$ 22.910,97	22,00%	R\$ 27.951,38
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$ 21.354,36		R\$ 26.052,31
12.1	12.005.0010-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	99,30	R\$ 67,69	R\$ 6.721,61	22,00%	R\$ 8.200,36
12.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	156,50	R\$ 93,50	R\$ 14.632,75	22,00%	R\$ 17.851,95
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS				R\$ 919.862,92		R\$ 1.122.232,74
13.1	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO , SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	130,61	R\$ 54,08	R\$ 7.063,38	22,00%	R\$ 8.617,32
13.2	13.301.0080-B	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	61,20	R\$ 44,02	R\$ 2.694,02	22,00%	R\$ 3.286,70
13.3	13.168.0010-A	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBE STRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.	M2	159,60	R\$ 950,00	R\$ 151.620,00	22,00%	R\$ 184.976,40

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m ²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
13.4	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	957,58	R\$ 35,28	R\$ 33.783,42	22,00%	R\$ 41.215,77

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
13.5	13.175.0010-F	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	357,97	R\$ 171,57	R\$ 61.416,91	22,00%	R\$ 74.928,63
13.6	13.365.0087-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	M	601,99	R\$ 147,91	R\$ 89.040,34	22,00%	R\$ 108.629,21
13.7	13.035.0025-F	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA, IRREGULARES, COM 6CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMAS SA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GE RAL COM AGUA ACIDULADA	M2	647,00	R\$ 887,55	R\$ 574.244,85	22,00%	R\$ 700.578,71
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS				R\$ 71.279,26		R\$ 86.960,69
14.1	14.005.0025-F	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA DE 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	105,39	R\$ 604,13	R\$ 63.669,26	22,00%	R\$ 77.676,49
14.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	13,95	R\$ 545,52	R\$ 7.610,00	22,00%	R\$ 9.284,20
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS				R\$ 41.052,70		R\$ 50.084,26
15.1	15.018.0120-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2" X 4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	30,00	R\$ 10,57	R\$ 317,10	22,00%	R\$ 386,86
15.2	15.018.0125-A	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 3" X 3", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	156,00	R\$ 11,98	R\$ 1.868,88	22,00%	R\$ 2.280,03
15.3	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	467,70	R\$ 3,03	R\$ 1.417,13	22,00%	R\$ 1.728,89
15.4	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	187,32	R\$ 35,42	R\$ 6.634,87	22,00%	R\$ 8.094,54
15.5	15.001.0026-A	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSÕES DE 0,40X0,40X0,40M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	R\$ 378,41	R\$ 10.973,89	22,00%	R\$ 13.388,14
15.6	15.001.0027-A	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSÕES DE 0,60X0,60X0,60M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	R\$ 610,12	R\$ 1.220,24	22,00%	R\$ 1.488,69
15.7	15.007.0570-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	29,00	R\$ 12,96	R\$ 375,84	22,00%	R\$ 458,52
15.8	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	88,00	R\$ 167,42	R\$ 14.732,96	22,00%	R\$ 17.974,21

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
15.9	15.008.0200-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.032,88	R\$ 3,40	R\$ 3.511,79	22,00%	R\$ 4.284,38
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 80.617,99		R\$ 98.066,76
16.1	16.030.0001-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	8,61	R\$ 27,34	R\$ 235,39	22,00%	
16.2	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL IMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-B,E SP.4,0MM,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTIC O BASE AGUA ISENTO SOLVENTES,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/C AUMENTO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA,CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	357,97	R\$ 91,55	R\$ 32.772,15	22,00%	R\$ 39.982,02
16.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	357,97	R\$ 44,48	R\$ 15.922,50	22,00%	R\$ 19.425,45
16.4	16.001.0119-F	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 2X10CM, COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	410,20	R\$ 77,25	R\$ 31.687,95	22,00%	R\$ 38.659,29
17	PINTURAS					R\$ 8.659,29		R\$ 10.564,32
17.1	17.020.0010-A	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PA RA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO	M2	357,97	R\$ 17,21	R\$ 6.160,66	22,00%	R\$ 7.516,00
17.2	17.020.0021-A	UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT EM 17.020.0010	M2	357,97	R\$ 6,98	R\$ 2.498,63	22,00%	R\$ 3.048,32

Planilha Orçamentária

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			R\$	13.719,70		R\$ 16.738,03
18.1	18.027.0434-A	LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA,FORNECIMENTO E COLOCAÇAO	UN	125,00	R\$ 72,80	R\$ 9.100,00	22,00%	R\$ 11.102,00
18.2	18.027.0575-F	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	UN	30,00	R\$ 153,99	R\$ 4.619,70	22,00%	R\$ 5.636,03
21		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			R\$	1.473,60		R\$ 1.740,80
21.1	21.031.0015-A	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, TIPO FAIL-OFF, TENSÃO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V, POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA, CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A. CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV; PINOS EM LATAO ESTANHADO, DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM RIOLUZ-66 F ANSI	UN	30,00	R\$ 23,74	R\$ 712,20	14,00%	R\$ 811,90
21.2	21.031.0030-A	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL, COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE. ASSENTAMENTO	UN	30,00	R\$ 25,38	R\$ 761,40	22,00%	R\$ 928,90
22		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	294.238,30		R\$ 358.970,72
22.1	01.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 2.942,38	R\$ 294.238,30	22,00%	R\$ 358.970,72
							22,00%	
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES			R\$	48.552,00		R\$ 59.233,44
23.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 485,52	R\$ 48.552,00	22,00%	R\$ 59.233,44
TOTAIS					TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI		
					R\$ 2.200.238,89	R\$ 2.683.756,69		

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA: 13883495
743

Assinado de forma digital
por JEFFERSON GUILHERME
TEIXEIRA: 13883495743
Dados: 2026.02.09 15:08:02
-03'00'



Documento assinado digitalmente
RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:14:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Município	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Endereço	Cardoso Moreira	BDI S/ DES.	18,00%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m ²	Prazo	240 dias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
------	--------	-----------	-------	--------

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22.1.1.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	MES	4,00
----------	---------------	--	-----	------

Quantidade 1,00 un x Prazo 4,00 meses = 4,00 mês

22.1.1.2	19.004.0046-C	CAMIONETA TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, DUAS POR TAS, COM MOTORIZACAO DE 1,2 A 1,6 LITROS BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.408,00
----------	---------------	--	---	----------

HORA/MÊS 176,00 HS x Prazo 8,00 meses = 1.408,00 mês

22.1.1.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00
----------	---------------	--	-----	------

Quantidade 1,00 un x Prazo 8,00 meses = 8,00 mês

*** Por se tratar de uma obra de pequeno porte, com necessidade de profissionais permanentes para acompanhamento e gestão, os custos fixos têm maior impacto proporcional. Assim, justifica-se o percentual mais elevado de administração local.

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA: 13883
495743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA: 13883495743
Dados: 2026.02.09 15:06:44 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:14:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Município	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Endereço	Cardoso Moreira	BDI S/ DES.	22,00%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	14,00%
ÁREA	550,61 m²	Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 48.552,00		R\$ 59.233,44
23.1		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 48.552,00		R\$ 59.233,44
23.1.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 485,52	R\$ 48.552,00	22,00%	R\$ 59.233,44

Instruções do dimensionamento da mão de obra adotado:

Através da Instrução normativa **IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007** e nova redação dada pela **IN RFB nº 2021 de 16/04/2021**, separar os serviços licitados em famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

- a) **4%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
b) **6%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
c) **18%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
d) **20%** sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
e) **14%** sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente à mão de obra direta.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código 01968, determinamos a quantidade de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Etapa	1	Categoria dos Serviços (Famílias)	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	R\$ 62.004,19
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	R\$ 70.905,76
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	R\$ 0,00
	D	Drenagem	R\$ 0,00
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	R\$ 1.655.560,36
		SUB-TOTAL	R\$ 1.788.470,31

Etapa	2	Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	4% R\$ 2.480,17
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	6% R\$ 4.254,35
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	18% R\$ 0,00
	D	Drenagem	20% R\$ 0,00
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	14% R\$ 231.778,45
		SUB-TOTAL	R\$ 238.512,96

% da Mão de Obra direta sobre o valor da obra **13,34%**

Etapa	3	Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra	Valores
		Valor dos serviços, exclusive serviços preliminares e BDI =	R\$ 1.788.470,31
	A	Mão de obra = Percentual Resultante no item 02.00	R\$ 238.512,96
	B	Custo horário do oficial, mês de referência (cód. Sem Des = 01968; cód. Com Des =20115)	R\$ 26,73
	C	Nº de horas/mês	176
	D	Prazo da obra - meses	8 meses
		Nº de homens diretos (A/B/C/D)	6

Nº de homens diretos	6
Nº de homens indiretos (Administração Local)	3
Mão de Obra Total	9

Adotado Total	70% do efetivo	6
Adotado Parcial	70% do efetivo	5

Composição do item Encargos complementares

Item	Código	Descrição	Unidade	Prazo	Quant. / Mês	Quant. Funcionarios	Preço Unitário	Total Parcial
8.1.1.1	05.100.0020-0	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	8,00	22,00	6,00	R\$ 10,00	R\$ 10.560,00
8.1.1.2	05.100.0022-0	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICÕES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	8,00	22,00	6,00	R\$ 17,00	R\$ 17.952,00
8.1.1.3	05.100.0024-0	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	8,00	1,00	5,00	R\$ 325,00	R\$ 13.000,00
8.1.1.4	05.100.0026-0	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,00	22,00	5,00	R\$ 8,00	R\$ 7.040,00

**JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138
83495743**

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09
15:06:09 -03'00'



Documento assinado digitalmente

RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:14:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Fase Licitatória			
					Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
23		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 48.552,00		R\$ 59.233,44
23.1		ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 48.552,00		R\$ 59.233,44
23.1.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UR	100,00	R\$ 485,52	R\$ 48.552,00	22,00%	R\$ 59.233,44

Instruções do dimensionamento da mão de obra adotado:

Através da Instrução normativa **IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007** e nova redação dada pela **IN RFB nº 2021 de 16/04/2021**, separar os serviços licitados em famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

- 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
- 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
- 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
- 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;
- 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente à mão de obra direta.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código 01968, determinamos a quantidade de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão de obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Etapa	1	Categoria dos Serviços (Famílias)	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	R\$ 60.330,33
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	R\$ 68.789,36
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	R\$ 0,00
	D	Drenagem	R\$ 0,00
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	R\$ 1.582.760,82
		SUB-TOTAL	R\$ 1.711.880,51
Etapa	2	Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta	Valores
	A	Pavimentação Asfáltica	4% R\$ 2.413,21
	B	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	6% R\$ 4.127,36
	C	Obras de Arte (Pontes ou Viadutos)	18% R\$ 0,00
	D	Drenagem	20% R\$ 0,00
	E	Demais serviços, com a utilização de equipamentos	14% R\$ 221.586,51
		SUB-TOTAL	R\$ 228.127,09
% da Mão de Obra direta sobre o valor da obra			13,33%
Etapa	3	Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra	Valores
		Valor dos serviços, exclusive serviços preliminares e BDI =	R\$ 1.711.880,51
	A	Mão de obra = Percentual Resultante no item 02.00	R\$ 228.127,09
	B	Custo horário do oficial, mês de referência (cód. Sem Des = 01968; cód. Com Des =20115)	R\$ 26,73
	C	Nº de horas/mês	176
	D	Prazo da obra - meses	8 meses
		Nº de homens diretos (A/B/C/D)	6
		Nº de homens diretos	6
		Nº de homens indiretos (Administração Local)	3
		Mão de Obra Total	9
		Adotado Total	70% do efetivo 6
		Adotado Parcial	70% do efetivo 5

Composição do item Encargos complementares

Item	Código	Descrição	Unidade	Prazo	Quant. / Mês	Quant. Funcionarios	Preço Unitário	Total Parcial
8.1.1.1	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	8,00	22,00	6,00	R\$ 10,00	R\$ 10.560,00
8.1.1.2	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	8,00	22,00	6,00	R\$ 17,00	R\$ 17.952,00
8.1.1.3	05.100.0024-A	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	8,00	1,00	5,00	R\$ 325,00	R\$ 13.000,00
8.1.1.4	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	8,00	22,00	5,00	R\$ 8,00	R\$ 7.040,00

**JEFFERSON
GUILHERME**

**TEIXEIRA:138834
95743**

Assinado de forma digital
por JEFFERSON

GUILHERME

TEIXEIRA:13883495743

Dados: 2026.02.09

15:05:08 -03'00'



Documento assinado digitalmente

RENATA BATISTA BARRETO PINTO

Data: 09/02/2026 16:11:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Município	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Endereço	Cardoso Moreira	BDI S/ DES.	18,00%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	10,00%
ÁREA	550,61 m²	Prazo	8 meses

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 294.238,30		R\$ 347.201,19
22.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 294.238,30		R\$ 347.201,19
22.1.1	01.090.0000-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 2.942,38	R\$ 294.238,30	18,00%	R\$ 347.201,19

Composição da Administração Local						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
22.1.1.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,00	R\$ 20.519,84	R\$ 82.079,36
22.1.1.2	19.004.0046-C	CAMIONETA TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, DUAS POR TÁS, COM MOTORIZAÇÃO DE 1.2 A 1,6 LITROS	H	1.408,00	R\$ 96,60	R\$ 136.012,80
22.1.1.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00	R\$ 7.766,88	R\$ 62.135,04
22.1.1.12	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO, COMPUTADORES LICENCA OBRA, MOV EIS UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EX CL.DESP.C/CAFE MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	385,45	R\$ 36,35	R\$ 14.011,10

Quantificação do item 05.100.0900-0		Valores
Custo total dos itens listados na planilha de administração local		R\$ 280.227,20
Percentual determinado	5,00%	R\$ 14.011,36
Valor publicado no Boletim Mensal de Custos do item		R\$ 36,35
Quantidade do item determinada		385,45

Percentual de Administração Local Inserido no Custo Direto		Valores
Valor Total do Orçamento		R\$ 2.698.199,19
Valor da Administração Local		R\$ 347.201,19
Percentual recomendado para construção acima de R\$ 1.500.000,00		3,49%
Percentual verificado		12,87%

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138
83495743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09 15:04:41 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:11:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

					Fase Licitatória			
Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 294.238,30		R\$ 358.970,72
22.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 294.238,30		R\$ 358.970,72
22.1.1	01.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UR	100,00	R\$ 2.942,38	R\$ 294.238,30	22,00%	R\$ 358.970,72

Composição da Administração Local						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
22.1.1.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	MES	4,00	R\$ 20.519,84	R\$ 82.079,36
22.1.1.2	19.004.0046-C	CAMIONETA TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, DUAS POR TAS, COM MOTORIZAÇÃO DE 1.2 A 1.6 LITROS	H	1.408,00	R\$ 96,60	R\$ 136.012,80
22.1.1.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	8,00	R\$ 7.766,88	R\$ 62.135,04
22.1.1.12	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO, COMPUTADORES LICENCA OBRA, MOV EIS UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EX CL.DESP.C/CAFE MANHA, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	385,45	R\$ 36,35	R\$ 14.011,10

Quantificação do item 05.100.0900-0		Valores
Custo total dos itens listados na planilha de administração local		R\$ 280.227,20
Percentual determinado	5,00%	R\$ 14.011,36
Valor publicado no Boletim Mensal de Custos do item		R\$ 36,35
Quantidade do item determinada		385,45

Percentual de Administração Local Inserido no Custo Direto		Valores
Valor Total do Orçamento		R\$ 2.683.756,69
Valor da Administração Local		R\$ 358.970,72
Percentual recomendado para construção acima de R\$ 1.500.000,00		3,49%
Percentual verificado		13,38%

JEFFERSON
 GUILHERME
 TEIXEIRA:13
 3
 883495743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA:1388349574

Dados: 2026.02.09 15:04:18 -03'00'


Documento assinado digitalmente
 gov.br RENATA BATISTA BARRETO PINTO
 Data: 09/02/2026 16:11:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
DETALHAMENTO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE


DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE SÃO FIDÉLIS = 32,4km



DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA C. F. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA= 54,0 KM

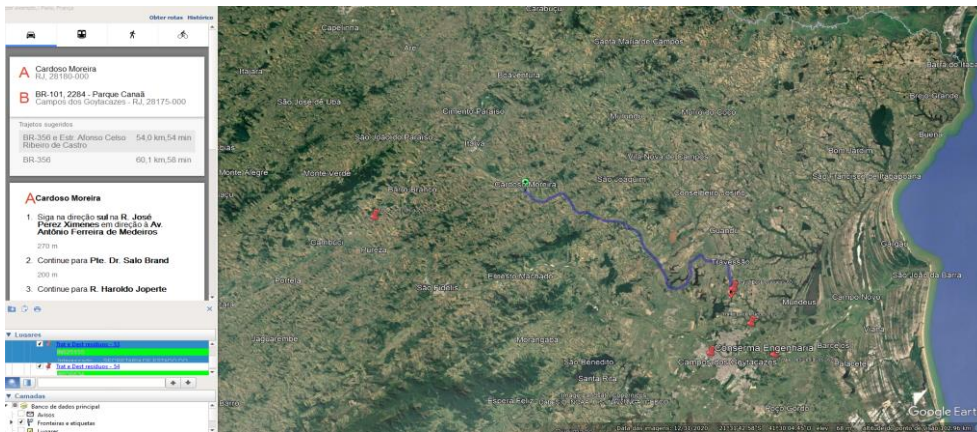


DISTÂNCIA TRECHO - BOTA-FORA COSERMA ENGENHARIA - 53,40 KM

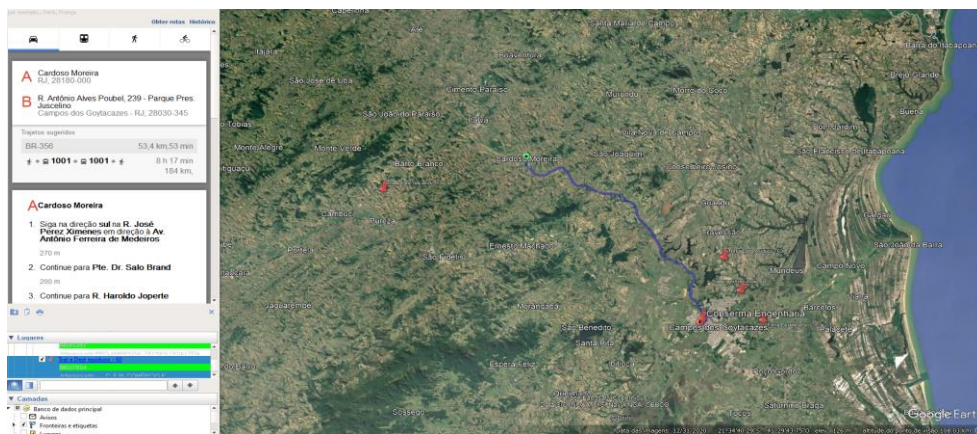

Bota-Fora 1 = 32,40 Km
 Bota-Fora 2 = 54,00 Km
 Bota-Fora 3 = 53,40 Km

DMT = 46,60 Km

DISTÂNCIA TRECHO - RIO DE JANEIRO - RJ = 53,90 KM

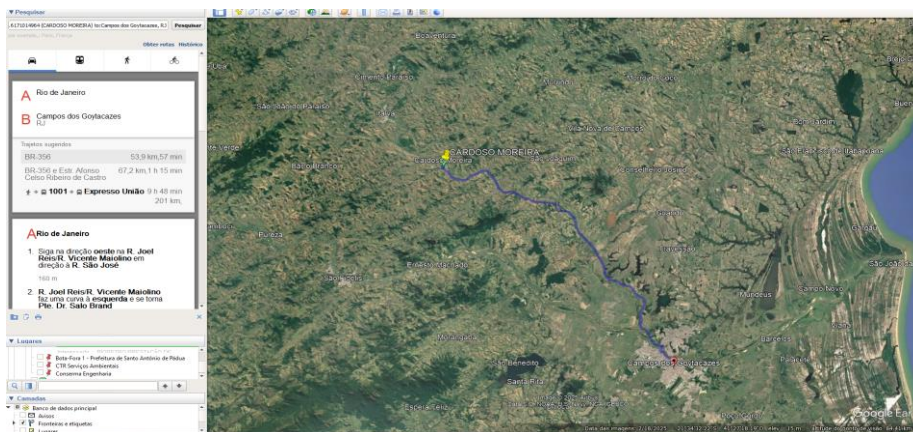

DMT = 53,90 Km

Não foram consideradas distâncias de bota-foras e de usinas ao local da obra acima de 100km por questões técnicas. Bota-foras encontram-se licenciados, porém não foi verificada a disponibilidade destes.

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE						
SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		TRANSPORTE (km)		
		ORIGEM	DESTINO	NP	P	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
Contâiners	Contâiners	Rio de Janeiro	Obra	0,00	53,90	53,90
Andaimes	Andaimes	Rio de Janeiro	Obra	0,00	53,90	53,90
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia	Equipamento e equipe de topografia	Rio de Janeiro	Obra	0,00	53,90	53,90
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem	Equipamento e equipe de sondagem	Rio de Janeiro	Obra	0,00	53,90	53,90
Ensaio de Controle Tecnológico	Concreto e aço	Rio de Janeiro	Obra	0,00	53,90	53,90
Escavação	mat. 1ª cat.	Obra	Bota-fora	0,00	46,60	46,60
Sub-base	Brita Corrida	Pedreira	Obra	0,00	#REF!	#REF!
Base	BGS	Pedreira	Obra	0,00	#REF!	#REF!
Imprimação	RR-2C	REDUC	Obra	0,00	0,00	0,00
CBUQ	Pedra britada, Cascalhinho e Pó-de-pedra	Pedreira	Usina	0,00	#REF!	#REF!
	CM-30	REDUC	Usina	0,00	#REF!	#REF!
	Massa	Usina	Obra	0,00	#REF!	#REF!

**JEFFERSON
 GUILHERME
 TEIXEIRA:138834
 95743**

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA:13883495743
 Dados: 2026.02.09 15:03:46 -03'00'

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Total Parcial	BDI	Total c/ BDI
2.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,48	R\$ 530,50	R\$ 3.437,64	22,00%	R\$ 4.193,92
2.2	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	2,67	R\$ 1.350,00	R\$ 3.600,00	22,00%	R\$ 4.392,00
2.3	02.004.0001-A	BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	4,83	R\$ 523,21	R\$ 2.528,84	22,00%	R\$ 3.085,19
2.4	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA, FORNEC I MENTO E COLOCACAO	UN	7,25	R\$ 103,86	R\$ 752,98	22,00%	R\$ 918,64
2.5	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA	M2	743,92	R\$ 0,87	R\$ 647,21	22,00%	R\$ 789,59
4.1	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	4,00	R\$ 91,66	R\$ 366,64	22,00%	R\$ 447,30
4.2	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	215,60	R\$ 34,90	R\$ 7.524,44	22,00%	R\$ 9.179,81

TOTAIS	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
	R\$ 18.857,75	R\$ 23.006,45
Total do Orçamento	R\$ 2.200.238,89	R\$ 2.683.756,69
% de Mobilização	0,86%	0,86%

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA: 13883
495743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA: 13883495743
Dados: 2026.02.09 15:02:57 -03'00'

Objeto		Encargos		Com Desoneração	
Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira		Ref. Preços		EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE	
Município Cardoso Moreira		Mês Base		12/2025	
Endereço Cardoso Moreira		BDI C/ DES.		22,00%	
Natureza Programa Governo Presente Cidades		BDI DIF.		14,00%	
ÁREA 550,61 m ²		Prazo		8 meses	

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 2.286.824,43	
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30	
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS	R\$ 1.944.034,13	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS
13.7	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA, IRREGULARES, COM 6CM DE	A	80%	17
13.3	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SE	B	95%	17
13.6	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, L	C	100%	33
11.4	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI	TOTAL		67

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
13.7	13.035.0025-5	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE MADEIRA BRUTA, IRREGULARES, COM 6CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RUSTICO, ASSENTES COM ARGAMASSA SA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA	M2	647,00	951,04	R\$ 615.322,88	31,6519%	31,65186%	A
13.3	13.168.0010-0	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP., PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500, NO SISTEMA COIL COATING, ESP.DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO), INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.	M2	159,60	950,00	R\$ 151.620,00	7,7992%	39,45110%	A
13.6	13.365.0087-0	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	M	601,99	150,30	R\$ 90.479,09	4,6542%	44,10529%	A
11.4	11.003.0006-0	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE MATERIAS, TRANSPORTE, P REPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADESSAMENTO	M3	98,67	715,04	R\$ 70.552,99	3,6292%	47,73450%	A
11.8	11.009.0072-1	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12MM, PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO, COM ESPESSURA DE 10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021, PS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	5.287,91	13,08	R\$ 69.165,86	3,5579%	51,29235%	A
14.1	14.005.0025-5	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	105,39	613,14	R\$ 64.618,82	3,3240%	54,61631%	A
13.5	13.175.0010-5	FORRO PVC AMADEIRADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	357,97	173,53	R\$ 62.118,53	3,1953%	57,81165%	A
8.1	08.020.0010-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICA DAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 8CM, RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	550,61	112,61	R\$ 62.004,19	3,1895%	61,00111%	A
2.2	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TRADAO DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	32,00	1.350,00	R\$ 43.200,00	2,2222%	63,22329%	A
11.11	11.004.0022-1	FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVI NDO A MADEIRA 1,4 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	421,94	101,79	R\$ 42.949,27	2,2093%	65,43258%	A
5.1	05.055.0010-0	LETRA CAIXA DE AÇO INOX POLIDO OU ESCOVADO, COM 20CM DE ALTURA, ESPESSURA DE 2CM, COM PINOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	343,00	121,30	R\$ 41.605,90	2,1402%	67,57276%	A
9.3	09.026.0025-5	LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICA 94L COM SUPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	30,00	1.055,93	R\$ 31.677,90	1,6295%	69,20225%	A
9.1	09.010.0001-0	CORDEOS DE CONCRETO SIMPLES, COM SECAO DE (10X25)CM, MOLDADOS NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	634,26	61,59	R\$ 39.064,07	2,0094%	71,21169%	A
13.4	13.001.0015-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	957,58	38,02	R\$ 36.407,19	1,8728%	73,08445%	A
11.10	11.009.0060-1	FIO DE AÇO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18	KG	2.513,14	13,43	R\$ 33.751,47	1,7362%	74,82061%	A
4.4	04.005.0143-1	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	21.863,79	1,57	R\$ 34.326,15	1,7657%	76,58633%	A

Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município		Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço		Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza		Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA		550,61 m ²	BDI DIF.	14,00%
			Prazo	8 meses

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 2.286.824,43	
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30	
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS	R\$ 1.944.034,13	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS
13.7	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE M/	A	80%	17
13.3	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SE	B	95%	17
13.6	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, L/	C	100%	33
11.4	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI	TOTAL		67


ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
16.2	16.020.0001-0	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POL. IMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO III-B, E SP.4,0MM, APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTIC O BASE AGUA ISENTO SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO C/C AUMENTO DE 1%, EXCLUSIVE REGULARIZACAO, CAMADA SEPARADORA E PR. OTECAO MECANICA, CONFORME ABNT NBR 9952.	M2	357,97	95,74	R\$ 34.272,04	1,7629%	78,34926%	A
16.4	16.001.0119-5	FURNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 2X10CM, COM COM VERNIZ TIPO COPAL BR ILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE IMPREGNACAO EM LANTAS DE CIMENTOS	M2	410,20	81,18	R\$ 33.300,03	1,7129%	80,06219%	B
2.3	02.004.0001-0	BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	58,00	568,52	R\$ 32.974,16	1,6962%	81,75837%	B
11.5	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, P. REPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,20	685,44	R\$ 30.296,44	1,5584%	83,31680%	B
11.12	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPL. ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	307,20	77,18	R\$ 23.709,69	1,2196%	84,53641%	B
1.6	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMEN DACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	UN	10,00	2.159,29	R\$ 21.592,90	1,1107%	85,64714%	B
5.3	05.002.0002-0	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	55,08	352,49	R\$ 19.415,14	0,9987%	86,64584%	B
1.3	01.050.0353-0	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	M2	156,00	119,62	R\$ 18.660,72	0,9599%	87,60574%	B
11.1	11.026.0030-0	MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM, ATÉ 1,80M DE ALTURA, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PE LA AREA REAL	M2	55,51	324,32	R\$ 18.003,00	0,9261%	88,53180%	B
16.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	357,97	46,84	R\$ 16.767,31	0,8625%	89,39430%	B
4.2	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	431,20	35,76	R\$ 15.419,71	0,7932%	90,18748%	B
15.8	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2021	UN	88,00	170,51	R\$ 15.004,88	0,7718%	90,95933%	B
12.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	156,50	97,43	R\$ 15.247,79	0,7843%	91,74366%	B
3.1	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	194,99	74,59	R\$ 14.544,30	0,7482%	92,49181%	B
1.5	01.050.0546-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATÉ 500M 2, CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇAO E DETALHES	M2	156,00	82,77	R\$ 12.912,12	0,6642%	93,15601%	B
14.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	13,95	551,34	R\$ 7.691,19	0,3956%	93,55164%	B
15.5	15.001.0026-0	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS(7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSÕES DE 0,40X0,40X0,40M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	29,00	405,68	R\$ 11.764,72	0,6052%	94,15681%	B

Objeto		Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE	
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025	
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%	
ÁREA	550,61 m ²	BDI DIF.	14,00%	
		Prazo	8 meses	

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 2.286.824,43	
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30	
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS	R\$ 1.944.034,13	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%
13.7	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE M/	A	80%
13.3	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SE	B	95%
13.6	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, L/	C	100%
11.4	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI	TOTAL	67

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
1.2	01.005.0004-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDEDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL	M2	550,61	21,93	R\$ 12.074,87	0,6211%	94,77793%	B
11.9	11.009.0070-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18,FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	707,07	13,79	R\$ 9.750,49	0,5016%	95,27949%	C
2.4	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDEDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO	UN	87,00	111,24	R\$ 9.677,88	0,4978%	95,77731%	C
18.1	18.027.0434-0	LUMINARIA TIPO SPOT DIRECIONAL ,EXCLUSIVE LAMPADA,FORNECIMENT O E COLOCACAO	UN	125,00	78,04	R\$ 9.755,00	0,5018%	96,27911%	C
13.1	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO , SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	130,61	59,43	R\$ 7.762,15	0,3993%	96,67839%	C
12.1	12.005.0010-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARG MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	99,30	71,49	R\$ 7.098,95	0,3652%	97,04355%	C
17.1	17.020.0010-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ,MUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAM ENTO	M2	357,97	18,45	R\$ 6.604,54	0,3397%	97,38329%	C
15.4	15.036.0052-0	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	187,32	37,25	R\$ 6.977,67	0,3589%	97,74221%	C
18.2	18.027.0575-5	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	UN	30,00	159,23	R\$ 4.776,90	0,2457%	97,98794%	C
11.6	11.003.0002-0	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,02	640,60	R\$ 4.497,01	0,2313%	98,21926%	C
4.5	TC10.05.0701	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	469,18	8,75	R\$ 4.105,32	0,2112%	98,43043%	C
15.9	15.008.0200-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1 ,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1.032,88	3,61	R\$ 3.728,69	0,1918%	98,62224%	C
2.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,48	556,55	R\$ 3.606,44	0,1855%	98,80775%	C
13.2	13.301.0080-1	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE	M2	61,20	48,25	R\$ 2.952,90	0,1519%	98,95964%	C
17.2	17.020.0021-0	UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICIO DO IT EM 17.020.0010	M2	357,97	7,60	R\$ 2.720,57	0,1399%	99,09959%	C
11.7	11.009.0074-1	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18,FORNECIMENTO,C ORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	KG	175,10	12,01	R\$ 2.102,95	0,1082%	99,20776%	C
9.2	09.001.0020-0	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIM ENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE	M2	118,85	17,38	R\$ 2.065,61	0,1063%	99,31402%	C
15.2	15.018.0125-0	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,3" X 3" ,INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	156,00	12,61	R\$ 1.967,16	0,1012%	99,41521%	C
5.2	05.054.0001-5	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SAI - 15X15 cm	UN	30,00	58,79	R\$ 1.763,70	0,0907%	99,50593%	C
4.3	04.012.0076-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDEDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H	T	469,18	3,70	R\$ 1.735,96	0,0893%	99,59523%	C

Curva ABC		CIDADES 							
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração						
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE						
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025						
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%						
ÁREA	550,61 m ²	BDI DIF.	14,00%						
		Prazo	8 meses						
RESUMO / CONFERE									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC						
	VALOR TOTAL	R\$ 2.286.824,43							
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30							
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00							
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS	R\$ 1.944.034,13	100%						
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00						
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS					
13.7	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE M/	A	80%	17					
13.3	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SE	B	95%	17					
13.6	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, L/	C	100%	33					
11.4	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI	TOTAL		67					
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
15.3	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO.	M	467,70	3,19	R\$ 1.491,96	0,0767%	99,67197%	C

Objeto		Encargos	Com Desoneração	
Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE	
Município	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025	
Endereço	Cardoso Moreira	BDI C/ DES.	22,00%	
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	14,00%	
ÁREA	550,61 m ²	Prazo	8 meses	

RESUMO / CONFERE			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	PESO PARA CURVA ABC
	VALOR TOTAL	R\$ 2.286.824,43	
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30	
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00	
	VALOR TOTAL DESCONTADO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E ENCARGOS	R\$ 1.944.034,13	100%
	CONFERE	-R\$ 0,00	0,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONCEITO	%	ITENS
13.7	REVESTIMENTO DE PAREDES, COM PLACAS TRABALHADAS DE PEDRA DE M...	A	80%	17
13.3	REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO, SE...	B	95%	17
13.6	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, L...	C	100%	33
11.4	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI...	TOTAL		67

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CONCEITO
15.6	15.001.0027-0	CAIXA DE ALVENARIA EM TUILOS MACIÇOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ.COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	650,95	R\$ 1.301,90	0,0670%	99,73894%	C
21.2	21.031.0030-0	RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCR ETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO	UN	30,00	28,21	R\$ 846,30	0,0435%	99,78248%	C
4.1	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	UN	8,00	96,79	R\$ 774,32	0,0398%	99,82231%	C
21.1	21.031.0015-0	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TE NSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W O U 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV,PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEV ENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO	UN	30,00	23,74	R\$ 712,20	0,0366%	99,85894%	C
2.5	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	743,92	0,87	R\$ 647,21	0,0333%	99,89223%	C
11.2	11.023.0032-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE A CO CA-60,COM DIAMETRO DE 4,2MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	M2	36,73	10,58	R\$ 388,60	0,0200%	99,91222%	C
15.7	15.007.0570-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	29,00	13,61	R\$ 394,69	0,0203%	99,93252%	C
10.1	10.028.0010-0	ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO	M	4,00	93,45	R\$ 373,80	0,0192%	99,95175%	C
15.1	15.018.0120-0	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00	11,20	R\$ 336,00	0,0173%	99,96904%	C
16.1	16.030.0001-0	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG /M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA	M2	8,61	28,17	R\$ 242,54	0,0125%	99,98151%	C
11.3	11.011.0045-0	CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO	M2	54,36	2,61	R\$ 141,88	0,0073%	99,98881%	C
1.4	01.050.0525-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES ENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M2	156,00	0,86	R\$ 134,16	0,0069%	99,99571%	C
1.1	01.001.0076-0	PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8"	M	4,00	20,84	R\$ 83,36	0,0043%	100,00000%	C

CURVA ABC

Gráfico de Curva ABC mostrando a distribuição percentual dos itens. O eixo X representa os itens de 1 a 67, e o eixo Y representa a porcentagem de 0% a 100%. Uma linha vermelha representa a porcentagem acumulada, que sobe rapidamente nos primeiros itens e se aproxima de 100% para os itens finais. Barras azuis representam a porcentagem individual de cada item.

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883
495743

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09
15:02:19 -03'00'

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Município	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Endereço	Cardoso Moreira	BDI S/ DES.	18,00%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m2	Prazo	8 meses

Item	Descrição	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
		SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%	SUBTOTAL S/BDI	SUBTOTAL C/BDI	%
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 65.458,13	R\$ 77.240,56	2,86%	R\$ 58.901,23	R\$ 71.859,47	2,68%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 90.105,69	R\$ 106.324,68	3,94%	R\$ 86.666,85	R\$ 105.733,54	3,94%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.544,30	R\$ 17.162,27	0,64%	R\$ 13.081,87	R\$ 15.959,88	0,59%
4	TRANSPORTE	R\$ 56.361,46	R\$ 66.506,49	2,46%	R\$ 55.707,49	R\$ 67.963,13	2,53%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 62.784,74	R\$ 74.085,98	2,75%	R\$ 60.979,12	R\$ 74.394,52	2,77%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 62.004,19	R\$ 73.164,94	2,71%	R\$ 60.330,33	R\$ 73.603,00	2,74%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 72.807,58	R\$ 85.747,69	3,18%	R\$ 70.419,23	R\$ 85.752,19	3,20%
10	FUNDAÇÕES	R\$ 373,80	R\$ 441,08	0,02%	R\$ 354,12	R\$ 432,02	0,02%
11	ESTRUTURAS	R\$ 305.309,65	R\$ 360.234,24	13,35%	R\$ 292.988,53	R\$ 357.414,87	13,32%
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 22.346,74	R\$ 26.369,15	0,98%	R\$ 21.354,36	R\$ 26.052,31	0,97%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 966.662,74	R\$ 1.140.662,00	42,27%	R\$ 919.862,92	R\$ 1.122.232,74	41,82%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 72.310,01	R\$ 85.325,80	3,16%	R\$ 71.279,26	R\$ 86.960,69	3,24%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 42.967,67	R\$ 50.701,81	1,88%	R\$ 41.052,70	R\$ 50.084,26	1,87%
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 84.581,92	R\$ 99.806,64	3,70%	R\$ 80.617,99	R\$ 98.066,76	3,65%
17	PINTURAS	R\$ 9.325,11	R\$ 11.003,62	0,41%	R\$ 8.659,29	R\$ 10.564,32	0,39%
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 14.531,90	R\$ 17.147,64	0,64%	R\$ 13.719,70	R\$ 16.738,03	0,62%
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.558,50	R\$ 1.782,05	0,07%	R\$ 1.473,60	R\$ 1.740,80	0,06%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 294.238,30	R\$ 347.201,19	12,87%	R\$ 294.238,30	R\$ 358.970,72	13,38%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.552,00	R\$ 57.291,36	2,12%	R\$ 48.552,00	R\$ 59.233,44	2,21%
TOTAL		R\$ 2.286.824,43	R\$ 2.698.199,19	100,00%	R\$ 2.200.238,89	R\$ 2.683.756,69	100,00%

PLANILHA COM MENOR VALOR		R\$ 2.683.756,69		R\$ 2.698.199,19
		Com Desoneração		Sem Desoneração
VALOR TOTAL S/ BDI:		R\$ 2.200.238,89		R\$ 2.286.824,43
BDI:	22,00%	R\$ 483.085,00	18,00%	R\$ 411.058,12
BDI DIF:	14,00%	R\$ 432,80	10,00%	R\$ 316,64
VALOR TOTAL C/ BDI:		R\$ 2.683.756,69		R\$ 2.698.199,19
PRAZO DA OBRA:		8	MESES	

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138
83495743

Assinado de forma digital por JEFFERSON GUILHERME TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09 15:01:04 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATA BATISTA BARRETO PINTO
Data: 09/02/2026 16:07:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Título do Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira
Município	Cardoso Moreira
Endereço	Cardoso Moreira
Natureza	Programa Governo Presente Cidades
Referência de Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Mês Base de Preços	12/2025
BDI SEM DESONERAÇÃO	18,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO DIF.	10,00%
BDI COM DESONERAÇÃO	22,00%
BDI COM DESONERAÇÃO DIF.	14,00%
Prazo da Obra	8 Meses
Nº do Processo	SEI-510001/000528/2025
ÁREA	550,61 m ²

JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:138
83495743

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
GUILHERME
TEIXEIRA:13883495743
Dados: 2026.02.09
11:52:26 -03'00'



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
04749/ORSE	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m ²

Composição de Preço

* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,1	18,93	1,89
01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	5	4,14	20,70
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,72	9,67	6,96
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,72	6,90	4,97
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,72	3,97	2,86
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,72	3,90	2,81

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,09	27,19	11,93	13,29	0,98	53,48

Relação Detalhada de Insumos

* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,146592	14,00	2,05
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00108	73,93	0,08
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000288	20,11	0,01
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000864	13,50	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,72	20,44	14,72
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,000144	185,23	0,03
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00648	205,00	1,33
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000144	26,89	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000576	300,00	0,17
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00216	194,68	0,42
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,000144	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000072	246,00	0,02
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,003312	10,87	0,04
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000072	37,80	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000144	48,95	0,01
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00108	7,00	0,01
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000144	36,90	0,01
M 01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,1	18,93	1,89
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00648	4,85	0,03
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002592	18,00	0,05
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,146592	5,00	0,73
M 01975/ORSE	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm	m	5	4,14	20,70
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00648	12,54	0,08
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000072	979,65	0,07
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000072	36,00	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,72	14,58	10,50
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000216	18,58	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,11484	4,50	0,52



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedores Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço


Agosto/2025-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
10409/ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	un

Composição de Preço						
* Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
07060/ORSE	Lampada fluorescente eletrônica PL 26W / 127V (compacta integrada)	Un	1	7,40	7,40	
11183/ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	Un	1	71,14	71,14	
11189/ORSE	Globo leitoso (10 x 20cm) em polietileno para luminária da Eterna ref. 951 ou similar	un	1	28,40	28,40	
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	9,67	9,67	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97	
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1	3,82	3,82	

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	113,34	16,57	18,45	1,37	149,73

Relação Detalhada de Insumos						
* Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total	
M 11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01	
M 11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un	0,0002	170,60	0,03	
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85	
M 11183/ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	Un	1	71,14	71,14	
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11	
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01	
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02	
M 02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	un	0,0002	185,23	0,04	
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009	205,00	1,84	
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01	
M 11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	34,00	0,00	
P 02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	20,44	20,44	
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24	
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003	194,68	0,58	
M 11189/ORSE	Globo leitoso (10 x 20cm) em polietileno para luminária da Eterna ref. 951 ou similar	un	1	28,40	28,40	
M 07060/ORSE	Lampada fluorescente eletrônica PL 26W / 127V (compacta integrada)	Un	1	7,40	7,40	
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05	
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00	
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01	
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009	4,85	0,04	
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06	
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02	
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009	12,54	0,11	
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	14,58	14,58	
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01	
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72	

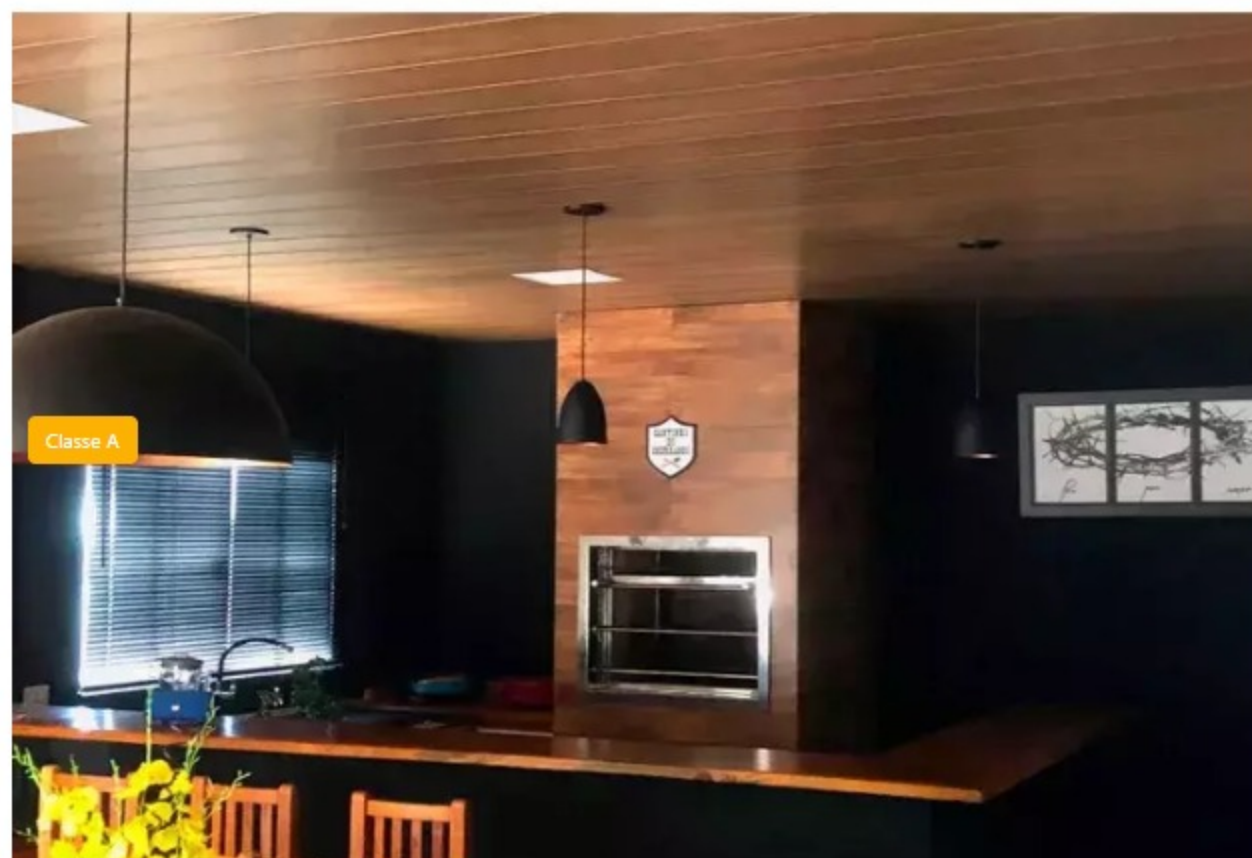

Pode conter pequenas avarias estéticas

Início > Construção > (Classe A) Forro de Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri Imbuia (Por caixa 6M²)

(Classe A) Forro de Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri Imbuia (Por caixa 6M²)

SKU: 871548A

R\$147,00 ~~R\$278,00~~

R\$139,65 com Pix

5 x de **R\$29,40** sem juros


5% de desconto **pagando com Pix**

[Ver mais detalhes](#)

10% OFF comprando 1 ou mais!

Válido para este produto e todos da categoria: Construção, Construção → Portas e Janelas, Construção → Sanitários, Construção → Espelhos, Banheiro.

Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.



COMPRAR

3 em estoque

Entregas para o CEP: **28180000**

[ALTERAR CEP](#)

Não há frete disponível para o CEP informado

[f](#) [X](#) [p](#)

Descrição

Sobre o produto

Este é um produto de Outlet.

Os itens comercializados em nosso outlet são aqueles que foram **devolvidos ao centro de distribuição**. Lá os produtos são revisados por nossa equipe especializada de qualidade, processo pelo qual asseguramos que o item não **apresente nada que o impeça de ser usado**, ou seja, sua funcionalidade está intacta. Podem haver, porém, **pequenas avarias estéticas**, como lascas, batidas, furos, arranhões, falhas na costura e/ou amassados, sejam eles visíveis ou pouco perceptíveis.

Descrição

Forro de Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri

O forro PVC, também conhecido no mercado como teto de PVC, é o produto ideal para forrações e acabamentos de teto, mas é também muito utilizado para aplicação em paredes, pois deixa o ambiente mais requintado.

Esse modelo de forro PVC da Bariri é comercializado em várias cores como branco, mogno, cerejeira, imbuia muitos outros.

O forro PVC branco tem um preço muito acessível, sendo uma das soluções mais econômicas para sua obra. Ainda é possível economizar na instalação, pois mesmo pode ser instalado sem um profissional credenciado.

Possui normas técnica .

NBR 14285, Índice de propagação de chamas NBR 9442 - classe - A , densidade óptica de fumaça ASTM E662 resultado 221 DM.


Pesos e Dimensões

Comprimento (cm)	300 cm
Largura (cm)	20 cm
Espessura (mm)	8 mm

Estado de conservação do produto



Produtos similares




(Classe A) Kit Porta de Madeira 210x82cm Batente 11cm Lisa Primer...

R\$531,28 ~~R\$611,09~~

R\$504,72 com Pix

10 x de **R\$53,13** sem juros




(Classe A) Porta de Aço Postigo 215x85cm com Grade Mosaico e...

R\$869,38 ~~R\$999,98~~

R\$825,91 com Pix

10 x de **R\$86,94** sem juros



(Classe A) Espelho Decorativo Redondo 90 cm em MDF Mel

R\$309,99 ~~R\$591,08~~

R\$294,49 com Pix

10 x de **R\$31,00** sem juros




(Classe A) Kit 2 Portas para Guarda-roupa de Canto Reto Modular 95cm...

R\$399,99

R\$379,99 com Pix

10 x de **R\$40,00** sem juros



(Classe A) Janela de Alumínio de Correr 100x120cm 2 Folhas com...

R\$627,88 ~~R\$722,80~~

R\$596,49 com Pix

10 x de **R\$62,79** sem juros



DEPARTAMENTOS

Escritório

Cozinha

Produtos

Contato

Quem Somos

INSTITUCIONAL

Políticas de Privacidade

Políticas de Reembolso

Políticas de Troca

Política de Frete

Termos de Uso

ENTRE EM CONTATO

5511939572115

contato@casasaldao.com.br

Estrada da Divisa, 231 - Santa Maria, Osasco São Paulo, Brasil - 06149-208

Estrada Cabreuva, 487, Vila Marcondes, Carapicuíba São Paulo, Brasil - 06321-001

NEWSLETTER


Receba ofertas no seu email


ENVIAR

Meios de pagamento



Segurança



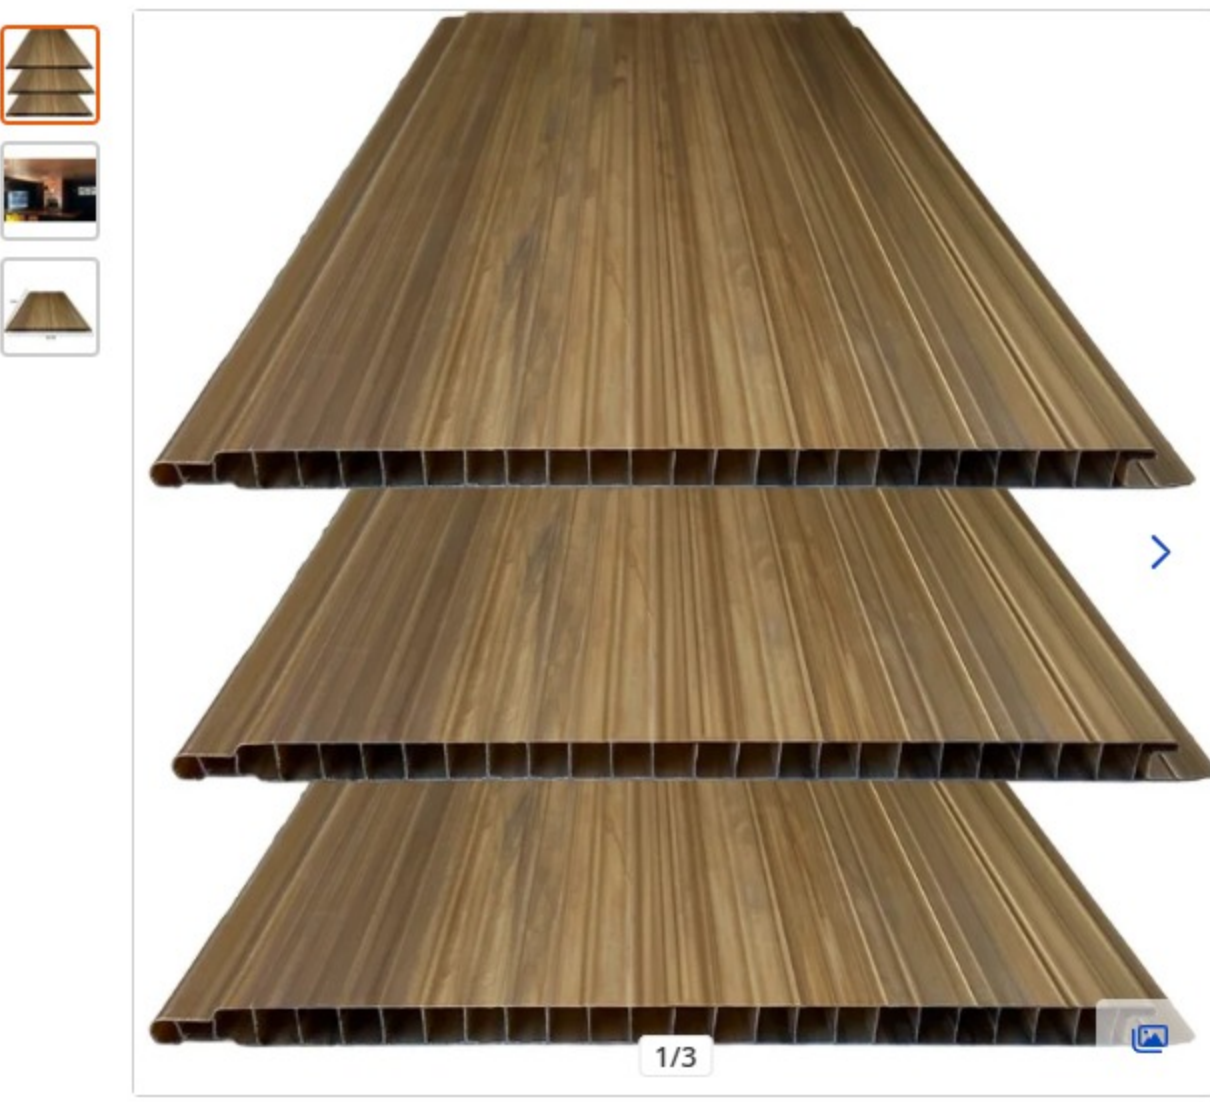

Forro de Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri Imbuia

Vendido e entregue por **MadeiraMadeira**

★★★★☆ 4.5 | 26 avaliações ID: 871548

Personalize sua compra

Cor: **Imbuia**



m² por caixa: **6**



Tamanho do Produto: **8mm x 20cm x 3,00m**



Precisa de ajuda para comprar? Fale com um especialista. >

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R\$55,97 ↓ 28%

R\$ 35,98 /m²

A caixa sai por **R\$215,88**

à vista no cartão ou Pix (10% OFF)
ou 3x de R\$ 79,96 sem juros

Em estoque

Mais opções de pagamento

Não sabe de quanto precisa? Calcule a quantidade ideal >

Para cobrir: 6 m²
Você vai precisar de: 1 caixa
Cada caixa possui: 6 m²

Seja prevenido, adicione 5% de perdas na instalação Saiba mais



Adicionar

Comprar agora

Calcule frete e prazo de entrega

Para CEP 28180000 [Alterar](#)

ENTREGA NORMAL
Receba até 30 de outubro **R\$ 99,99**

A partir da confirmação do pagamento

Informações do produto Avaliações Perguntas e Respostas

Descrição

Forro de Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri

O forro PVC, também conhecido no mercado como teto de PVC, é o produto ideal para forrações e acabamentos de teto, mas é também muito utilizado para aplicação em paredes, pois deixa o ambiente mais requintado.

Esse modelo de forro PVC da Bariri é comercializado em várias cores como branco, mogno, cerejeira, imbuia muitos outros.

O forro PVC branco tem um preço muito acessível, sendo uma das soluções mais econômicas para sua obra. Ainda é possível economizar na instalação, pois mesmo pode ser instalado sem um profissional credenciado.

Possui normas técnica .

NBR 14285, índice de propagação de chamas NBR 9442 - classe - A , densidade óptica de fumaça ASTM E662 resultado 221 DM.

Pesos e Dimensões

Comprimento (cm)	300 cm
Largura (cm)	20 cm
Espessura (mm)	8 mm

Garantia

Garantia	12 Meses
----------	----------

Materiais e Acabamentos

Material Principal	
Construção e Acabamento	PVC

Montagem

Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza	Limpar com pano e água sabão neutro, não utilizar gasolina e querosene
--	--

Documentos Adicionais

Manual de Montagem e Instalação	Clique aqui para acessar
---------------------------------	--

Outras características

Ambiente indicado	Comercial;Industrial;Residencial
-------------------	----------------------------------

Características

Tamanho do Produto	8mm x 20cm x 3,00m
Cor	Imbuia
Marca	Bariri
Linha ou Coleção	Bariri
Cor do Produto	Imbuia
Origem do Produto	Nacional
Tipo de Certificado	NBR14285
Modelo	Forro Bariri
Permite Reutilização	Sim
m² por caixa	6 m²
Porte do Ambiente Indicado	Médio Porte
Meio Ambiente	Material reciclado
Ambiente	Interno
Cor Predominante	Marron
Informações Complementares (Novo)	Não requer pintura, resistente a cupim, isolante térmico, acústico

Itens Inclusos

Acompanha Manual de Instalação	Não
Itens Inclusos	Embalagem plástica, cantoneira de papelão
Acompanha Ficha Técnica	Não

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira

Apenas para você

Forro de Pvc 10mm X 20cm X 3,00m com 6m² por Caixa Bariri

★★★★☆ (14)

R\$ 61,22

R\$ 34,98

Forro de Pvc 8mm X 20cm X 3m 6m² Polifort

★★★★☆ (22)

R\$ 46,63

R\$ 29,98

Meia Cana Polifort 8mm X 38mm X 3,00m (barra)

★★★★☆ (14)

R\$ 68,42

R\$ 43,98

Cantoneira em L Pvc Protetor de Canto 25x25mm Barra 300cm Bariri

★★★★☆ (1)

R\$ 45,00

R\$ 28,98

Emenda Rígida Pvc Perfil H 1,3mm X 4,8cm X 3m Permatti

R\$ 45,00

R\$ 28,98

Você pode gostar

Forro de Pvc 8mm X 20 Cm X 3,00m Bariri

★★★★☆ (24)

R\$ 92,69

R\$ 20,98

Forro de Pvc 8mm X 20cm X 3,00m (6m²) por Caixa

★★★★☆ (4)

R\$ 54,22

R\$ 30,98

Forro de Pvc 10mm X 20cm X 3,00m com 6m² por Caixa Bariri

★★★★☆ (14)

R\$ 61,22

R\$ 34,98

Forro de Pvc 8mm X 20cm X 3m 6m² Polifort

★★★★☆ (17)

R\$ 96,06

R\$ 24,98

Forro de Pvc 10mm X 20cm X 3,00m com 6m² por Caixa Bariri

★★★★☆ (14)

R\$ 61,22

R\$ 34,98

Institucional

- Sobre a Madeira
- Trabalhe Conosco
- Lojas Físicas
- Baixe o App
- Blog da Madeira
- Black Friday
- Responsabilidade Social

Como trabalhamos

- Para empresas
- Para arquitetos
- Venda na Madeira
- Serviços
- Cashback
- Blog Marketplace
- Portal Integridade

Guia de navegação

- Móveis para Quarto
- Móveis para Sala de Estar
- Móveis para Cozinha
- Móveis para Escritório
- Mapa do Site
- Regulamento Black Garantida

Atendimento

- Ajuda
- Compre pelo WhatsApp

Televendas

0800 080 0099
De Segunda a sábado, das 08h às 20h. Exceto feriados.

Formas de pagamento



Certificados



Compra segura




Forro De Pvc Plus 8mm X 20cm X 3,00m Bariri - Caixa Com 6m2 - Imbuia

★★★★★ 0 (0)

CÓD. 1572273010

EAN: 789863470915

EXCLUSIVO SITE



Lista de favoritos



Preço válido para o dia 08/10/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

Forro de pvc plus 8mm x 20cm x 3,00m bariri - caixa com 6m2 - imbuia. O forro pvc, também conhecido no mercado como teto de pvc, é o produto ideal para forrações e acabamentos de teto, mas é também muito utilizado para aplicação em paredes, pois deixa o ambiente mais requinta...

[Ver descrição técnica](#)

OFERTA -20%

RS 239,88

R\$ 191,90 à vista no pix

R\$ 239,88 a prazo

em até 2x ou em até 10x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Madeiramadeira**

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Calcule seu frete

28180-000

Não sei meu CEP

CEP válido

Entrega em até 17 dias úteis por **R\$ 99,99**

*Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

[Clique aqui para ver outras formas de frete para Rio de Janeiro](#)

Ver estoque nas lojas físicas

Produtos que você vai precisar

<p>Moldura Cantoneira Externa Branco 4 Peças 0,04x0,04 Permatiti Cód. 89466741 ★★★★★ (2)</p> <p>R\$ 15,99 cada</p>	<p>Cantoneira Parede Branco 1,9x1,9cm 3m Tecnoperfil Cód. 89337283 ★★★★★ (20)</p> <p>R\$ 42,29 cada</p>	<p>União Rígido Interna Branco 4 Peças 0,037x0,017m Permatiti Cód. 89466755 ★★★★★ (0)</p> <p>R\$ 15,99 cada</p>	<p>Cantoneira para Parede de Sobrepor 3M Cinza 1,9cm PVC Cód. 89615442 ★★★★★ 1 (6)</p> <p>R\$ 44,17 cada</p>	<p>Moldura Cantoneira Interno Mogno 4 Peças 0,04x0,04 Permatiti Cód. 89466762 ★★★★★ (0)</p> <p>R\$ 19,99 cada</p>	<p>Cantoneira para Parede Sobrepor 3M Cinza 1,9cm PVC Cód. 89615435 ★★★★★ (7)</p> <p>R\$ 51,61 cada</p>
--	---	---	--	---	---

Produto	Forro
Altura	1,60 m
Largura	20,00 m
Material	Plástico
Tipo de Material	PVC
Marca	Bariri
Cor	Imbuia
Tonalidade	Marrom
Peso do Produto	1,32 Kg
Garantia do Fabricante	12 mes(es)

Leroy Merlin Garante
Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais.

Forro de pvc plus 8mm x 20cm x 3,00m bariri - caixa com 6m2 - imbuia. O forro pvc, também conhecido no mercado como teto de pvc, é o produto ideal para forrações e acabamentos de teto, mas é também muito utilizado para aplicação em paredes, pois deixa o ambiente mais requintado. esse modelo de forro pvc da bariri é comercializado em várias cores como branco, mogno, cerejeira, imbuia muitos outros. o forro pvc branco tem um preço muito acessível, sendo uma das soluções mais econômicas para sua obra. Ainda é possível economizar na instalação, pois mesmo pode ser instalado sem um profissional credenciado. possui normas técnica . nbr 14285, índice de propagação de chamas nbr 9442 - classe - a , densidade óptica de fumaça astm e662 resultado 221 dm. Garantia: 12 meses largura (cm): 20 m² por caixa: 6 espessura (mm): 8 comprimento (cm): 300 origem do produto: nacional permite reutilização: sim acompanha ficha técnica: não porte do ambiente indicado: médio porte acompanha manual de instalação: não informações complementares (novo): não requer pintura, resistente a cupim, isolante térmico, acústico material principal construção e acabamento: pvc fabricante: bariri marca: bariri modelo: forro bariri cor: imbuia meio ambiente: material reciclado cor do produto: imbuia itens inclusos: embalagem plástica, cantoneira de papelão cor predominante: marrom linha ou coleção: bariri tipo de certificado: nbr14285 tamanho do produto: 8mm x 20cm x 3,00m

Avaliações

★★★★★ Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Compre pelo WhatsApp

Para todo o território nacional.
Horário de atendimento pelo Whatsapp sujeito à região.

(11) 4007-1380

Compre pelo telefone

Atendimento do Televendas é das 8h às 19h de segunda a sexta.

Atendimento do Televendas é das 8h às 14h aos sábados.

4007-1380

Capitais

0800-602-1380

Demais Regiões

Central de atendimento

A Central de Atendimento funciona das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

4020-5376

Capitais (Telefone e WhatsApp)

0800-020-5376

Demais Regiões

Baixe nosso aplicativo



Siga nossos perfis



Certificados



<p>Departamentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Banheiros Cama, Mesa e Banho Climatização e Ventilação Cozinhas e Áreas de Serviço Decoração Eletros Ferragens Ferramentas Iluminação Jardim e Varanda Limpeza da Casa Madeiras Materiais de Construção Materiais Elétricos Materiais Hidráulicos Móveis Organização da Casa Pet Shop Pintura e Acessórios Pisos e Revestimentos Portas, Janelas e Portões Segurança e Comunicação 	<p>Aprenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspire-se Dicas Faça você mesmo Cursos e Eventos Tendências Sustentabilidade Calculadoras Ferramentas de Projetos <p>Serviços</p> <ul style="list-style-type: none"> Facilidades nas lojas Venda Faturada Empresas Garantia Estendida Leroy Merlin <p>Mapas do Site</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa de Buscas Mapa de Categorias Mapa de Produtos 	<p>A Leroy Merlin</p> <ul style="list-style-type: none"> A Leroy Merlin Compliance Soluções Financeiras História Programa de Afiliados Sustentabilidade Trabalhe Conosco Ofereça um imóvel Site Internacional Seja um fornecedor Inova Leroy Merlin Comunidade Clientes Sala de Imprensa Programa de Fidelidade Relatório de transparência e igualdade salarial <p>Marketplace</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda com a gente 	<p>Dúvidas</p> <ul style="list-style-type: none"> Política de segurança Política de troca Política de pagamento Política de entrega Política de privacidade Política de cookies Termos e condições Regulamento Leroy Merlin com Você Avaliação de produtos Recall Dicas de segurança <p>Atendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> FAQ de eCommerce FAQ de Loja Física Fale conosco
---	--	---	---

Sustentabilidade

Construir e Sustentar

Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem , a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Faldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 47 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 94 LITROS COM SUPORTE FIXO TAMPA VERMELHA

Você está em: [Página inicial](#) > [DECORAÇÃO](#) > [Lixeira de madeira plastica 94 litros COM Suporte Fixo Tampa Vermelha](#)

FOTOS

[Galeria](#)



🔍 PASSE O MOUSE E VEJA DETALHES



Marca: **IN BRASIL**

Modelo: KIT Lixeira Ecologica para Coleta Seletiva 94L + Suporte Vermelha
Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis
Referência: 2387p

R\$ 1.299,90

R\$ 1.247,90 à vista com desconto DEPOSITO/TRANSFERENCIA ou 12x de R\$ 134,19 com juros Cartão Visa - Vindi

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

Quantidade: / 4



COMPRAR AGORA



SIMULADOR DE FRETE

CEP:

 -

Calcular

DESCRIÇÃO GERAL

GARANTIA

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Lixeira de madeira plastica 94 litros Tampa Vermelha- 70cm COM Suporte Fixo

OBS: Lixeira acompanha o suporte vendido o conjunto

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Suporte 70cm – 26kg

2 palanques 90x90x1300mm + 1 palanque 90x90x455mm

1 Lixeira Dimensões da lixeira 700x500mm Peso 18kg

Temos outras cores de tampas (preta, amarela, marrom)

PRODUTOS RELACIONADOS



Suporte p/ lixeira de madeira plastica 94 litros - 70 cm fixo

Por: R\$ 391,70

R\$ 376,03 à vista com desconto DEPOSITO/TRANSFERENCIA
ou 12x de R\$ 40,44 com juros Cartão Visa - Vindi



Tampa avulsa para Lixeira de madeira Plastica de 70cm 94L

Por: R\$ 889,39

R\$ 853,81 à vista com desconto DEPOSITO/TRANSFERENCIA
ou 12x de R\$ 91,81 com juros Cartão Visa - Vindi



Kit de 3 Lixeira p/Coleta Seletiva 94L tampa Preta Madeira Plastica Ecologica

Por: R\$ 2.200,00

R\$ 2.112,00 à vista com desconto DEPOSITO/TRANSFERENCIA
ou 12x de R\$ 227,11 com juros Cartão Visa - Vindi



Kit de 4 Lixeira p/Coleta Seletiva 94L tampa Preta Madeira Plastica Ecologica

Por: R\$ 3.513,40

R\$ 3.372,86 à vista com desconto DEPOSITO/TRANSFERENCIA
ou 12x de R\$ 362,70 com juros Cartão Visa - Vindi

TOTAL DE PRODUTOS VISITADOS (0)

PÁGINAS: 1

Limpar

Cadastre seu e-mail para receber ofertas exclusivas da Loja Sarah

Preencha seu e-mail para novidades

Cadastrar



FORMAS DE PAGAMENTO



ATENDIMENTO

Telefone
(11) 3501-8438
(11) 4614-0601

E-Mail

contato@lojasarah.com.br

ÁREA DO CLIENTE

- Minha Conta
- Meu Carrinho
- Meus Pedidos

SUPORTE

- Como Comprar
- Formas de Envio
- Segurança
- Fale Conosco

APÓS A COMPRA

- Prazo de Entrega
- Trocas e Devoluções
- Garantia



LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 94 LITROS COM SUPORTE FIXO TAMPA VERMELHA



Nome do Produto:	Quantidade:	Destino:
Lixeira de madeira plastica 94 litros COM Suporte Fixo Tampa Vermelha	1	RJ

Custos de Envio para: \ Centro \ Cardoso Moreira-RJ

Forma de Envio:	Valor:	Prazo de Entrega e Observações:
Frete Especial	RS 154,00	Prazo de 10 dias uteis
jadlog JADLOG .PACKAGE	RS 698,71	Previsto para 17/10/2025 até 20/10/2025
LATAM CARGO LATAM CARGO EFÁCIL	RS 799,12	Previsto para 21/10/2025 até 22/10/2025
Frete Fixo	RS 370,99	Produto encaminhado por transportadora e sujeito aos prazos das mesmas.

LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 94 LITROS COM SUPORTE FIXO TAMPA VERMELHA



Nome do Produto:	Quantidade:	Destino:
Lixeira de madeira plastica 94 litros COM Suporte Fixo Tampa Vermelha	1	RJ

Custos de Envio para: \ Centro \ Cardoso Moreira-RJ

Forma de Envio:	Valor:	Prazo de Entrega e Observações:
Frete Especial	RS 154,00	Prazo de 10 dias uteis
jadlog JADLOG .PACKAGE	RS 698,71	Previsto para 17/10/2025 até 20/10/2025
LATAM CARGO LATAM CARGO EFÁCIL	RS 799,12	Previsto para 21/10/2025 até 22/10/2025
Frete Fixo	RS 370,99	Produto encaminhado por transportadora e sujeito aos prazos das mesmas.

Suporte p/ lixeira de madeira plastica 94 litros - 70 cm fixo

Por: **R\$ 391.70**

Tampa avulsa para Lixeira de madeira Plastica de 70cm 94L

Por: **R\$ 889.39**

Kit de 3 Lixeira p/Coleta Seletiva 94L tampa Preta Madeira Plastica Ecologica

Por: **R\$ 2.200.00**

Kit de 4 Lixeira p/Coleta Seletiva 94L tampa Preta Madeira Plastica Ecologica

Por: **R\$ 3.513.40**

LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 94 LITROS COM SUPORTE FIXO TAMPA VERMELHA



Nome do Produto:	Quantidade:	Destino:
Lixeira de madeira plastica 94 litros COM Suporte Fixo Tampa Vermelha	1	RJ

Custos de Envio para: \ Centro \ Cardoso Moreira-RJ

Forma de Envio:	Valor:	Prazo de Entrega e Observações:
Frete Especial	RS 154,00	Prazo de 10 dias uteis
jadlog JADLOG .PACKAGE	RS 698,71	Previsto para 17/10/2025 até 20/10/2025
LATAM CARGO LATAM CARGO EFÁCIL	RS 799,12	Previsto para 21/10/2025 até 22/10/2025
Frete Fixo	RS 370,99	Produto encaminhado por transportadora e sujeito aos prazos das mesmas.

TOTAL DE PRODUTOS VISITADOS

PÁGINAS: 1

Limpar



Home / Carrinho

Carrinho

Resumo

	Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
×	 Lixeira ecológica em madeira plástica com tampa 94L - InBrasil	R\$745	- 1 +	R\$745
×	 Suporte H para Lixeira em Madeira Plástica - InBrasil	R\$285	- 1 +	R\$285



Código do cupom

APLICAR CUPOM

[ATUALIZAR CARRINHO](#)

Total no carrinho

Subtotal R\$1.030

Entrega

 Transportadora (entrega em até 8 dias úteis):

R\$370 Entrega em até 8 dias úteis

 Jadlog (8 a 9 dias úteis):

R\$615.59

Entrega para Santa Catarina, 28180-000.

[Mudar endereço](#)

Total

**R\$1.400**Em até 6x de **R\$233.33** sem juros**R\$1.348.50** 5% no pix ou boleto**CONTINUAR PARA FINALIZAÇÃO**

Checkout seguro e garantido



Sobre a Loja

A LojaCond desde o seu início preza por produtos de qualidade e um bom atendimento. Atuamos no fornecimento dos mais variados itens na linha de acessórios e utilidades para condomínios, e somos referência: uma das empresas mais conceituadas neste ramo. Nossa logística opera em todo Brasil, com despacho dos produtos para todos os estados do país e com entrega expressa na região SUL.

Informação Contate-nos

Quem somos?


Meios de pagamento e de frete

Política de privacidade


Política de Trocas e

Devoluções

Política de Reembolso

 R. Paulo Roberto Alves, 112 - Rio Grande Palhoça - SC, 88131-639

 (48) 991213675

 (48) 32478318

 contato@lojacond.com.br

 lojacondstore.com.br

Formas de envio



© 2025 LojaCond Store CNPJ:
19.704.009/0001-01



+ Lista de Desejos + Compartilhar

Inicio / Madeira Plástica / Lixeiras / LIXEIRA 70CM 94LITROS - MADEIRA PLÁSTICA

Código: v130 Marca: InBrasil

★★★★★ (2)

Selecione a opção de Cor:

Amarela Azul Marrom Preta Verde Vermelha

R\$ 730,36 até 12x de R\$ 60,86 sem Juros ou R\$ 693,84 via Boleto Bancário

Qtde: 1

Comprar

Estoque: 1 dia útil

Parcelas	
1x de R\$ 730,36 sem juros	7x de R\$ 104,33 sem juros
2x de R\$ 365,18 sem juros	8x de R\$ 91,29 sem juros
3x de R\$ 243,45 sem juros	9x de R\$ 81,15 sem juros
4x de R\$ 182,59 sem juros	10x de R\$ 73,03 sem juros
5x de R\$ 146,07 sem juros	11x de R\$ 66,39 sem juros
6x de R\$ 121,72 sem juros	12x de R\$ 60,86 sem juros

pix R\$ 701,15

Boleto Bancário R\$ 693,84

Calcule o frete 28180-000 OK

R\$ 92,03	9 dias úteis	Transportadora
R\$ 164,09	11 dias úteis	Loggi - Loggi Ponto
R\$ 289,92	11 dias úteis	PAC

Para as localidades com CEP único, com terminação '000', ou seja, que não possuem CEPs por logradouro, considera-se entrega domiciliar aquela prevista nos termos da Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações.

R\$ 512,21	7 dias úteis	SEDEX
------------	--------------	-------

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Desconto para comprar junto

Está vendo

 Lixeira 70cm 94litros - Madeira Plástica R\$ 743,96 **R\$ 706,76** Amarela

+  Suporte em plástico para Lixeira InBrasil R\$ 316,15 **R\$ 300,34**

Compre os 2 itens R\$ 1.060,11 **R\$ 1.007,10**

Comprar kit

A Lixeira InBrasil é ideal para áreas externas, é um produto 100% ecológico para quem quer beleza e praticidade aliado há durabilidade e baixa manutenção.

A Madeira Plástica InBrasil é produzida através de plásticos reciclados pela fábrica mais sustentável do planeta.

É um material durável e resistente a corrosão, chuva, poeira e pode ser mantido em contato permanente com o solo.

Também é imune a pragas, não mofo ou cria fungos.

Outra vantagem é a segurança, pois a Madeira Plástica não solta farpas ou tem rachaduras.

O produto acompanha manual de montagem e é um processo muito simples.

O material é livre de manutenção e pinturas e já vem em coloração semelhante a madeira natural.

Conceda mais beleza ao seu ambiente sem agredir a natureza, utilizando a Madeira Plástica da InBrasil.

Diâmetro: 50cm
Altura: 70cm

PREÇO REFERENTE A 1 LIXEIRA,
LIXEIRA COM A TAMPA PRETA NÃO POSSUI ADESIVO
NÃO ACOMPANHA O SUPORTE DE LIXEIRA
<https://www.lazercasa.com.br/suporte-em-plastico-para-lixeria-inbrasil>

AVALIAÇÕES DOS CONSUMIDORES

5 / 5 Baseado em 2 avaliações

★★★★★

Nota geral

5	(2)
4	(0)
3	(0)
2	(0)
1	(0)

Erick O.
29/08/2025 - Cor: Preta
★★★★★ 5 Estrelas

Lixeira
Excelente produto



Este usuário recomenda a compra deste item

Residencial J.
17/03/2025 - Cor: Marrom
★★★★★ 5 Estrelas

Lixeira perfeita
essa lixeira ganhou o coração de todos no nosso condomínio. Linda, robusta, facil de limpeza. Como temos uma mini floresta no condomínio, sua pegada rustica ficou perfeita no ambiente.

Este usuário recomenda a compra deste item


PRODUTOS RELACIONADOS

 <p>Lixeira 50cm 65litros - Madeira Plástica</p> <p>A partir de R\$ 632,49 até 12x de R\$ 52,70 sem juros ou R\$ 600,87 via Boleto Bancário</p>	 <p>Suporte em plástico para Lixeira InBrasil</p> <p>R\$ 316,15 até 12x de R\$ 26,34 sem juros ou R\$ 300,34 via Boleto Bancário</p>	 <p>Lixeira em madeira mista com suporte em alumínio 45 litros</p> <p>R\$ 592,00 até 12x de R\$ 49,33 sem juros ou R\$ 562,40 via Boleto Bancário</p>	 <p>Ripado em Madeira Plástica 16x4x300cm</p> <p>A partir de R\$ 221,28 até 12x de R\$ 18,44 sem juros ou R\$ 210,22 via Boleto Bancário</p>
--	---	--	---


CATEGORIAS <ul style="list-style-type: none">• Madeira Plástica• Bancos de madeira• Móveis• Fechaduras• Puxadores• Portas	CONTEÚDO <ul style="list-style-type: none">• Fale Conosco• Quem somos• Entregas e Encomendas• Garantia• Trocas e Devoluções• Política de Privacidade	SOBRE A LOJA <p>A Lazer e Casa é uma loja voltada para produtos para casa e jardim, localizada em Curitiba / PR. Trabalhamos com madeira plástica (bancos de jardim, pergolados, decks, cachepots e floreiras verticais), peltinas, portas, fechaduras, puxadores, motores, roçadeiras e geradores.</p>	SOCIAL <p>Lazer e ... 465 seguidores</p> <p>Seguir Página</p> <p>YouTube Instagram</p>
---	--	--	---

PAGUE COM: VISA, Mastercard, Elo, Boleto Bancário, pix

SELOS: COMPRA SEGURO SITE PROTEGIDO CERTIFICADO SSL, SAFE BROWSING Google



Pronta entrega



Pedra Madeira Bruta Branca

MARCA: KW5 BRASIL
REF. BJ6ZS75UU
DISPONIBILIDADE: PRONTA ENTREGA

ESCOLHA A COR



R\$ 84,96

1x de R\$ 84,96 sem juros

ou 10x de R\$ 9,73 com juros

ou R\$ 76,46 à vista no Pix

FRETE PARA GRANDES QUANTIDADE FALE CONOSCO, TEMOS VALOR DIFERENCIADO

Quantidade

1

[CLIQUE PARA COMPRAR](#)

[Mais formas de pagamento](#)

☆☆☆☆☆ 0 Avaliações [Avaliar](#)

[CALCULAR PRAZOS E PREÇOS](#) [Não sei meu CEP](#)

28180-000

[Consultar](#)

MODULAR TRANSPORTES - R\$ 258,38 - até 12 dias úteis - Previsão 21/10/2025

[COMPRE PELO WHATSAPP](#)

DETALHES DO PRODUTO

Pedra Madeira Bruta VENDIDO POR M²

Como o próprio nome já diz, a pedra madeira possui um aspecto muito semelhante à madeira e ainda conta com todos os benefícios de ser uma pedra natural. Sua cor e textura dão a característica parecida com a madeira, dando um efeito interessante quando utilizada nos ambientes.

A pedra madeira é uma rocha metamórfica, isto é, é formada através da transformação de outras rochas já existentes na natureza. Seu principal componente é o quartzo, que é o que dá a característica de alta resistência para a pedra.

Assim como outras pedras naturais, a pedra madeira também conta com as propriedades de dureza, resistência e durabilidade. Assim, é possível criar ambientes não só bonitos, mas também funcionais, uma vez que as pedras não exigem manutenções periódicas e duram muitos anos.

A versatilidade de cores da pedra madeira dá liberdade para usá-la em qualquer ambiente. Vale usar a criatividade para definir onde usar a pedra madeira da melhor forma.

RELACIONADOS



Pronta entrega

Pedra Madeira Serrada Branca 1m²
23x23cm

☆☆☆☆☆

R\$ 149,60

em até 1x de R\$ 149,60 sem juros

ou 10x de R\$ 17,13 com juros

ou R\$ 134,64 à vista no Pix



Pronta entrega

Pedra Miracema Cinza Irregular 47 x
47cm

☆☆☆☆☆

R\$ 29,99

em até 1x de R\$ 29,99 sem juros

ou 10x de R\$ 3,43 com juros

ou R\$ 26,99 à vista no Pix



Pronta entrega

Pedra Miracema Cinza 40 x 40cm

☆☆☆☆☆

R\$ 118,32

em até 1x de R\$ 118,32 sem juros

ou 10x de R\$ 13,55 com juros

ou R\$ 106,49 à vista no Pix



Pronta entrega

Pedra Espanha Bianco

☆☆☆☆☆

R\$ 279,00

em até 1x de R\$ 279,00 sem juros

ou 10x de R\$ 31,95 com juros

ou R\$ 251,10 à vista no Pix

RECEBA NOVIDADES

[Enviar](#)

Institucional

[Pagamento e entrega](#)
[Política de privacidade](#)
[Quem Somos](#)
[Troca e devoluções](#)
[Mapa do Site](#)

Minha Conta

[Entre em Contato](#)
[Meus Dados](#)
[Meus Pedidos](#)
[Rastrear Encomenda](#)

Central de Atendimento

vendas@globalpedras.com.br
Estrada do Itapeti das Furnas, 45
Serra do Itapeti - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08771-500

(11) 3040-8885
(11) 3040-8885

Siga nossas Redes



Formas de Pagamento




Site Seguro - Compre com Segurança



A GLOBAL PEDRAS é uma empresa especializada em comércio de pedras naturais decorativas, jardinagem e paisagismo, piso e revestimentos das melhores marcas, do mercado nacionais e importados

Compre com 100% de segurança • Entregamos para todo o Brasil

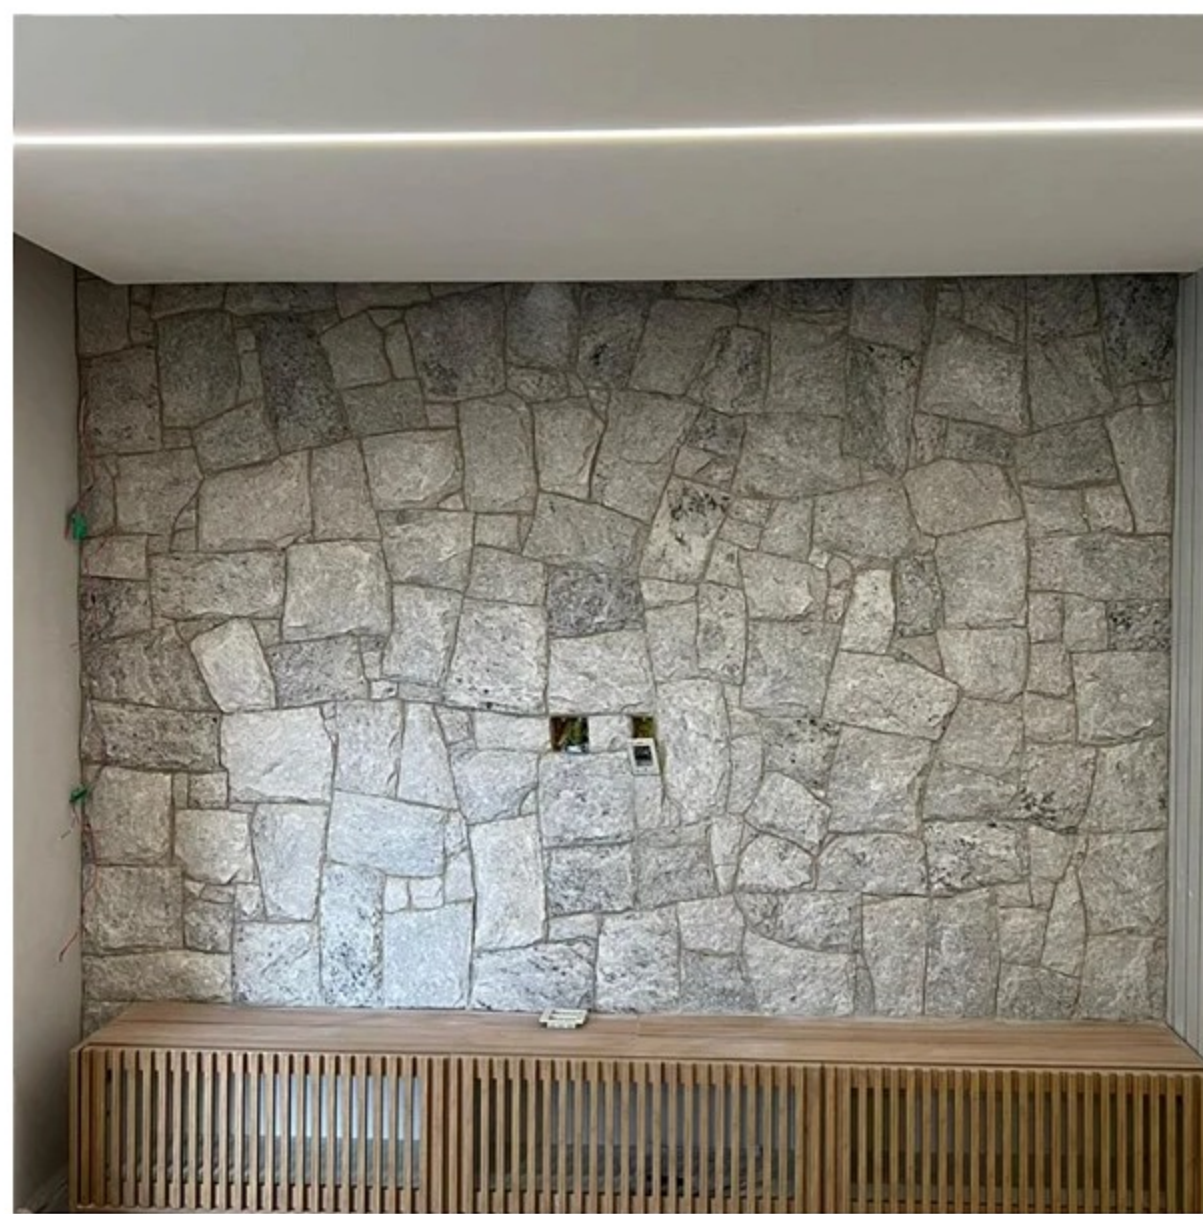

Início » Pedras para parede

PEDRA MADEIRA BRUTA BRANCA M²

Código: CVFNKVS6J

R\$ 499,99
R\$ 92,99
até 12x de R\$ 10,20
ou R\$ 87,41 via Pix

Outras formas de pagamento

1

Comprar

Estoque: 1 dia útil

Calcule o frete

28180-000

CALCULAR

Não foram encontradas formas de envio para o CEP informado.

Compartilhe: [f](#) [t](#) [p](#)

Adicionar à Lista de Desejos

Descrição Saiba mais informações

Descrição Saiba mais informações

Pedra Madeira Bruta

VENDIDO POR M²

Como o próprio nome já diz, a pedra madeira possui um aspecto muito semelhante à madeira e ainda conta com todos os benefícios de ser uma pedra natural. Sua cor e textura dão a característica parecida com a madeira, dando um efeito interessante quando utilizada nos ambientes.

A pedra madeira é uma rocha metamórfica, isto é, é formada através da transformação de outras rochas já existentes na natureza. Seu principal componente é o quartzo, que é o que dá a característica de alta resistência para a pedra.

Assim como outras pedras naturais, a pedra madeira também conta com as propriedades de dureza, resistência e durabilidade. Assim, é possível criar ambientes não só bonitos, mas também funcionais, uma vez que as pedras não exigem manutenções periódicas e duram muitos anos.

A versatilidade de cores da pedra madeira dá liberdade para usá-la em qualquer ambiente. Vale usar a criatividade para definir onde usar a pedra madeira da melhor forma.

Relacionados Veja também esses produtos

5% Off



Pedra Madeira Bruta Cinza m²

R\$ 104,99 **R\$ 99,99**

até 12x de R\$ 10,97
ou R\$ 93,99 via Pix

15% Off



Pedra Madeira Bruta amarela m²

R\$ 109,99 **R\$ 92,99**

até 12x de R\$ 10,20
ou R\$ 87,41 via Pix

18% Off



Pedra Madeira Bruta Cinza m²

R\$ 109,99 **R\$ 89,90**

até 12x de R\$ 9,86
ou R\$ 84,51 via Pix



Empresa especializada em pedras jardinagem e paisagismo, pedras decorativas para pisos e fachadas, buscando sempre oferecer o que há de melhor e novidades para a satisfação de nossos clientes.

Saiba mais

Categorias

Jardinagem e paisagismo
Mosaico telado
Pedras para parede
Pedras para piso

Conteúdo

Fale Conosco
Meios de pagamento e de frete
Política de privacidade
Política de Trocas e Devoluções
Quem somos

Atendimento

Telefone: (11) 4040-5609
Whatsapp: (11) 95801-8589
E-mail: contatopedrasantos@gmail.com

Seg. a Sexta 8.00h as 17.00h

Endereço Ver mapa

Rua francisco jose da silva , 280

PAGUE COM



SELOS



FORMA DE ENVIO



PEDRAS BRASIL > Revestimentos > Pedra Madeira Bruta > Pedra Madeira Bruta Branca



Pedra Madeira Bruta Branca

MARCA: KW5 BRASIL
REF. 7WAW4YETJ
DISPONIBILIDADE: PRONTA ENTREGA

🔥 11 vendidos

☆☆☆☆☆ Avaliar este produto 0 avaliações

R\$ 88,96

1x de R\$ 88,96
ou 10x de R\$ 10,19

ou R\$ 84,51 à vista no Pagamento Via PIX

1 **CLIQUE PARA COMPRAR**



Calcule prazos e preços

Não sei meu CEP

28180-000 **Consultar**

MODULAR TRANSPORTES - R\$ 258,41
- até 10 dias úteis - Previsão 17/10/2025

COMPRE PELO WHATSAPP

Voltar

DETALHES DO PRODUTO

Pedra Madeira Bruta VENDIDO POR M²

Como o próprio nome já diz, a pedra madeira possui um aspecto muito semelhante à madeira e ainda conta com todos os benefícios de ser uma pedra natural. Sua cor e textura dão a característica parecida com a madeira, dando um efeito interessante quando utilizada nos ambientes.

A pedra madeira é uma rocha metamórfica, isto é, é formada através da transformação de outras rochas já existentes na natureza. Seu principal componente é o quartzo, que é o que dá a característica de alta resistência para a pedra.

Assim como outras pedras naturais, a pedra madeira também conta com as propriedades de dureza, resistência e durabilidade. Assim, é possível criar ambientes não só bonitos, mas também funcionais, uma vez que as pedras não exigem manutenções periódicas e duram muitos anos.

A versatilidade de cores da pedra madeira dá liberdade para usá-la em qualquer ambiente. Vale usar a criatividade para definir onde usar a pedra madeira da melhor forma.

RELACIONADOS



Pedra Madeira Bruta Amarela

R\$ 98,60

em até 1x de R\$ 98,60 sem juros
ou 10x de R\$ 11,29

ou R\$ 93,67 à vista no Pagamento Via PIX



Pedra Miracema Cinza Irregular 47 x 47cm

R\$ 24,99

em até 1x de R\$ 24,99 sem juros
ou 10x de R\$ 2,86

ou R\$ 23,74 à vista no Pagamento Via PIX




Pedra Madeira Serrada Branca Amarrado C/ 0,5m² 23x...

R\$ 119,16

em até 1x de R\$ 119,16 sem juros
ou 10x de R\$ 13,64

ou R\$ 113,20 à vista no Pagamento Via PIX



Pedra Moledo Champagne

R\$ 291,89

em até 1x de R\$ 291,89 sem juros
ou 10x de R\$ 33,42

ou R\$ 277,30 à vista no Pagamento Via PIX

PEDRA MADEIRA BRUTA BRANCA

MARCA: KW5 BRASIL
REF. 7WAW4YETJ

R\$ 88,96

10x de R\$ 10,19

ou à vista R\$ 84,51
no Pagamento Via PIX

CLIQUE PARA COMPRAR

Faça login ou cadastre-se para fazer uma avaliação

PEDRA MADEIRA BRUTA BRANCA

MARCA: KW5 BRASIL
REF. 7WAW4YETJ

R\$ 88,96

10x de R\$ 10,19

ou à vista R\$ 84,51
no Pagamento Via PIX

CLIQUE PARA COMPRAR

RECEBA NOVIDADES

Digite seu e-mail

Enviar

Institucional

Pagamento e entrega
Política de privacidade
Quem somos
Troca e devoluções
Mapa do Site

Minha Conta

Entre em Contato
Meus Dados
Meus Pedidos
Rastrear Encomenda

Central de Atendimento

R. Manuel de Oliveira, 269
Vila Mogilar, - Mogi das Cruzes - SP
CEP: 08773-130

(11) 4040-8522
(11) 4040-8586

E-mail:
Vendas@pedrasbrasil.com.br


 **Carrinho**

1 Produto



Placa Sinalizadora Deficiente Físico Em Alumínio 15x15 cm (72012)

Ref: CE8817




R\$ 24,10

remover



Resumo

Subtotal **R\$ 24,10**

Cupom de desconto  Inserir cupom

Jadlog .Package ▼ **R\$ 23,58**

Total **R\$ 45,97**

à vista com 7% OFF

ou 6x R\$ 7,95 sem juros

Finalizar a compra

Continuar comprando



Home > EPI-Equipamento de Proteção > Sinalização e Isolamento

Placa de Alumínio Acessibilidade Azul Sinalize



Disponível

Cod. 11097434

Produtos: SINALIZE

[\(0 avaliações\)](#) ☆☆☆☆☆

OUTLET GIMBA

de R\$ 31,99

Por apenas **R\$ 24,99**

no PIX (3% desconto)

Formas de Pagamento

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Frete para CEP 28180-000

Envio: Transportadora Valor: R\$ 112,24 Prazo: 10 dia(s) úteis, após a liberação de crédito

Envio: Correios - D&C Valor: R\$ 33,74 Prazo: 15 dia(s) úteis, após a liberação de crédito

Compre Junto

Placa de Alumínio Acessibilida por R\$ 31,99	Placa de Alumínio Acessibilida por R\$ 31,99
Placa de Alumínio Procedimento por R\$ 31,99	Placa de Alumínio E Proibido F por R\$ 27,69
<p>por R\$ 56,98</p> Comprar os dois	<p>por R\$ 43,98</p> Comprar os dois

Quem viu esse produto, também viu

Cone de Sinalização 75cm Branco e Laranja Plastcor 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 46,90 R\$ 45,49 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Masculino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Placa de Sinalização Puxe e Empurre Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 35,69 R\$ 34,62 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Feminino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Cavalete Sinalização Cuidado Piso Molhado Bralimpia 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 78,99 R\$ 76,62 no PIX (3% desc.)
--	---	--	--	---

Descrição do Produto

Dados Técnicos

Avaliação do produto

Quem viu esse produto, também comprou:

Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Feminino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Placa PE 15x20 Feminino/Masculino 1 UN Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 12,55 R\$ 12,17 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Sanitário Masculino e Feminino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ de R\$ 35,69 por apenas R\$ 24,99 R\$ 24,24 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Masculino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Adesivo Lei do Silêncio 1 UN Precificar 0 avaliações ☆☆☆☆☆ de R\$ 63,59 por apenas R\$ 32,90 R\$ 31,91 no PIX (3% desc.)
--	---	---	---	---

Quem comprou esse produto, também comprou:

Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Feminino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Procedimentos para Sanitário Masculino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 31,99 R\$ 31,03 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Sanitário Masculino e Feminino Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ de R\$ 35,69 por apenas R\$ 24,99 R\$ 24,24 no PIX (3% desc.)	Placa de Alumínio Mantenha a Porta Fechada Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 24,90 R\$ 24,15 no PIX (3% desc.)	Placa de Sinalização Puxe e Empurre Sinalize 0 avaliações ☆☆☆☆☆ por apenas R\$ 35,69 R\$ 34,62 no PIX (3% desc.)
--	---	---	---	--

Institucional

Pioneiro em Gestão e Distribuição de suprimentos, oferecendo soluções completas para empresas e consumidores.

[Conheça mais da nossa história clicando aqui](#)

Redes Sociais



Principais Categorias

- Alimentícios
- Escritório e Papelaria
- Limpeza
- Higiene
- Descartáveis

Serviços

- 2ª Via de Boleto
- Cliente Diamante
- Minha Lista
- Negociação
- Cotação
- Cidade Gimba

Fornecedor

- Agendamento
- Seja nosso Fornecedor

Atendimento

- FAQ
- Televentas Whatsapp
- Sac Whatsapp
- Ouvidoria
- Trabalhe Conosco

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Diners Club, American Express e Elo), Boleto à vista, Boleto a prazo (PJ) e Pix. Para saber mais [clique aqui](#)

Preços e condições de pagamento são válidos apenas para compras realizadas neste site. As imagens dos produtos têm caráter ilustrativo. Valores e condições comerciais podem ser alterados sem aviso prévio. Todas as vendas estão sujeitas à análise e confirmação de dados.

SupriCorp Suprimentos Ltda | CNPJ: 54.651.716/0011-50.

Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1150, Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

©2025 Gimba

Meu carrinho

Continuar


Placa Sinalizadora Alumínio 15 X 15 cm - Deficiente Físico

 Ref. 120AM
Marca: Reis Lixeiras

- 1 +

R\$ 25,90

Frete

 Cardoso Moreira - RJ
28180-000

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

<input type="checkbox"/>	JADLOG .PACKAGE Previsto para 27/10/2025 até 28/10/2025	R\$ 20,02
<input type="checkbox"/>	LOGGI COLETA Previsto para 29/10/2025 até 30/10/2025	R\$ 27,10
<input type="checkbox"/>	JET STANDARD Previsto para 23/10/2025 até 24/10/2025	R\$ 29,75
<input type="checkbox"/>	Nossa Entrega Prazo de entrega em até 8 a 10 dias úteis.	R\$ 120,00
<input type="checkbox"/>	Correios Mini Envios (04227) Prazo de entrega: até 19 dia(s)	R\$ 18,07
<input type="checkbox"/>	Total Express Total Points Prazo de entrega: até 12 dia(s)	R\$ 18,15
<input type="checkbox"/>	Jadlog Frenet Jadlog.Package Prazo de entrega: até 16 dia(s)	R\$ 20,26
<input type="checkbox"/>	Imile iMile - Standard Prazo de entrega: até 15 dia(s)	R\$ 26,71
<input type="checkbox"/>	Correios PAC Contrato (03298) Prazo de entrega: até 16 dia(s)	R\$ 26,74
<input type="checkbox"/>	Correios Sedex Contrato (03220) Prazo de entrega: até 12 dia(s)	R\$ 50,00
<input type="checkbox"/>	CORREIOS PAC 17 a 18 28/10/2025 até 29/10/2025	R\$ 27,45
<input type="checkbox"/>	CORREIOS SEDEX 13 a 14 22/10/2025 até 23/10/2025	R\$ 51,32
<input type="checkbox"/>	JADLOG .PACKAGE 13 a 14 22/10/2025 até 23/10/2025	R\$ 20,02
<input type="checkbox"/>	JADLOG .COM 12 a 13 21/10/2025 até 22/10/2025	R\$ 18,01
<input type="checkbox"/>	LATAM CARGO EFÁCIL 15 a 16 24/10/2025 até 27/10/2025	R\$ 108,04
<input type="checkbox"/>	AZUL CARGO EXPRESS EXPRESSO 12 a 13 21/10/2025 até 22/10/2025	R\$ 73,88
<input type="checkbox"/>	AZUL CARGO EXPRESS E-COMMERCE 13 a 14 22/10/2025 até 23/10/2025	R\$ 65,47
<input type="checkbox"/>	CORREIOS MINI ENVIOS 20 a 21 31/10/2025 até 03/11/2025	R\$ 18,85
<input type="checkbox"/>	JADLOG .PACKAGE CENTRALIZADO 13 a 14 22/10/2025 até 23/10/2025	R\$ 16,14
<input checked="" type="checkbox"/>	LOGGI EXPRESS 14 a 15 23/10/2025 até 24/10/2025	R\$ 12,01
<input type="checkbox"/>	LOGGI COLETA 15 a 16 24/10/2025 até 27/10/2025	R\$ 27,10
<input type="checkbox"/>	JET STANDARD 11 a 12 20/10/2025 até 21/10/2025	R\$ 29,75
<input type="checkbox"/>	LOGGI LOGGI PONTO 15 a 16 24/10/2025 até 27/10/2025	R\$ 14,90

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 25,90
Frete (LOGGI EXPRESS)	R\$ 12,01

Total do pedido

R\$ 37,91

 R\$ 36,61 no depósito bancário com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 6,32 no cartão de crédito
ou 9x de R\$ 5,04 no cartão de crédito


ATENDIMENTO

(11) 2193-2636

atendimento.loja@reislixeiras.com.br

 Atendimento pelo telefone de segunda a sexta feira
das 8 as 18 horas.

ACEITAMOS



SEGURANÇA

